

苏州 110kV 练洞 1#-6#段迁改工程

竣工环境保护验收调查表

建设单位： 中铁一局集团电务工程有限公司

调查单位： 中铁一局集团电务工程有限公司

编制日期：2026 年 8 月

建设单位法人代表（授权代表）：（签名）

调查单位法人代表：（签名）

报告编写负责人：（签名）

主要编制人员情况

姓名	职称	职责	签字
李科	工程师	工程师	

建设单位： 中铁一局集团电务工程有限公司（盖章）

调查单位： 中铁一局集团电务工程有限公司（盖章）

电话：

电话：

传真： /

传真： /

邮编： 710000

邮编： 710000

地址： 陕西省西安市灞桥区灞柳一路 1111 号

地址： 陕西省西安市灞桥区灞柳一路 1111 号

监测单位： 江苏海尔森检测技术服务有限公司

目 录

一、建设项目总体情况	1
二、调查范围、环境监测因子、敏感目标、调查重点	5
三、验收执行标准	8
四、建设项目概况	9
五、环境影响评价回顾	13
六、环境保护设施、环境保护措施落实情况（附照片）	20
七、电磁环境、声环境监测（附监测点位图）	25
八、环境影响调查	32
九、环境管理与监测计划	35
十、竣工环保验收调查结论与建议	37

附图：

附图 1 本项目地理位置示意图

附图 2 监测点位示意图及线路路径图

附图 3 本项目与江苏省生态空间保护区域相对位置关系示意图

附件：

附件 1 本项目环评批复

附件 2 验收监测报告及监测单位资质证书

附表：

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

一、建设项目总体情况

建设项目名称	苏州 220kV 熟练线 34#-36#/110kV 练洞 1#-6#段迁改工程				
建设单位	中铁一局集团电务工程有限公司				
法人代表/ 授权代表	危兵星		联系人	李科	
通讯地址	陕西省西安市灞桥区灞柳一路 1111 号				
联系电话		传真	/	邮政编码	710000
建设地点	江苏省苏州市常熟市尚湖镇				
项目建设性质	新建（迁建）、 改建	行业类别	D4420 电力供应		
环境影响报告 表名称	苏州 220kV 熟练线 34#~36#/110kV 练洞线 1#~6#段迁改工程				
环境影响评价 单位	南京国环科技股份有限公司				
初步设计单位	常熟市苏明实业有限公司				
环境影响评价 审批部门	苏州市生态环境局	文号	苏环辐评[2025]43 号	时间	2026.1.5
建设项目核准 部门	/	文号	/	时间	/
初步设计审批 部门	国网江苏省电力有 限公司	文号	苏电函[2025]86 号	时间	2025.7.30
环境保护设施 设计单位	常熟市苏明实业有限公司				
环境保护设施 施工单位	苏州电力建设工程有限公司 常熟市苏明实业有限公司				
环境保护设施 监测单位	江苏海尔森检测技术服务有限公司				
投资总概算 （万元）	1443	环境保护投 资（万元）	39	环境保护投资 占总投资比例	2.7%
实际总投资 （万元）	1312.4057	环境保护投 资（万元）	35	环境保护投资 占总投资比例	2.7%

环评阶段项目建设内容	(1) 220kV熟练4X33/4X34线迁改工程 本项目新建220kV熟练4X33/4X34线同塔双回架空线路路径长约0.45km (A1~A3)，熟练线恢复同塔双回架空线路路径长约0.48km(熟练线33#(同塔练洞线7#)~A1, A3~熟练线37#), 新建220kV双回路角钢塔3基 (A1~A3)。 拆除原混压四回架空线路路径长约0.12km (A1~熟练线35#(同塔练洞线5#))，拆除220kV熟练线双回架空线路路径长约0.22km (熟练线35#(同塔练洞线5#)~A3)；拆除3基角钢塔，其中混压四回路角钢塔2基 (熟练线34#(同塔练洞线6#)、熟练线35#(同塔练洞线5#))、220kV双回路角钢塔1基 (熟练线36#)。 (2) 110kV练洞1741线迁改工程 本项目新建110kV练洞1741线单回地下电缆路径长约0.72km (G1~练洞线1#)，练洞线恢复110kV/35kV同塔混压双回架空线路路径长约0.12km(熟练线33#(同塔练洞线7#)~G1), 新建110kV双回路电缆终端塔1基 (G1)。 拆除110kV练洞线单回架空线路路径长约0.32km (练洞线4#~练洞线1#)，拆除110kV/35kV同塔混压双回架空线路路径长约0.12km (G1~A1, 熟练线35#(同塔练洞线5#)~练洞线4#)；拆除3基角钢塔，其中110kV双回路角钢塔1基 (练洞线4#)、110kV单回路角钢塔2基 (练洞线2#和练洞线3#)。拆除的同塔四回架空线路和杆塔部分计列于220kV熟练4X33/4X34线迁改工程中。	项目开工日期	2026.2
项目实际建设内容	(1) 220kV熟练4X33/4X34线迁改工程 本项目新建220kV熟练4X33/4X34线同塔双回架空线路路径长约0.45km (A1~A3)，熟练线恢复同塔双回架空线路路径长约0.48km(熟练线33#(同塔练洞线7#)~A1, A3~熟练线37#), 新建220kV双回路角钢塔3基 (A1~A3)。	环境保护设施投入调试日期	2026.5

	拆除原混压四回架空线路路径长约0.12km（A1~熟练线35#（同塔练洞线5#）），拆除220kV熟练线双回架空线路路径长约0.22km（熟练线35#（同塔练洞线5#）~A3）；拆除3基角钢塔，其中混压四回路角钢塔2基（熟练线34#（同塔练洞线6#）、熟练线35#（同塔练洞线5#））、220kV双回路角钢塔1基（熟练线36#）。 （2）110kV练洞1741线迁改工程 本项目新建110kV练洞1741线单回地下电缆路径长约0.72km（G1~练洞线1#），练洞线恢复110kV/35kV同塔混压双回架空线路路径长约0.12km（熟练线33#（同塔练洞线7#）~G1），新建110kV双回路电缆终端塔1基（G1）。 拆除110kV练洞线单回架空线路路径长约0.32km（练洞线4#~练洞线1#），拆除110kV/35kV同塔混压双回架空线路路径长约0.12km（G1~A1，熟练线35#（同塔练洞线5#）~练洞线4#）；拆除3基角钢塔，其中110kV双回路角钢塔1基（练洞线4#）、110kV单回路角钢塔2基（练洞线2#和练洞线3#）。拆除的同塔四回架空线路和杆塔部分计列于220kV熟练4X33/4X34线迁改工程中。		
项目建设过程简述	2025年1月，取得了国网苏州供电公司出具的可行性研究的意见，文号为：苏供电发展[2025]10号。 2025年7月，取得了国网江苏省电力有限公司出具的初步设计的意见，文号为：苏电函[2025]86号。 2026年1月，取得了苏州市生态环境局出具的环境影响报告表的批复，文号为：苏环辐评[2025]43号。 2026年2月项目开工建设，并于2026年5月建成并投入调试运行，项目环境保护措施及设施与主体工程同时设计、施工、投入使用。 按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）等相关规定、技术标准和环评文件的要求，中铁一局集团电务工程有限公司于2026年		

	8 月启动了该项目的竣工环境保护验收工作，并委托江苏海尔森检测技术服务有限公司于 2026 年 8 月 4 日对该项目开展了现场验收检测工作。
--	--

二、调查范围、环境监测因子、敏感目标、调查重点

调查范围

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）、《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）、《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）及《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》（HJ705-2020），确定调查（监测）范围（验收调查范围原则上与环境影响评价文件确定的评价范围一致），验收调查范围见表 2-1。

表 2-1 本项目验收调查范围一览表

调查对象	调查内容	调查（监测）范围
220kV 熟练线架空线路	工频电场、工频磁场	架空输电线路地面投影外两侧各 40m
	噪声	边导线地面投影外两侧各 40m 范围内的区域
	生态	线路边导线地面投影外两侧各 300m 内的带状区域
110kV 练洞线架空线路	工频电场、工频磁场	架空输电线路地面投影外两侧各 30m
	噪声	边导线地面投影外两侧各 30m 范围内的区域
	生态	线路边导线地面投影外两侧各 300m 内的带状区域
110kV 练洞线地下电缆	工频电场、工频磁场	电缆管廊两侧边缘各外延 5m
	噪声	地下电缆线路可不进行声环境影响评价
	生态	线路边导线地面投影外两侧各 300m 内的带状区域

环境监测因子

根据环评文件和《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》（HJ705-2020），确定环境监测因子，具体如下：

（1）电磁环境：监测因子为工频电场、工频磁场，监测指标为工频电场强度、工频磁感应强度。

（2）声环境：监测因子为噪声，监测指标为昼间、夜间等效声级。

环境敏感目标

1、生态保护目标

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），生态保护目标为受影响的重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等。

本项目调查范围不涉及国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地、世界自然遗产、生态保护红线区域；重要物种的天然集中分布区、栖息地，重要水生生物的产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，迁徙鸟类的重要繁殖地、停歇地、越冬地以及

野生动物迁徙通道等《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中的生态敏感区。

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号）、《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）和《江苏省自然资源厅关于常熟市生态空间管控区划调整方案的复函》（苏自然资函[2024]314号）、《江苏省自然资源厅关于苏州市生态空间管控区域评估优化成果的复函》（苏自然资函[2026]487号），本项目不进入江苏省国家级生态保护红线和江苏省生态空间管控区域，调查范围内涉及江苏省生态空间管控区域——常熟西南部湖荡重要湿地。

表 2-2 本项目调查范围内涉及生态空间管控区域情况一览表

生态空间管控区域名称	常熟西南部湖荡重要湿地
管控级别	江苏省生态空间管控区域
主导生态功能	湿地生态系统保护
具体范围	包括常熟西南部尚湖镇及辛庄镇的主要湖荡及其周边 50 米范围。具体为尚湖镇的官塘及其周围 50 米地区，辛庄镇的嘉陵荡及其周围 50 米地区，辛庄镇陶荡、荷花荡及其周围 50 米地区，南湖荡东至元和塘、北至练塘集镇规划横二路及练南村工业园以南 50 米，南至南湖荡边界，西至望虞河以东 100 米。尚湖镇六里塘范围为东至元塘、西至望虞河、南至六里塘南 50 米，北至北塘河北段 50 米。
管理要求	禁止从事下列活动：开（围）垦、填埋湿地；挖砂、取土、开矿、挖塘、烧荒；引进外来物种或者放生动动物；破坏野生动物栖息地以及鱼类洄游通道；猎捕野生动物、捡拾鸟卵或者采集野生植物，采用灭绝性方式捕捞鱼类或者其他水生生物；取用或者截断湿地水源；其他破坏湿地及其生态功能的行为。根据《中华人民共和国湿地保护法》：禁止排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他污染湿地的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。
与本项目位置关系	本项目南、北侧，最近距离约 170m，

2、电磁环境敏感目标

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），电磁环境敏感目标包括住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑物。

经现场踏勘，沿线共有电磁敏感点 3 处，电磁环境敏感目标情况见表 2-3。

表 2-3 本项目附近的电磁环境敏感目标情况

序号	保护目标名称	敏感目标建筑功能	敏感目标所在区域	位置 ¹ （调查范围内）	房屋高度	房屋类型及规模	导线最低对地高度	环境质量要求 ²
1	龙巷里 166 号民房	居住功能	苏州市常熟市尚湖镇	220kV 熟练线新建段架空线路东南侧 33m	3m~9m	1 幢 3 层尖顶（局部为 1 层平顶）	29.71m	E、B

2	常熟市污水处理厂水泵房	市政公用基础设施		220kV 熟练线新建段架空线路正下方	5m	1 间 1 层平顶		E、B
3	练塘大道 31-1 号厂房	工业生产		220kV 熟练线和 110kV 练洞线恢复架线段架空线路正下方（最近处）	3m~25m	2 间 1 层平顶 1 幢 5 层平顶	26.13m	E、B

注 1：环境敏感目标与线路的距离均为距线路边导线的距离。

注 2：环境质量要求中，E 表示工频电场<4000V/m，B 表示工频磁场<100μT。

3、声环境敏感目标

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），声环境保护目标为依据法律、法规、标准政策等确定的需要保持安静的建筑物及建筑物集中区。根据《中华人民共和国生态环境法典》，噪声敏感建筑物是指用于居住、科学研究、医疗卫生、文化教育、机关团体办公、社会福利等需要保持安静的建筑物。

经现场踏勘，本项目调查范围内有 1 处声环境保护目标，具体见表 2-4。

表 2-4 本项目声环境保护目标情况

序号	保护目标名称	敏感目标建筑功能	敏感目标所在区域	位置 ¹ （调查范围内）	房屋高度	房屋类型及规模	导线最低对地高度	环境质量要求 ²
1	龙巷里 166 号民房	居住功能	苏州市常熟市尚湖镇	220kV 熟练线新建段架空线路东南侧 33m	3m~9m	1 幢 3 层尖顶（局部为 1 层平顶）	29.71m	N2

注 1：环境敏感目标与线路的距离均为距线路边导线的距离。

注 2：N2 表示《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类环境噪声限值。

调查重点

- （1）项目设计及环境影响评价文件中提出的造成环境影响的主要建设内容；
- （2）核查实际建设内容、方案设计变更情况和造成的环境影响变化情况；
- （3）环境敏感目标基本情况及变动情况；
- （4）环境影响评价文件制度及其他环境保护规章制度执行情况；
- （5）环境保护设计文件、环境影响评价文件及其审批文件中提出的环境保护设施和环境保护措施落实情况及其效果、环境风险防范与应急措施落实情况；
- （6）环境质量和环境监测因子达标情况；
- （7）建设项目环境保护投资落实情况。

三、验收执行标准

电磁环境标准

工频电场、工频磁场执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表 1 中频率为 50Hz 所对应的公众暴露限值，即工频电场限值：4000V/m；工频磁场限值：100 μ T。

架空输电线路下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率 50Hz 的电场强度控制限值为 10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。

声环境标准

根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》（HJ705-2020），本次声环境验收环境质量评价执行现行有效的声环境质量标准，详见表 3-1。

表 3-1 本项目声环境标准一览表

类别	环评阶段执行标准	验收阶段执行标准	标准限值
声环境质量标准	架空线路 《声环境质量标准》 （GB3096-2008） 2 类、4a 类、4b 类	架空线路 《声环境质量标准》 （GB3096-2008） 2 类、4a 类、4b 类	2 类 昼间：60dB（A） 夜间：50dB（A） 4a 类 昼间：70dB（A） 夜间：55dB（A） 4b 类 昼间：70dB（A） 夜间：60dB（A）

其他标准和要求

环境质量评价执行现行有效的环境质量标准，污染物排放标准执行环境影响报告表及其审批部门批复决定中规定的标准，在环境影响报告表审批之后发布或修订的标准对建设项目执行该标准有明确时限要求的，按新发布或修订的标准执行。

本项目施工期噪声排放标准由《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）更新为《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）（昼间限值 70dB(A)，夜间限值 55dB(A)），其余验收执行标准不涉及新发布或修订标准的情况。

四、建设项目概况

项目建设地点

本项目迁改线路位于常熟市尚湖镇，线路总体由西南向东北架设。

本项目地理位置示意图见附图 1。

主要建设内容及规模

本项目实际建设内容及规模详见下表。

表 4-1 建设内容及规模一览表

项目名称	苏州 220kV 熟练线 34#-36#/110kV 练洞 1#-6#段迁改工程
建设单位	中铁一局集团电务工程有限公司
建设性质	新建（迁建）、改建
建设规模	(1) 220kV 熟练 4X33/4X34 线迁改工程 本项目新建 220kV 熟练 4X33/4X34 线同塔双回架空线路路径长约 0.45km (A1~A3)，熟练线恢复同塔双回架空线路路径长约 0.48km (熟练线 33# (同塔练洞线 7#)~A1, A3~熟练线 37#)，新建 220kV 双回路角钢塔 3 基 (A1~A3)。 拆除原混压四回架空线路路径长约 0.12km (A1~熟练线 35# (同塔练洞线 5#))，拆除 220kV 熟练线双回架空线路路径长约 0.22km (熟练线 35# (同塔练洞线 5#)~A3)；拆除 3 基角钢塔，其中混压四回路角钢塔 2 基 (熟练线 34# (同塔练洞线 6#)、熟练线 35# (同塔练洞线 5#))、220kV 双回路角钢塔 1 基 (熟练线 36#)。 (2) 110kV 练洞 1741 线迁改工程 本项目新建 110kV 练洞 1741 线单回地下电缆路径长约 0.72km (G1~练洞线 1#)，练洞线恢复 110kV/35kV 同塔混压双回架空线路路径长约 0.12km (熟练线 33# (同塔练洞线 7#)~G1)，新建 110kV 双回路电缆终端塔 1 基 (G1)。 拆除 110kV 练洞线单回架空线路路径长约 0.32km (练洞线 4#~练洞线 1#)，拆除 110kV/35kV 同塔混压双回架空线路路径长约 0.12km (G1~A1, 熟练线 35# (同塔练洞线 5#)~练洞线 4#)；拆除 3 基角钢塔，其中 110kV 双回路角钢塔 1 基 (练洞线 4#)、110kV 单回路角钢塔 2 基 (练洞线 2#和练洞线 3#)。拆除的同塔四回架空线路和杆塔部分计列于 220kV 熟练 4X33/4X34 线迁改工程中。

建设项目占地及总平面布置

(1) 建设项目占地

本项目新增永久用地 94m²，拆除塔基恢复永久用地为 42m²，临时用地 12515m²，其中施工期临时用地已恢复。

(2) 线路路径

220kV 熟练 4X33/4X34 线路径：新建段 220kV 架空线路起于原线路 36#塔北侧新立 A3，向南跨过练塘大道后向西跨拟建铁路至原线下新立 A1 止；恢复架线段 220kV 架空线路北段起始于原线路 36#塔北侧新立 A3，向北至原线路 37#塔止；恢复架线段 220kV 架空线路南段起始于原线路 34#塔南侧新立 A1，向西南至原线路 33#塔止。

110kV 练洞 1741 线路：新建段 110kV 电缆线路由原线路 1#塔采用电缆引下后向西，至 220kV 练塘变西南角转向南，向南跨过练塘大道后，向西电缆穿过拟建通苏嘉甬铁路，至新立 G1 杆塔止。恢复架线段 110kV 架空线路起始于原线路 6#塔南侧新立 G1，向西南至原线路 7#塔止。

本项目线路路径情况及周围环境示意图见附图 2。

建设项目环境保护投资

本项目设计投资总概算 1443 万元，其中环保投资为 39 万元，环保投资比例 2.7%；实际投资总概算 1312.4057 万元，其中环保投资为 35 万元，环保投资比例 2.7%。本项目环境保护投资详见表 4-2。

表 4-2 建设项目环境保护投资一览表

工程实施 时段	环境要素	环境保护设施、措施	环保投资 (万元)	实际环保投资 (万元)
施工阶段	生态环境	控制施工用地，减少弃土，表土保护，生态恢复	10	9.5
	大气环境	施工围挡、遮盖、定期洒水	4	3.5
	水环境	设置临时沉淀池	2	1.5
	声环境	低噪声施工设备	4	3.5
	固体废弃物	生活垃圾、建筑垃圾清运	4	3.5
运行阶段	电磁环境	合理选择导线类型、设置警示和防护指示标志	2	1.5
	声环境	选用加工工艺水平高、表面光滑的导线	2	1.5
	生态环境	植被绿化	2	1.5
环境管理		环境影响评价	5	5
		建设项目监测（验收检测及可能的投诉监测）	2	2
		竣工环保验收	2	2
合计		/	39	35

建设项目变动情况及变动原因

（1）建设项目规模重大变动情况对照分析

对照《关于印发<输变电建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办辐射[2016]84 号），本工程验收阶段与环办辐射[2016]84 号文的对比情况见表 4-3。

表 4-3 本工程验收阶段与环办辐射[2016]84 号文重大变动清单对比情况一览表

序号	环办辐射[2016]84 号	环评阶段情况	验收阶段情况	是否为重大变动
1	电压等级升高。	220kV/110kV	220kV/110kV	否
2	主变压器、换流变压器、高压电抗器等主要设备总数	不涉及	不涉及	否

	量增加超过原数量的30%。			
3	输电线路路径长度增加超过原路径长度的30%。	新建220kV熟练4X33/4X34线同塔双回架空线路路径长约0.45km，熟练线恢复同塔双回架空线路路径长约0.48km。拆除原混压四回架空线路路径长约0.12km，拆除220kV熟练线双回架空线路路径长约0.22km。 新建110kV练洞1741线单回地下电缆路径长约0.72km，练洞线恢复110kV/35kV同塔混压双回架空线路路径长约0.12km。拆除110kV练洞线单回架空线路路径长约0.32km，拆除110kV/35kV同塔混压双回架空线路路径长约0.12km。	新建220kV熟练4X33/4X34线同塔双回架空线路路径长约0.45km，熟练线恢复同塔双回架空线路路径长约0.48km。拆除原混压四回架空线路路径长约0.12km，拆除220kV熟练线双回架空线路路径长约0.22km。 新建110kV练洞1741线单回地下电缆路径长约0.72km，练洞线恢复110kV/35kV同塔混压双回架空线路路径长约0.12km。拆除110kV练洞线单回架空线路路径长约0.32km，拆除110kV/35kV同塔混压双回架空线路路径长约0.12km。	否
4	变电站、换流站、开关站、串补站站址位移超过500米。	不涉及	不涉及	否
5	输电线路横向位移超出500米的累计长度超过原路径长度的30%。	不涉及	不涉及	否
6	因输变电工程路径、站址等发生变化，导致进入新的自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等生态敏感区。	不涉及	不涉及	否
7	因输变电工程路径、站址等发生变化，导致新增的电磁和声环境敏感目标超过原数量的30%。	电磁环境敏感目标3处，1处民房、1处污水泵房、1处厂房；声环境敏感目标1处，为民房。	电磁环境敏感目标3处，1处民房、1处污水泵房、1处厂房；声环境敏感目标1处，为民房。	否
8	变电站由户内布置变为户外布置。	不涉及	不涉及	否
9	输电线路由地下电缆改为架空线路。	不涉及	不涉及	否
10	输电线路同塔多回架设改为多条线路架设累计长度超过原路径长度的30%。	架空线路：同塔双回，导线垂直排列；地下电缆：单回。	架空线路：同塔双回，导线垂直排列；地下电缆：单回。	否

(2) 环境保护设施、环境保护措施变动情况及变动原因

本项目验收阶段环境保护设施、环境保护措施与环评阶段一致，未发生变动。

(3) 周围环境敏感目标的变动情况及变动原因

本项目验收阶段环境敏感目标与环评阶段一致，未发生变动。

综上，对照《关于印发<输变电建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办辐射[2016]84 号），本项目未发生重大变动。

五、环境影响评价回顾

环境影响评价的主要环境影响预测及结论（生态、电磁、声、水、固体废物等）

《苏州 220kV 熟练线 34#-36#/110kV 练洞 1#-6#段迁改工程环境影响报告表》的主要环境影响预测及结论如下：

1、施工期环境影响预测

（1）生态环境

①土地占用

本项目用地包括永久用地和临时用地，永久用地为架空线路塔基和电缆线路电缆井（检修井）永久用地，这部分土地一经征用，其原有的使用功能将会永久改变；临时用地包括塔基施工场地、电缆通道施工场地、跨越施工场地、拆除施工场地等，其环境影响主要集中于施工期改变土地的使用功能，破坏地表土壤结构及植被，但所占用的土地在工程施工结束后，在采取适当措施（植被恢复或复耕）后可以恢复其原有功能。

本项目用地面积为 12567m²，其中新增永久用地 94m²，拆除塔基恢复永久用地为 42m²，临时用地 12515m²。本项目用地面积情况详见表 5-1。

表 5-1 本项目占地类型及数量一览表

分类	永久用地（m ² ）	临时用地（m ² ）	用地类型
新建塔基区	44	3200	耕地、林地
新建电缆通道	50	3115	耕地、林地
牵张场	/	2000	耕地、林地
跨越场	/	3000	耕地、林地
拆除塔基区	-48	1200	耕地
合计	46	12515	/

②对植物的影响

本项目所在地区主要为人工生态系统，生态评价范围内主要为常见的农田栽培植被，经生态现状调查和相关资料查询，本项目生态评价范围内未见有国家重点保护野生植物及珍稀濒危植物出现。

本项目新建线路施工建设时土地开挖等会破坏施工范围内的地表植被。开挖作业时采取分层开挖、分层堆放、分层回填的方式，尽量把原有表土回填到开挖区表层，以利于植被恢复。拆除塔基施工采用分段拆除法，拆除塔基区塔基开挖深度约 1m，

对拆除杆塔的塔基混凝土基础进行清除，开挖土方就地回填，减少对周围植物的影响。项目建成后，对架空线路塔基处及临时施工用地及时进行绿化处理和生态恢复，景观上做到与周围环境相协调。本项目永久占地面积较小，项目建设对区域植物群落及植被覆盖度基本无影响。

采取上述措施后，本项目建设对周围生态影响很小。

③对动物的影响

本项目生态评价范围内无珍稀濒危野生动物生境，经沿线生态现状调查和相关资料查询，生态评价范围内未见有国家重点保护和珍稀濒危野生动物出现，主要动物种类为鸟类、蛇、鼠等常见野生动物。

本项目对评价范围内野生动物影响主要表现为施工开挖及施工人员活动对动物栖息、觅食活动的干扰。本项目输电线路施工范围点状分布，施工为间断性的，不会对野生动物生存空间造成威胁，线路建成后，塔基占地小不连续，且架空线路下方及电缆管廊上方仍有较大空间，野生动物仍可正常活动、栖息等，不会对其生存活动造成影响。

④水土流失

本项目在施工时土方开挖、回填以及临时堆土等导致地表裸露和土层结构破坏，施工时设置围挡，合理安排施工工期，避开雨季土建施工；本项目新建架空线路和拆除架空线路施工过程中，开挖土石方绝大部分就地回填塔基坑，应尽量做到土石方平衡，对于不能平衡的土石方则应外运存放至通苏嘉甬铁路建设工程的弃土场内。施工结束后，对临时占地采取工程措施恢复水土保持功能等措施，最大程度的减少水土流失。

⑤对常熟西南部湖荡重要湿地的影响

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号）、《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）和《江苏省自然资源厅关于常熟市生态空间管控区划调整方案的复函》（苏自然资函[2024]314号），本项目用地不涉及江苏省国家级生态保护红线和江苏省生态空间管控区域，评价范围内涉及江苏省生态空间管控区域——常熟西南部湖荡重要湿地空间。根据《江苏省湿地保护条例》：禁止从事下列活动：开（围）垦、填埋湿地；挖砂、取土、开矿、挖塘、烧荒；引进外来物种或者放生动物；破坏野生动物栖息地以及鱼

类洄游通道；猎捕野生动物、捡拾鸟卵或者采集野生植物，采用灭绝性方式捕捞鱼类或者其他水生生物；取用或者截断湿地水源；其他破坏湿地及其生态功能的行为。根据《中华人民共和国湿地保护法》：禁止排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他污染湿地的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。

本项目新建线路路径距离常熟西南部湖荡重要湿地较远，不在管控区内永久占地和临时占地，本项目施工过程中禁止扩大施工范围，施工人员生活废水依托附近现有的卫生设施纳入当地污水处理系统，线路施工产生的废水主要为少量泥浆水，经临时沉淀池处理后循环使用，禁止排入湿地水体，禁止向湿地水体排放渣土。本工程不属于《江苏省湿地保护条例》中禁止从事的活动，不会向湿地水体排放污染物，本工程建设不会对常熟西南部湖荡重要湿地空间生态和水环境产生不利影响。

（2）声环境

施工阶段各施工机械设备的噪声均较高，在距挖掘机、电锯、钻孔机、混凝土振捣器、吊车分别大于 57m、100m、15m、50m、57m 时，昼间施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》70dB（A）的限值要求。本项目为线路改建工程，无夜间施工。

本项目输电线路沿线声环境保护目标为龙巷里 166 号民房，距施工场地的最近距离约为 15m，建议施工单位在高噪声设备周围设置掩蔽物进行隔声；尽量错开施工机械施工时间，闲置不用的设备应立即关闭，避免机械同时施工产生叠加影响；设置围挡，削弱噪声传播，围挡应采用彩钢板等硬质材料，围挡高度 $\geq 2.5\text{m}$ ，且须连续封闭设置；运输车辆进出施工现场应控制车速、禁止鸣笛，减少交通噪声。通过采取以上噪声污染防治措施，以确保本项目声环境保护目标处和线路路径沿线施工噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的限值要求。此外，本工程施工量小、施工时间短，对环境的影响是小范围的、短暂的，随着施工期的结束，其对环境的影响也将随之消失，对周围声环境影响较小。

（3）大气环境

施工期对大气的环境影响主要来自土建施工的开挖作业、建筑材料的运输装卸、施工现场内车辆行驶时产生的扬尘等。

施工过程中，车辆运输散体材料和废弃物时，必须密闭，避免沿途漏撒；加强材料转运与使用的管理，合理装卸，规范操作；对进出施工场地的车辆限制车速，减少

或避免产生扬尘；施工现场设置围挡，施工临时中转土方以及弃土弃渣等要合理堆放，可定期洒水进行扬尘控制；施工结束后，按“工完料尽场地清”的原则立即进行空地硬化和覆盖，减少裸露地面面积。

通过采取上述环保措施，本工程施工扬尘对周围环境影响较小。

（4）地表水环境

本工程施工过程中产生的废水主要为少量施工废水和施工人员的生活污水。

本项目施工时间短、施工范围小，施工期合理安排施工计划，线路施工产生的废水主要为少量泥浆水，经临时沉淀池去除悬浮物后回用，不外排。生活污水依托附近现有的卫生设施纳入当地污水处理系统。通过采取上述环保措施，施工过程中产生的废水不会影响周围水环境。

（5）固体废物

施工期固体废物主要为建筑垃圾和生活垃圾以及拆除线路产生的塔基、塔体、导线、金具等。施工产生的建筑垃圾若不妥善处置会产生水土流失等环境影响，产生的生活垃圾若不妥善处置则污染环境且破坏景观，拆除的线路若不妥善处置会造成资源浪费。

施工过程中的建筑垃圾分别收集堆放，弃土弃渣尽量做到土石方平衡，对于不能平衡的土石方则应外运存放至通苏嘉甬铁路建设工程的弃土场内；生活垃圾分类收集，要及时清运处理；拆除线路产生的塔体、导线、金具等由建设单位回收。

通过采取上述环保措施，施工固废对周围环境影响很小。

2、运行期环境影响预测

（1）电磁环境

本项目电磁环境影响采用理论计算和定性分析的方法进行评价。结果表明，本项目线路迁改工程在认真落实各项电磁环境保护措施的基础上，电磁环境影响较小，能够满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表1中工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100 μT公众曝露控制限值要求，线路经过耕地、道路等场所满足工频电场强度10kV/m、工频磁感应强度100 μT公众曝露控制限值要求。

（2）声环境

通过类比监测结果分析可知，从线路中心到50m外，噪声水平均没有明显衰减变化，对区域环境噪声没有明显附加影响。因此本项目迁建后的架空线路正常运行时，

线路沿线及声环境保护目标处声环境质量可以满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中相应标准限值的要求。

此外，架空线路通过选购表面光滑的导线、保持足够的导线对地高度等措施，以降低可听噪声，对线路沿线声环境保护目标的影响很小。

(3) 生态环境

运行期做好线路等相关设施的维护，加强巡查和检查，强化设备检修维护人员的生态环境保护意识教育，并严格管理，减少对项目周边的环境的影响。

3、评价结论

苏州 220kV 熟练线 34#-36#/110kV 练洞 1#-6#段迁改工程符合国家的法律法规，符合区域总体发展规划，在认真落实各项污染防治措施后，工频电场、工频磁场及噪声等能够满足相应标准限值要求，对周围环境影响较小，本项目的建设对区域生态环境的影响控制在可接受的范围。从环境影响角度分析，本项目的建设是可行的。

环境影响评价文件批复意见

《苏州 220kV 熟练线 34#-36#/110kV 练洞 1#-6#段迁改工程环境影响报告表》于 2026 年 1 月 5 日取得苏州市生态环境局的批复，文号为“苏环辐评[2025]43 号”（详见附件 1），批复内容如下：

中铁一局集团电务工程有限公司：

你单位委托南京国环科技股份有限公司编制的《苏州 220kV 熟练线 34#-36#/110kV 练洞 1#-6#段迁改工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、苏州 220kV 熟练线 34#-36#/110kV 练洞 1#-6#段迁改工程位于江苏省苏州市常熟市尚湖镇境内。工程内容为（详见《报告表》）：（1）220kV 熟练 4X33/4X34 线迁改工程：新建 220kV 同塔双回架空:线路路径长约 0.45km（熟练 4X33/4X34 线 A1-A3），新建双回路角钢塔 3 基（A1-A3）；恢复 220kV 同塔双回架空线路路径长约 0.48km（熟练线 33#（同塔练洞线 7#）-A1，A3-熟练线 37#）；拆除同塔混压四回架空线路路径长约 0.12km（A1-熟练线 35#（同塔练洞线 5#）），拆除 220kV 同塔双回架空线路路径长约 0.22km（熟练线 35#（同塔练洞线 5#）-A3），拆除 3 基角钢塔。

（2）110kV 练洞 1741 线迁改工程：新建 110kV 线单回地下电缆路径长约 0.72km（练洞 1741 线 G1-练洞线 1#），新建 110kV 双回路电缆终端塔 1 基(G1)；恢复 110kV/35kV

同塔混压双回架空线路路径长约 0.12km（熟练线 33#（同塔练洞线 7#）-G1）；拆除 110kV 练洞线单回架空线路路径长约 0.32km（练洞线 4#-练洞线 1#），拆除 110kV/35kV 同塔混压双回架空线路路径长约 0.12km（G1-A1、熟练线 35#（同塔练洞线 5#）-练洞线 4#），拆除 3 基角钢塔。

根据《报告表》评价结论，在落实《报告表》中提出的各项污染防治、生态保护措施的前提下，能满足环境保护的相关要求，项目建设具备环境可行性，从环境保护角度考虑，我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。

二、在工程设计、建设和运行管理中，你单位要认真落实《报告表》提出的各项环保措施，确保污染物达标排放。并做好以下工作：

（一）严格执行环保要求和相关设计标准、规程，优化设计方案，工程建设应符合项目所涉区域的总体规划。

（二）加强施工期的环境保护工作，尽可能减少施工过程中对土地的占用和植被的破坏，采取必要的水土保持措施，不得发生噪声和扬尘等扰民现象。施工期噪声执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）的要求。施工结束后及时做好植被、临时用地的恢复工作。

（三）严格落实控制工频电场、工频磁场的各项环境保护措施，确保工程周围区域工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。采取必要的消声降噪措施，确保该工程周围区域噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应功能区要求，防止噪声扰民。

（四）建设单位须做好与输变电工程相关科普知识的宣传工作，会同当地政府及有关部门对居民进行必要的解释、说明，取得公众对输变电工程建设的理解和支持，避免产生纠纷。

三、项目建设必须严格执行配套的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序开展竣工环境保护验收。验收合格后，项目方可正式投入运行。

四、苏州市常熟生态环境局组织实施该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作，苏州市生态环境综合行政执法局负责不定期抽查。你公司应在收到本批复后

20个工作日内，将批准后的《报告表》送苏州市常熟生态环境局，并按规定接受生态环境部门的日常监督检查。

五、建设单位是建设项目环境信息公开的主体，你单位应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发[2015]162号）做好建设项目开工前、施工期和建成后的信息公开工作。

六、本批复自下达之日起五年内建设有效。项目的性质、规模、地点、拟采取的环境保护措施发生重大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。

苏州市生态环境局

2026年1月5日

六、环境保护设施、环境保护措施落实情况（附照片）

阶段	影响类别	环境影响报告表及批复文件中要求的环境保护设施、环境保护措施	环境保护设施、环境保护措施落实情况，相关要求未落实的原因
施工期	生态影响	环评报告表： （1）加强了对管理人员和施工人员的环保教育，提高了其生态环保意识； （2）严格控制了施工临时用地范围不新建施工道路，利用现有道路运输设备、材料； （3）开挖作业时采取了分层开挖、分层堆放、分层回填的方式，做好表土剥离、分类存放； （4）合理安排了施工工期，未在连续雨天土建施工； （5）对临时堆放区域加盖苫布； （6）拆除塔基混凝土基础深度至 1m；施工结束后，及时清理了施工现场，对施工临时用地及拆除杆塔塔基处进行了绿化处理，恢复了临时占用土地原有使用功能； （7）施工照片或施工记录资料满足环境保护要求。 环评批复： 加强施工期的环境保护工作，尽可能减少施工过程中对土地的占用和植被的破坏，采取必要的水土保持措施。施工结束后及时做好植被、临时用地的恢复工作。	已落实： （1）加强了对管理人员和施工人员的环保教育，提高了其生态环保意识； （2）严格控制了施工临时用地范围不新建施工道路，利用现有道路运输设备、材料； （3）开挖作业时采取了分层开挖、分层堆放、分层回填的方式，做好表土剥离、分类存放； （4）合理安排了施工工期，未在连续雨天土建施工； （5）对临时堆放区域加盖苫布； （6）拆除塔基混凝土基础深度至 1m；施工结束后，及时清理了施工现场，对施工临时用地及拆除杆塔塔基处进行了绿化处理，恢复了临时占用土地原有使用功能； （7）施工照片、记录资料满足环境保护要求； （8）已加强施工期的环境保护工作，尽可能减少施工过程中对土地的占用和植被的破坏，采取了必要的水土保持措施。施工结束后已及时做好植被、临时用地的恢复工作。
	污染影响	地表水： 环评报告表： （1）不影响周围水环境； （2）施工照片或施工记录资料满足环境保护要求。 声环境： 环评报告表： （1）采用低噪声施工机械设备，设置围挡； （2）加强了施工管理，文明施工，错开了高噪声设备使用时间； （3）夜间不施工，施工场界满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准限值要求； （4）施工合同中明确了施工单位的噪声污染防治责任，施工单位制定了污染防治实施方案；	已落实： （1）施工期未影响周围水环境； （2）施工照片、记录资料满足环境保护要求。 已落实： （1）已采用低噪声施工机械设备，设置围挡； （2）加强了施工管理，文明施工，错开了高噪声设备使用时间； （3）夜间不施工，施工场界满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准限值要求； （4）施工合同中明确了施工单位的噪声污染防治责任，施工单位制定了污染防治实施方案； （5）施工照片、记录资料满足环境保护要求；

运行期		(5) 施工照片或施工记录资料满足环境保护要求。 环评批复： 不得发生噪声等扰民现象。施工期噪声执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）的要求。	(6) 施工期未发生噪声等扰民现象。施工期噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的要求。
		大气环境： 环评报告表： (1) 在施工场地设置了围挡，对作业处裸露地面覆盖防尘网并定期洒水。遇到四级或四级以上大风天气，停止土方作业； (2) 选用商品混凝土，加强管理，合理装卸，规范操作，在易起尘的材料堆场，采取密闭存储或采用防尘布苫盖，减少了扬尘对环境空气质量的影响； (3) 运输车辆按照规划路线和时间进行物料、渣土等的运输，采取遮盖、密闭措施，减少了沿途遗洒，不超载，经过村庄等敏感目标时控制车速； (4) 施工照片或施工记录资料满足环境保护要求。 环评批复： 不得发生扬尘等扰民现象。	已落实： (1) 在施工场地设置了围挡，对作业处裸露地面覆盖了防尘网并定期洒水。四级或四级以上大风天气已停止土方作业； (2) 选用商品混凝土，加强管理，合理装卸，规范操作，在易起尘的材料堆场，采用了防尘布苫盖，减少了扬尘对环境空气质量的影响； (3) 运输车辆按照规划路线和时间进行物料、渣土等的运输，采取了遮盖、密闭措施，减少了沿途遗洒，不超载，经过村庄等敏感目标时控制车速； (4) 施工照片、记录资料满足环境保护要求； (5) 施工期未发生扬尘等扰民现象。
		固体废物： 环评报告表： (1) 建筑垃圾、生活垃圾分类堆放收集；建筑垃圾和不能平衡的土石方外运存放至通苏嘉甬铁路建设工程的弃土场内；生活垃圾委托环卫部门及时清运，没有发生随意堆放、乱抛乱弃污染环境的情形； (2) 拆除的废旧导线及杆塔等由建设单位统一回收处理，没有发生随意堆放、乱抛乱弃污染环境的情形； (3) 施工照片或施工记录资料满足环境保护要求。	已落实： (1) 建筑垃圾、生活垃圾分类堆放收集；建筑垃圾和不能平衡的土石方外运存放至通苏嘉甬铁路建设工程的弃土场内；生活垃圾委托环卫部门及时清运，没有发生随意堆放、乱抛乱弃污染环境的情形； (2) 拆除的废旧导线及杆塔等由建设单位统一回收处理，没有发生随意堆放、乱抛乱弃污染环境的情形； (3) 施工照片、记录资料满足环境保护要求。
	生态影响	环评报告表： 制定了定期巡检计划，对设备检修维护人员进行了环保培训，加强了管理，避免对项目周边的自然植被和生态系统的破坏。	已落实： 制定了定期巡检计划，对设备检修维护人员进行了环保培训，加强了管理，避免对项目周边的自然植被和生态系统的破坏。
	污染影响	电磁环境： 环评报告表： 线路沿线相关敏感目标处满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中工频电场强度 4000V/m、工频磁感应强度 100 μ T 的公众曝露控制限值要求，线路下方距地面 1.5m 高度处满足耕地、道路等场所工频电场强度 10kV/m、工频磁	已落实： 线路沿线相关敏感目标处满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中工频电场强度 4000V/m、工频磁感应强度 100 μ T 的公众曝露控制限值要求，线路下方距地面 1.5m 高度处满足耕地、道路等场所工频电场强度 10kV/m、工频磁感应强度 100 μ T 的控制限

	感应强度 100 μ T 的控制限值要求。已设置警示和防护指示标志。 环评批复： 严格落实控制工频电场、工频磁场的各项环境保护措施，确保工程周围区域工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。	值要求。已设置警示和防护指示标志。
	声环境： 环评报告表： 架空线路沿线噪声达标。 环评批复： 采取必要的消声降噪措施，确保该工程周围区域噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应功能区要求，防止噪声扰民。	已落实： 已采取必要的消声降噪措施，架空线路沿线噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应功能区要求，未发生噪声扰民。
	其他： 环评报告表： （1）制定了环境监测计划，按照监测计划完成验收监测； （2）竣工后应在 3 个月内及时进行自主验收。 环评批复： （1）建设单位须做好与输变电工程相关科普知识的宣传工作，会同当地政府及有关部门对居民进行必要的解释、说明，取得公众对输变电工程建设的理解和支持，避免产生纠纷； （2）项目建设必须严格执行配套的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序开展竣工环境保护验收。验收合格后，项目方可正式投入运行。	已落实 （1）制定了环境监测计划，已按照监测计划完成验收监测； （2）竣工后在 3 个月内及时进行自主验收； （3）建设单位做好了与输变电工程相关科普知识的宣传工作，会同当地政府及有关部门对居民进行必要的解释、说明，取得了公众对输变电工程建设的理解和支持，避免产生纠纷； （4）项目建设严格执行配套的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，已按规定程序开展竣工环境保护验收。待验收合格后，方正式投入运行。

环境保护设施、环境保护措施照片



施工期便道生态恢复照片



线路沿线生态恢复照片



拆除塔基处生态恢复照片



安全警示标识

七、电磁环境、声环境监测（附监测点位图）

电 磁 环 境 监 测	监测因子及监测频次 监测因子：工频电场、工频磁场 监测频次：白天监测 1 次
	监测方法及监测布点 监测方法：《交流输变电工程电磁环境监测方法》（HJ681-2013）。 数据处理：每个监测点连续监测 5 次，每隔 15 秒读取一个数据，取每个监测点的 5 次读数的算术平均值作为监测结果。 监测布点： （1）架空线路断面监测以导线档距中央弧垂最低位置的横截面方向上，以弧垂最低位置处档距对应两杆塔中央连线对地投影为起点，间距 1m、5m 布设监测点，测点距线路导线投影 55m 处为止。 （2）电缆线路断面监测以电缆管廊中心线正上方为起点，测点距电缆管廊中心线 6m 处为止。监测仪器架设在地面（或立足面）上方 1.5m 高度处。 （3）敏感目标：龙巷里 166 号民房西、常熟市污水处理厂水泵房门口、练塘大道 31-1 号厂房北。 监测报告见附件 2，监测点位见附图 2。 质量控制措施： 监测单位已通过检验检测机构资质认定；监测点位置的选取具有代表性；监测所用仪器与所测对象在频率、量程、响应时间等方面符合要求，监测仪器已定期校准，并在其证书有效期内使用；每次监测前后均检查仪器，确保仪器在正常工作状态。监测人员已经业务培训，且在证书有效期内，现场监测工作有两名监测人员进行；监测中异常数据的取舍以及监测结果的数据处理已按统计学原则处理，监测时已应尽可能排除干扰因素，包括人为的干扰因素和环境干扰因素；已规范监测报告编制、审核、签发等程序，已建立完整的监测文件档案。

监测单位、监测时间、监测环境条件 监测单位：江苏海尔森检测技术服务有限公司 监测时间：2026 年 8 月 4 日 监测环境条件见下表。 表 7-1 监测环境条件一览表 <table><tr><td>时间</td><td>天气</td><td>温度</td><td>湿度</td><td>风速</td></tr><tr><td>2026 年 8 月 4 日 昼间</td><td>多云</td><td>38℃</td><td>72%</td><td>1.06~3.78m/s</td></tr></table>					时间	天气	温度	湿度	风速	2026 年 8 月 4 日 昼间	多云	38℃	72%	1.06~3.78m/s												
时间	天气	温度	湿度	风速																						
2026 年 8 月 4 日 昼间	多云	38℃	72%	1.06~3.78m/s																						
监测仪器及工况： 监测仪器信息详见下表。 表 7-2 监测仪器一览表 <table><tr><td>仪器名称</td><td>电磁辐射分析仪</td></tr><tr><td>仪器编号</td><td>HES087</td></tr><tr><td>规格型号</td><td>NBM550+EHP-50E</td></tr><tr><td>频率范围</td><td>5Hz~100kHz</td></tr><tr><td>测量范围</td><td>电场测量范围：5mV/m~100kV/m 磁场测量范围：0.3nT~10mT</td></tr><tr><td>校准证书有效期</td><td>2025 年 9 月 18 日-2026 年 9 月 17 日</td></tr></table> 监测工况详见下表。 表 7-3 监测工况一览表 <table><tr><td>名称</td><td>监测工况</td></tr><tr><td>220kV 熟练 4X33 线</td><td>电压范围 229.81kV~231.79kV，电流范围 632.57A~911.39A</td></tr><tr><td>220kV 熟练 4X34 线</td><td>电压范围 229.9kV~231.92kV，电流范围 645.58A~928.43A</td></tr><tr><td>110kV 练洞 1741 线</td><td>电压范围 111.35kV~115.4kV，电流范围 69.7A~121.25A</td></tr><tr><td>35kV 练杨 342 线</td><td>电压范围 36.48kV~37.68kV，电流范围 72.09A~115.89A</td></tr></table>					仪器名称	电磁辐射分析仪	仪器编号	HES087	规格型号	NBM550+EHP-50E	频率范围	5Hz~100kHz	测量范围	电场测量范围：5mV/m~100kV/m 磁场测量范围：0.3nT~10mT	校准证书有效期	2025 年 9 月 18 日-2026 年 9 月 17 日	名称	监测工况	220kV 熟练 4X33 线	电压范围 229.81kV~231.79kV，电流范围 632.57A~911.39A	220kV 熟练 4X34 线	电压范围 229.9kV~231.92kV，电流范围 645.58A~928.43A	110kV 练洞 1741 线	电压范围 111.35kV~115.4kV，电流范围 69.7A~121.25A	35kV 练杨 342 线	电压范围 36.48kV~37.68kV，电流范围 72.09A~115.89A
仪器名称	电磁辐射分析仪																									
仪器编号	HES087																									
规格型号	NBM550+EHP-50E																									
频率范围	5Hz~100kHz																									
测量范围	电场测量范围：5mV/m~100kV/m 磁场测量范围：0.3nT~10mT																									
校准证书有效期	2025 年 9 月 18 日-2026 年 9 月 17 日																									
名称	监测工况																									
220kV 熟练 4X33 线	电压范围 229.81kV~231.79kV，电流范围 632.57A~911.39A																									
220kV 熟练 4X34 线	电压范围 229.9kV~231.92kV，电流范围 645.58A~928.43A																									
110kV 练洞 1741 线	电压范围 111.35kV~115.4kV，电流范围 69.7A~121.25A																									
35kV 练杨 342 线	电压范围 36.48kV~37.68kV，电流范围 72.09A~115.89A																									
工频电场、工频磁场监测结果分析 本项目输电线路沿线工频电场、工频磁场监测结果详见下表。 表 7-4 输电线路沿线及周边敏感目标电磁环境工频电场、工频磁场现状 <table><tr><td>检测点序号</td><td>监测点位置</td><td>工频电场（V/m）</td><td>工频磁场（μT）</td></tr><tr><td>1</td><td>新建 110kV 练洞线地下电缆路径正上方（练塘变南）</td><td>15.81</td><td>0.3512</td></tr><tr><td>2</td><td>新建 110kV 练洞线地下电缆路径正上方（练塘大道北）</td><td>36.56</td><td>0.3490</td></tr><tr><td>3</td><td>新建 110kV 练洞线地下电缆路径正上方（练塘大道南）</td><td>163.6</td><td>0.5128</td></tr></table>					检测点序号	监测点位置	工频电场（V/m）	工频磁场（μT）	1	新建 110kV 练洞线地下电缆路径正上方（练塘变南）	15.81	0.3512	2	新建 110kV 练洞线地下电缆路径正上方（练塘大道北）	36.56	0.3490	3	新建 110kV 练洞线地下电缆路径正上方（练塘大道南）	163.6	0.5128						
检测点序号	监测点位置	工频电场（V/m）	工频磁场（μT）																							
1	新建 110kV 练洞线地下电缆路径正上方（练塘变南）	15.81	0.3512																							
2	新建 110kV 练洞线地下电缆路径正上方（练塘大道北）	36.56	0.3490																							
3	新建 110kV 练洞线地下电缆路径正上方（练塘大道南）	163.6	0.5128																							

		新建 110kV 练洞线地下电缆路径南 1m	146.2	0.4858
		新建 110kV 练洞线地下电缆路径南 2m	136.0	0.4615
		新建 110kV 练洞线地下电缆路径南 3m	131.5	0.4343
		新建 110kV 练洞线地下电缆路径南 4m	128.7	0.4125
		新建 110kV 练洞线地下电缆路径南 5m	115.9	0.4043
		新建 110kV 练洞线地下电缆路径南 6m	113.4	0.3841
	4	220kV 熟练线恢复架线段架空线路路径正下方	136.3	0.4621
	5	新建 220kV 熟练线架空线路路径正下方	126.8	0.5691
		新建 220kV 熟练线架空线路路径西 1m	125.4	0.5657
		新建 220kV 熟练线架空线路路径西 2m	132.4	0.5644
		新建 220kV 熟练线架空线路路径西 3m	130.4	0.5600
		新建 220kV 熟练线架空线路路径西 4m	128.2	0.5568
		新建 220kV 熟练线架空线路路径西 5m	127.1	0.5532
		新建 220kV 熟练线架空线路路径西 10m	122.6	0.5167
		新建 220kV 熟练线架空线路路径西 15m	121.6	0.5009
		新建 220kV 熟练线架空线路路径西 20m	106.7	0.4281
		新建 220kV 熟练线架空线路路径西 25m	80.63	0.3715
		新建 220kV 熟练线架空线路路径西 30m	50.00	0.2814
		新建 220kV 熟练线架空线路路径西 35m	35.54	0.2334
		新建 220kV 熟练线架空线路路径西 40m	23.95	0.2080
		新建 220kV 熟练线架空线路路径西 45m	15.02	0.1646
		新建 220kV 熟练线架空线路路径西 50m	9.437	0.1165
		新建 220kV 熟练线架空线路路径西 55m	6.714	0.1061
	6	龙巷里 166 号民房西	50.41	0.3745
	7	常熟市污水处理厂水泵房门口	46.52	0.3648
	8	练塘大道 31-1 号厂房北	28.88	0.2665
	9	220kV 熟练线/110kV 练洞线恢复架线段架空线路路径正下方	84.24	0.4800
		220kV 熟练线/110kV 练洞线恢复架线段架空线路路径西 1m	80.73	0.4494
		220kV 熟练线/110kV 练洞线恢复架线段架空线路路径西 2m	76.73	0.4287
		220kV 熟练线/110kV 练洞线恢复架线段架空线路路径西 3m	62.99	0.3952
		220kV 熟练线/110kV 练洞线恢复架线段架空线路路径西 4m	58.02	0.3702
		220kV 熟练线/110kV 练洞线恢复架线段架空线路路径西 5m	51.44	0.3492

220kV 熟练线/110kV 练洞线恢复架线段架空线路路径西 10m	27.98	0.3125
220kV 熟练线/110kV 练洞线恢复架线段架空线路路径西 15m	10.60	0.2770
220kV 熟练线/110kV 练洞线恢复架线段架空线路路径西 20m	6.355	0.2509
220kV 熟练线/110kV 练洞线恢复架线段架空线路路径西 25m	5.369	0.2295
220kV 熟练线/110kV 练洞线恢复架线段架空线路路径西 30m	6.094	0.2047
220kV 熟练线/110kV 练洞线恢复架线段架空线路路径西 35m	11.07	0.1881
220kV 熟练线/110kV 练洞线恢复架线段架空线路路径西 40m	10.49	0.1666
220kV 熟练线/110kV 练洞线恢复架线段架空线路路径西 45m	8.574	0.1473
220kV 熟练线/110kV 练洞线恢复架线段架空线路路径西 50m	3.560	0.1313
220kV 熟练线/110kV 练洞线恢复架线段架空线路路径西 55m	2.815	0.1222

由监测结果可知，本项目输电线路沿线及周边敏感目标工频电场强度为（2.815~163.6）V/m，工频磁感应强度为（0.1061~0.5691） μ T，所有测点均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表 1 中工频电场 4000V/m、工频磁场 100 μ T 公众暴露限值要求，线路下方距地面 1.5m 高度处的工频电场满足耕地等场所电场强度 10kV/m 的控制限值要求。

额定负载的电磁环境影响分析

根据监测结果，输电线路及周围电磁敏感目标处的工频电场强度低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的工频电场强度 4000V/m 控制限值，工频电场强度仅与运行电压相关，验收监测期间输电线路运行电压均达到设计额定电压等级，因此后期运行期间，输电线路电磁敏感目标处的工频电场强度仍将低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的工频电场强度 4000V/m。

本项目输电线路沿线及电磁环境敏感目标处的工频磁感应强度为（0.1061~0.5691） μ T，为控制限值的 0.1061%~0.5691%。本项目输电线路沿线及电磁环境敏感目标处工频磁感应强度最大值及当输电线路达到额定电流后的工频磁感应强度详见表 7-5。

表 7-5 本项目输电线路沿线及电磁环境敏感目标处工频磁场

所属线路	工频磁感应强度(μ T)	监测时最小电流(A)	设计电流(A)	占比(%)	达到额定电流后的工频磁感应强度(μ T)
220kV 熟练 4X33 线	0.5691	632.57	1000	63.2570	0.8997
220kV 熟练 4X34 线	0.5691	645.58	1000	64.5580	0.8815
110kV 练洞 1741 线	0.5691	69.7	500	13.9400	4.082

	35kV 练杨 342 线	0.5691	72.09	500	14.4180	3.947
	因此，推算到当输电线路达到额定电流后，本项目输电线路沿线及电磁环境敏感目标处的工频磁感应强度最大值仍能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的工频磁感应强度 100μT 的公众曝露控制限值要求。					

声
环
境
监
测

监测因子及监测频次

监测因子：噪声

监测频次：昼间、夜间各监测 1 次

监测方法及监测布点

监测方法：《声环境质量标准》（GB3096-2008）

数据处理：每个测点读取稳定状态的 1min 的等效声级作为监测结果。

监测布点：架空线路监测点位布置在架空线路正下方以及敏感目标龙巷里 166 号民房西。

监测报告见附件 2，监测点位图见附图 2。

质量控制措施：

检测单位已通过 CMA 计量认证，具备相应的检测资质和检测能力；检测单位制定有质量管理体系文件，实施全过程质量控制，检测报告实行三级审核；检测单位所用监测仪器均经过计量部门检定并在检定有效期内，使用前后进行校准或检查，实施全过程质量控制；检测人员持证上岗规范操作。

监测单位、监测时间、监测环境条件

监测单位：江苏海尔森检测技术服务有限公司

监测时间：2026 年 8 月 4 日

监测环境条件见下表。

表 7-5 监测环境条件一览表

时间	天气	温度	湿度	风速
2026 年 8 月 4 日 昼间	多云	38℃	72%	1.06~3.78m/s
2026 年 8 月 4 日 夜间	多云	28℃	64%	1.44~2.95m/s

监测仪器及工况

监测仪器详见下表。

表 7-6 监测仪器一览表

仪器名称	声级计	声级计
仪器编号	HES011	HES245
规格型号	AWA5688	AHAI6256-2
检定有效期	2025 年 10 月 29 日~2026 年 10 月 28 日	2026 年 5 月 20 日~2027 年 5 月 19 日
声校准器型号	HS6020	
声校准器编号	HES013	

	检定有效期	2025 年 8 月 28 日~2026 年 8 月 27 日	
	监测工况详见下表。		
	表 7-7 监测工况一览表		
	名称	监测工况	
	220kV 熟练 4X33 线	电压范围 229.81kV~231.79kV，电流范围 632.57A~911.39A	
	220kV 熟练 4X34 线	电压范围 229.9kV~231.92kV，电流范围 645.58A~928.43A	
	110kV 练洞 1741 线	电压范围 111.35kV~115.4kV，电流范围 69.7A~121.25A	
	35kV 练杨 342 线	电压范围 36.48kV~37.68kV，电流范围 72.09A~115.89A	
	噪声监测结果分析		
	本项目输电线路沿线噪声监测结果详见下表。		
表 7-8 输电线路沿线及周边敏感目标噪声监测结果			
序号	检测点位置	昼间噪声（Leq（dB（A）））	夜间噪声（Leq（dB（A）））
1	220kV 熟练线恢复架线段架空线路路径正下方	49	47
2	新建 220kV 熟练线架空线路路径正下方	51	47
3	龙巷里 166 号民房西	58	49
4	220kV 熟练线/110kV 练洞线恢复架线段架空线路路径正下方	56	48
由监测结果可知，本项目输电线路沿线及周边敏感目标昼间噪声为（49～58）dB(A)，夜间噪声为（47～49）dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 2 类标准要求，即昼间 60dB（A），夜间 50dB（A）。			
额定负载的声环境影响分析			
由监测结果可知，本项目输电线路沿线各噪声监测点处监测结果满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类标准限值要求，输电线路下的可听噪声主要是架空输电线路在运行中由于电晕放电、金具放电，在其周围形成电磁性噪声，其强度与线路负荷无关。在晴天时，人耳一般无法直接感受到线路运行噪声，测量值基本和环境背景值相当；由此可以推测，在本项目运行负荷达到额定负荷时，噪声影响基本与本次验收监测结果一致，线路沿线噪声仍能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类标准限值要求。			

八、环境影响调查

施工期

生态影响

根据现场踏勘和资料分析，本项目验收调查范围内不涉及国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地、世界自然遗产、生态保护红线区域；重要物种的天然集中分布区、栖息地，重要水生生物的产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，迁徙鸟类的重要繁殖地、停歇地、越冬地以及野生动物迁徙通道等《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中的生态敏感区。

通过现场调查，查阅环评及设计资料，对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74 号）、《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1 号）和《江苏省自然资源厅关于常熟市生态空间管控区划调整方案的复函》（苏自然资函[2024]314 号）、《江苏省自然资源厅关于苏州市生态空间管控区域评估优化成果的复函》（苏自然资函[2026]487 号），本项目不进入江苏省国家级生态保护红线和江苏省生态空间管控区域，验收调查范围内涉及江苏省生态空间管控区域——常熟西南部湖荡重要湿地。

经调查，本项目在施工期已经落实了对管理人员和施工人员的环保教育工作，提高了其生态环保意识；已严格控制了施工临时占地范围，在施工过程中充分利用了现有道路运输设备、材料等；施工过程开挖作业时采取了分层开挖、分层堆放、分层回填的方式，并已做好表土剥离、分类存放工作；已合理安排施工工期，未在雨天进行土建施工；已选择合理区域堆放土石方，对临时堆放区域加盖了苫布；塔基清除开挖的土石方已及时回填，原有塔基周围场地已及时恢复平整，临时占用的场地已进行绿化恢复。施工结束后，已及时清理施工现场，并对施工临时占地进行了固化、复绿处理，目前已恢复临时占用土地原有使用功能。

经现场勘察，土地恢复情况良好；原塔基基础混凝土已清除至地面以下 1m，并对开挖的土石方进行了及时回填；并及时对原有塔基周围场地及临时占地的场地进行平整和植被恢复，生态恢复情况良好。

污染影响

1、大气环境影响调查

合理安排了施工期；施工场地已按要求设置了围挡，裸露地面采用了防尘网覆盖保护，遇到四级及以上大风天气，未进行可能产生扬尘污染的施工作业；现场施工时做到了分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施，在建筑工地入口处设置了扬尘防治制度，公示扬尘防治措施、责任人等相关信息；材料转运与使用严格管理，规范操作，易起尘材料的存放采取了防尘措施；施工结束后，已按“工完料尽场地清”的原则，及时进行了场地恢复；施工期间未收到扬尘污染投诉，施工场地扬尘排放满足《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022）要求。通过采取上述环保措施，项目施工对周围大气环境影响较小。

2、水环境影响调查

施工废水经沉淀处理后循环使用不外排，沉渣妥善处置；施工人员生活污水纳入当地污水处理系统。通过采取上述环保措施，施工废水未对周围环境产生明显影响。

3、声环境影响调查

施工期间采用了低噪声施工机械设备，施工作业设置围挡；施工机械布置合理，加强了施工管理，文明施工，有计划的错开了高噪声设备使用时间；合理安排了施工时段，未在夜间施工，施工噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的限值要求。通过采取上述环保措施，项目施工对周围声环境影响较小。

4、固废环境影响调查

施工期加强了环境管理，生活垃圾分类收集后委托环卫部门定期清运，建筑垃圾集中堆存、遮盖，并及时清运至指定受纳场地；施工开挖的土石方用于平整填方，基本做到土石方平衡，施工弃渣已妥善处置；拆除的杆塔、导线等进行了回收处置，施工迹地已清理并及时恢复了原有土地使用功能。因此，项目施工期固废对周边环境影

环境保护设施调试期

生态影响

在项目运行期间，已加强对沿线的巡查和检查工作。同时，对设备检修维护人员的生态环境保护意识教育已全面展开，并实行严格的管理措施，未对项目周边的自然植被和生态系统造成破坏。

污染影响

1、电磁环境影响调查

经现场勘察，架空线路对地高度满足设计要求；优化了导线相间距离以及导线布置方式，新建杆塔设置了警示和防护指示标志。

验收监测结果表明，线路沿线及相关敏感目标处满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中工频电场强度 4000V/m、工频磁感应强度 100 μ T 的公众曝露控制限值要求，线路下方距地面 1.5m 高度处的工频电场满足耕地等场所电场强度 10kV/m 的控制限值要求。

2、声环境影响调查

验收监测结果表明，本项目架空线路沿线及周边敏感目标昼间、夜间噪声均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准要求。

3、水环境影响调查

本项目输电线路运营期无废水产生，对周围环境没有影响。

4、固体废物环境影响调查

本项目输电线路运营期无固废产生，对周围环境没有影响。

九、环境管理与监测计划

环境管理机构设置（分施工期和环境保护设施调试期）

1、施工期

施工期间环境管理的责任和义务，由建设单位和施工单位等共同承担。

建设单位安排了人员具体负责落实项目环境保护设计内容，监督施工期环保措施的实施，协调好各部门或团体之间的环保工作和处理施工中出现的环保问题。

施工单位在施工期间指派了人员具体负责执行有关的环境保护对策措施，并接受生态环境管理部门对环保工作的监督和管理。

2、环境保护设施调试期

本项目竣工后建设单位已在3个月内及时进行自主验收，建设单位设立了环保工作人员负责本项目运行期间的环境保护工作，其主要工作内容如下：

①贯彻执行国家及地方环境保护法律、法规和方针政策，以及各级生态环境主管部门的要求；

②落实运行期环境保护措施，制定运行期的环境管理办法和制度；

③若项目实施过程中发生重大变更，按规定履行相关环保手续；

④落实运行期的环境监测，并对结果进行统计分析和数据管理。

本项目通过验收后资产移交供电公司，移交后由供电公司承担运营期的管理责任。

环境监测计划落实情况及环境保护档案管理情况

环境保护设施调试运行期间由江苏海尔森检测技术服务有限公司对项目电磁环境、噪声进行了竣工环保验收监测。

本项目环境保护设施调试期环境监测计划见下表。

表 9-1 环境监测计划

序号	名称		内容
1	工频电场 工频磁场	点位布设	线路沿线及电磁环境敏感目标
		监测项目	工频电场强度（kV/m）、工频磁感应强度（ μT ）
		监测方法	《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）
		监测频次和时间	结合竣工环境保护验收各监测点昼间监测一次，其后有环保投诉时监测
2	噪声	点位布设	架空线路沿线及声环境保护目标
		监测项目	昼间、夜间等效声级， $\text{Leq}(\text{dB(A)})$

		监测方法	《声环境质量标准》（GB3096-2008）
		监测频次和时间	结合竣工环境保护验收昼间、夜间各监测一次，其后有环保投诉时监测

环境管理状况分析

经过调查核实，施工期和环境保护设施调试运行期间环境管理状况良好，认真落实、实施了环境影响报告表及其批复提出的环保措施。

（1）建设单位环境管理组织机构健全。

（2）环境管理制度和应急预案完善。

（3）环保工作管理规范，本项目执行了环境影响评价制度及环保“三同时”管理制度。

十、竣工环保验收调查结论与建议

调查结论

1、工程基本情况

本验收项目建设规模如下：

（1）220kV 熟练 4X33/4X34 线迁改工程

本项目新建 220kV 熟练 4X33/4X34 线同塔双回架空线路路径长约 0.45km（A1~A3），熟练线恢复同塔双回架空线路路径长约 0.48km（熟练线 33#（同塔练洞线 7#）~A1，A3~熟练线 37#），新建 220kV 双回路角钢塔 3 基（A1~A3）。

拆除原混压四回架空线路路径长约 0.12km（A1~熟练线 35#（同塔练洞线 5#）），拆除 220kV 熟练线双回架空线路路径长约 0.22km（熟练线 35#（同塔练洞线 5#）~A3）；拆除 3 基角钢塔，其中混压四回路角钢塔 2 基（熟练线 34#（同塔练洞线 6#）、熟练线 35#（同塔练洞线 5#））、220kV 双回路角钢塔 1 基（熟练线 36#）。

（2）110kV 练洞 1741 线迁改工程

本项目新建 110kV 练洞 1741 线单回地下电缆路径长约 0.72km（G1~练洞线 1#），练洞线恢复 110kV/35kV 同塔混压双回架空线路路径长约 0.12km（熟练线 33#（同塔练洞线 7#）~G1），新建 110kV 双回路电缆终端塔 1 基（G1）。

拆除 110kV 练洞线单回架空线路路径长约 0.32km（练洞线 4#~练洞线 1#），拆除 110kV/35kV 同塔混压双回架空线路路径长约 0.12km（G1~A1，熟练线 35#（同塔练洞线 5#）~练洞线 4#）；拆除 3 基角钢塔，其中 110kV 双回路角钢塔 1 基（练洞线 4#）、110kV 单回路角钢塔 2 基（练洞线 2#和练洞线 3#）。拆除的同塔四回架空线路和杆塔部分计列于 220kV 熟练 4X33/4X34 线迁改工程中。

2、环境保护措施落实情况

本项目环评及批复文件中提出了较为全面、详细的环境保护设施、环境保护措施，各项环境保护设施、环境保护措施在工程实际建设和运行中已基本得到落实。

3、施工期环境影响调查结论

（1）生态环境影响调查

经调查，本项目在施工期已经落实了对管理人员和施工人员的环保教育工作，提高了其生态环保意识；已严格控制了施工临时占地范围，在施工过程中充分利用了现有道路运输设备、材料等；施工过程开挖作业时采取了分层开挖、分层堆放、分层回

填的方式，并已做好表土剥离、分类存放工作；已合理安排施工工期，未在雨天进行土建施工；已选择合理区域堆放土石方，对临时堆放区域加盖了苫布；塔基清除开挖的土石方已及时回填，原有塔基周围场地已及时恢复平整，临时占用的场地已进行绿化恢复；施工结束后，已及时清理施工现场，并对施工临时占地进行了固化、复绿处理，目前已恢复临时占用土地原有使用功能。

经现场勘察，土地恢复情况良好；原塔基基础混凝土已清除至地面以下 1m，并对开挖的土石方进行了及时回填；并及时对原有塔基周围场地及临时占地的场地进行平整和植被恢复，生态恢复情况良好。

（2）大气环境影响调查

合理安排了施工期；施工场地已按要去设置了围挡，裸露地面采用了防尘网覆盖保护，遇到四级及以上大风天气，未进行可能产生扬尘污染的施工作业；现场施工时做到了分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施，在建筑工地入口处设置了扬尘防治制度，公示扬尘防治措施、责任人等相关信息；材料转运与使用严格管理，规范操作，易起尘材料的存放采取了防尘措施；施工结束后，已按“工完料尽场地清”的原则，及时进行了场地恢复；施工期间未收到扬尘污染投诉，施工场地扬尘排放满足《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022）要求。通过采取上述环保措施，项目施工对周围大气环境影响较小。

（3）水环境影响调查

施工废水经沉淀处理后循环使用不外排，沉渣妥善处置；施工人员生活污水纳入当地污水处理系统。通过采取上述环保措施，施工废水未对周围环境产生明显影响。

（4）声环境影响调查

施工期间采用了低噪声施工机械设备，施工作业设置围挡；施工机械布置合理，加强了施工管理，文明施工，有计划的错开了高噪声设备使用时间；合理安排了施工时段，未在夜间施工，施工噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的限值要求。通过采取上述环保措施，项目施工对周围声环境影响较小。

（5）固废环境影响调查

施工期加强了环境管理，生活垃圾分类收集后委托环卫部门定期清运，建筑垃圾集中堆存、遮盖，并及时清运至指定受纳场地；施工开挖的土石方用于平整填方，基本做到土石方平衡，施工弃渣已妥善处置；拆除的杆塔、导线等进行了回收处置，施

工迹地已清理并及时恢复了原有土地使用功能。因此，项目施工期固废对周边环境影响不大。

4、环境保护设施调试期环境影响调查结论

(1) 生态环境影响调查

在项目运行期间，已加强对沿线的巡查和检查工作。同时，对设备检修维护人员的生态环境保护意识教育已全面展开，并实行严格的管理措施，未对项目周边的自然植被和生态系统造成破坏。

(2) 电磁环境影响调查

经现场勘察，架空线路对地高度满足设计要求；优化了导线相间距离以及导线布置方式，新建杆塔设置了警示和防护指示标志。

验收监测结果表明，线路沿线及相关敏感目标处满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中工频电场强度 4000V/m、工频磁感应强度 100 μ T 的公众曝露控制限值要求，线路下方距地面 1.5m 高度处的工频电场满足耕地等场所电场强度 10kV/m 的控制限值要求。

(3) 声环境影响调查

验收监测结果表明，本项目架空线路沿线及周边敏感目标昼间、夜间噪声均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准要求。

5、环境管理及监测计划落实情况调查

中铁一局集团电务工程有限公司根据本项目的环境影响和环境管理要求，制定了环境监测计划，并已开始实施。通过及时掌握工程电磁、噪声等环境状况，及时发现并解决问题，从管理上保证环境保护措施的有效实施。

6、验收调查总结论

根据现场调查及监测，中铁一局集团电务工程有限公司“苏州 220kV 熟练线 34#-36#/110kV 练洞 1#-6#段迁改工程”在设计、施工和环境保护设施调试期均已落实了环境影响报告表及其批复文件中的要求，采取了有效地环境保护措施和生态保护措施。验收监测结果表明“苏州 220kV 熟练线 34#-36#/110kV 练洞 1#-6#段迁改工程”电磁环境和声环境影响可以满足环评及批复文件的标准限值要求，其他环境要素也均符合环评及批复文件的要求，建议该项目通过竣工环境保护验收。

建议

- 1、加强对本项目的日常维护工作，确保各项环保指标稳定达标；
- 2、验收结束后，及时移交本项目的环保资料。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）： 中铁一局集团电务工程有限公司


填表人（签字）：

项目经办人（签字）：

建设项目	项目名称		苏州 220kV 熟练线 34#-36#/110kV 练洞 1#-6#段迁改工程				项目代码		/		建设地点		江苏省苏州市常熟市尚湖镇					
	行业类别 (分类管理名录)		五十五-161 输变电工程				建设性质		☒ 新建（迁建） ☒ 改建 ☐ 扩建 ☐ 技术改造									
	设计生产能力		(1) 220kV 熟练 4X33/4X34 线迁改工程 本项目新建 220kV 熟练 4X33/4X34 线同塔双回架空线路路径长约 0.45km (A1~A3)，熟练线恢复同塔双回架空线路路径长约 0.48km (熟练线 33# (同塔练洞线 7#)~A1, A3~熟练线 37#)，新建 220kV 双回路角钢塔 3 基 (A1~A3)。 拆除原混压四回架空线路路径长约 0.12km (A1~熟练线 35# (同塔练洞线 5#))，拆除 220kV 熟练线双回架空线路路径长约 0.22km (熟练线 35# (同塔练洞线 5#)~A3)；拆除 3 基角钢塔，其中混压四回路角钢塔 2 基 (熟练线 34# (同塔练洞线 6#)、熟练线 35# (同塔练洞线 5#))、220kV 双回路角钢塔 1 基 (熟练线 36#)。 (2) 110kV 练洞 1741 线迁改工程 本项目新建 110kV 练洞 1741 线单回地下电缆路径长约 0.72km (G1~练洞线 1#)，练洞线恢复 110kV/35kV 同塔混压双回架空线路路径长约 0.12km (熟练线 33# (同塔练洞线 7#)~G1)，新建 110kV 双回路电缆终端塔 1 基 (G1)。 拆除 110kV 练洞线单回架空线路路径长约 0.32km (练洞线 4#~练洞线 1#)，拆除 110kV/35kV 同塔混压双回架空线路路径长约 0.12km (G1~A1, 熟练线 35# (同塔练洞线 5#)~练洞线 4#)；拆除 3 基角钢塔，其中 110kV 双回路角钢塔 1 基 (练洞线 4#)、110kV 单回路角钢塔 2 基 (练洞线 2#和练洞线 3#)。拆除的同塔四回架空线路和杆塔部分计列于 220kV 熟练 4X33/4X34 线迁改工程中。				实际生产能力		(1) 220kV 熟练 4X33/4X34 线迁改工程 本项目新建 220kV 熟练 4X33/4X34 线同塔双回架空线路路径长约 0.45km (A1~A3)，熟练线恢复同塔双回架空线路路径长约 0.48km (熟练线 33# (同塔练洞线 7#)~A1, A3~熟练线 37#)，新建 220kV 双回路角钢塔 3 基 (A1~A3)。 拆除原混压四回架空线路路径长约 0.12km (A1~熟练线 35# (同塔练洞线 5#))，拆除 220kV 熟练线双回架空线路路径长约 0.22km (熟练线 35# (同塔练洞线 5#)~A3)；拆除 3 基角钢塔，其中混压四回路角钢塔 2 基 (熟练线 34# (同塔练洞线 6#)、熟练线 35# (同塔练洞线 5#))、220kV 双回路角钢塔 1 基 (熟练线 36#)。 (2) 110kV 练洞 1741 线迁改工程 本项目新建 110kV 练洞 1741 线单回地下电缆路径长约 0.72km (G1~练洞线 1#)，练洞线恢复 110kV/35kV 同塔混压双回架空线路路径长约 0.12km (熟练线 33# (同塔练洞线 7#)~G1)，新建 110kV 双回路电缆终端塔 1 基 (G1)。 拆除 110kV 练洞线单回架空线路路径长约 0.32km (练洞线 4#~练洞线 1#)，拆除 110kV/35kV 同塔混压双回架空线路路径长约 0.12km (G1~A1, 熟练线 35# (同塔练洞线 5#)~练洞线 4#)；拆除 3 基角钢塔，其中 110kV 双回路角钢塔 1 基 (练洞线 4#)、110kV 单回路角钢塔 2 基 (练洞线 2#和练洞线 3#)。拆除的同塔四回架空线路和杆塔部分计列于 220kV 熟练 4X33/4X34 线迁改工程中。						环评单位		南京国环科技股份有限公司	
	环评文件审批机关		苏州市生态环境局		审批文号		苏环辐评[2025]43 号		环评文件类型		报告表							
	开工日期		2026.2		竣工日期		2026.5		排污许可证申领时间		/							
	环保设施设计单位		常熟市苏明实业有限公司		环保设施施工单位		苏州电力建设工程有限公司 常熟市苏明实业有限公司		本工程排污许可证编号		/							
	环境保护设施监测单位		江苏海尔森检测技术服务有限公司		验收监测时工况		220kV 熟练 4X33 线		电压范围 229.81kV~231.79kV，电流范围 632.57A~911.39A									
							220kV 熟练 4X34 线		电压范围 229.9kV~231.92kV，电流范围 645.58A~928.43A									
							110kV 练洞 1741 线		电压范围 111.35kV~115.4kV，电流范围 69.7A~121.25A									
							35kV 练杨 342 线		电压范围 36.48kV~37.68kV，电流范围 72.09A~115.89A									
投资总概算（万元）		1443		环保投资总概算（万元）		39		所占比例（%）		2.7								
实际总投资		1312.4057		实际环保投资（万元）		35		所占比例（%）		2.7								
废水治理（万元）		1.5	废气治理（万元）	3.5	噪声治理（万元）	5	固体废物治理（万元）		3.5	绿化及生态（万元）	11	其他（万	10.5					

														元)	
新增废水处理设施能力		/				新增废气处理设施能力			/			年平均工作时间		/	
运营单位		中铁一局集团电务工程有限公司			运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）				916100002218405809			验收时间		2026 年 8 月 4 日	
污 染 物 排 放 达 标 与 总 量 控 制 （ 工 业 建 设 项 目 详 填 ）	污 染 物	原有排放量 （1）	本期工程实 际排放浓度 （2）	本期工程允 许排放浓度 （3）	本期工程产 生量 （4）	本期工程自 身削减量 （5）	本期工程 实际排放 量 （6）	本期工程核定 排放总量 （7）	本期工程“以 新带老”削减 量 （8）	全厂实际 排放总量 （9）	全厂核定排 放总量 （10）	区域平衡替 代削减量 （11）	排放增减 量 （12）		
	废 水	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	化学需氧量	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	氨氮	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	石油类	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	废 气	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	二氧化硫	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	烟 尘	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	工业粉尘	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	氮氧化物	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	工业固体废物	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	与项目有关的其 他特征污染物		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			


注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

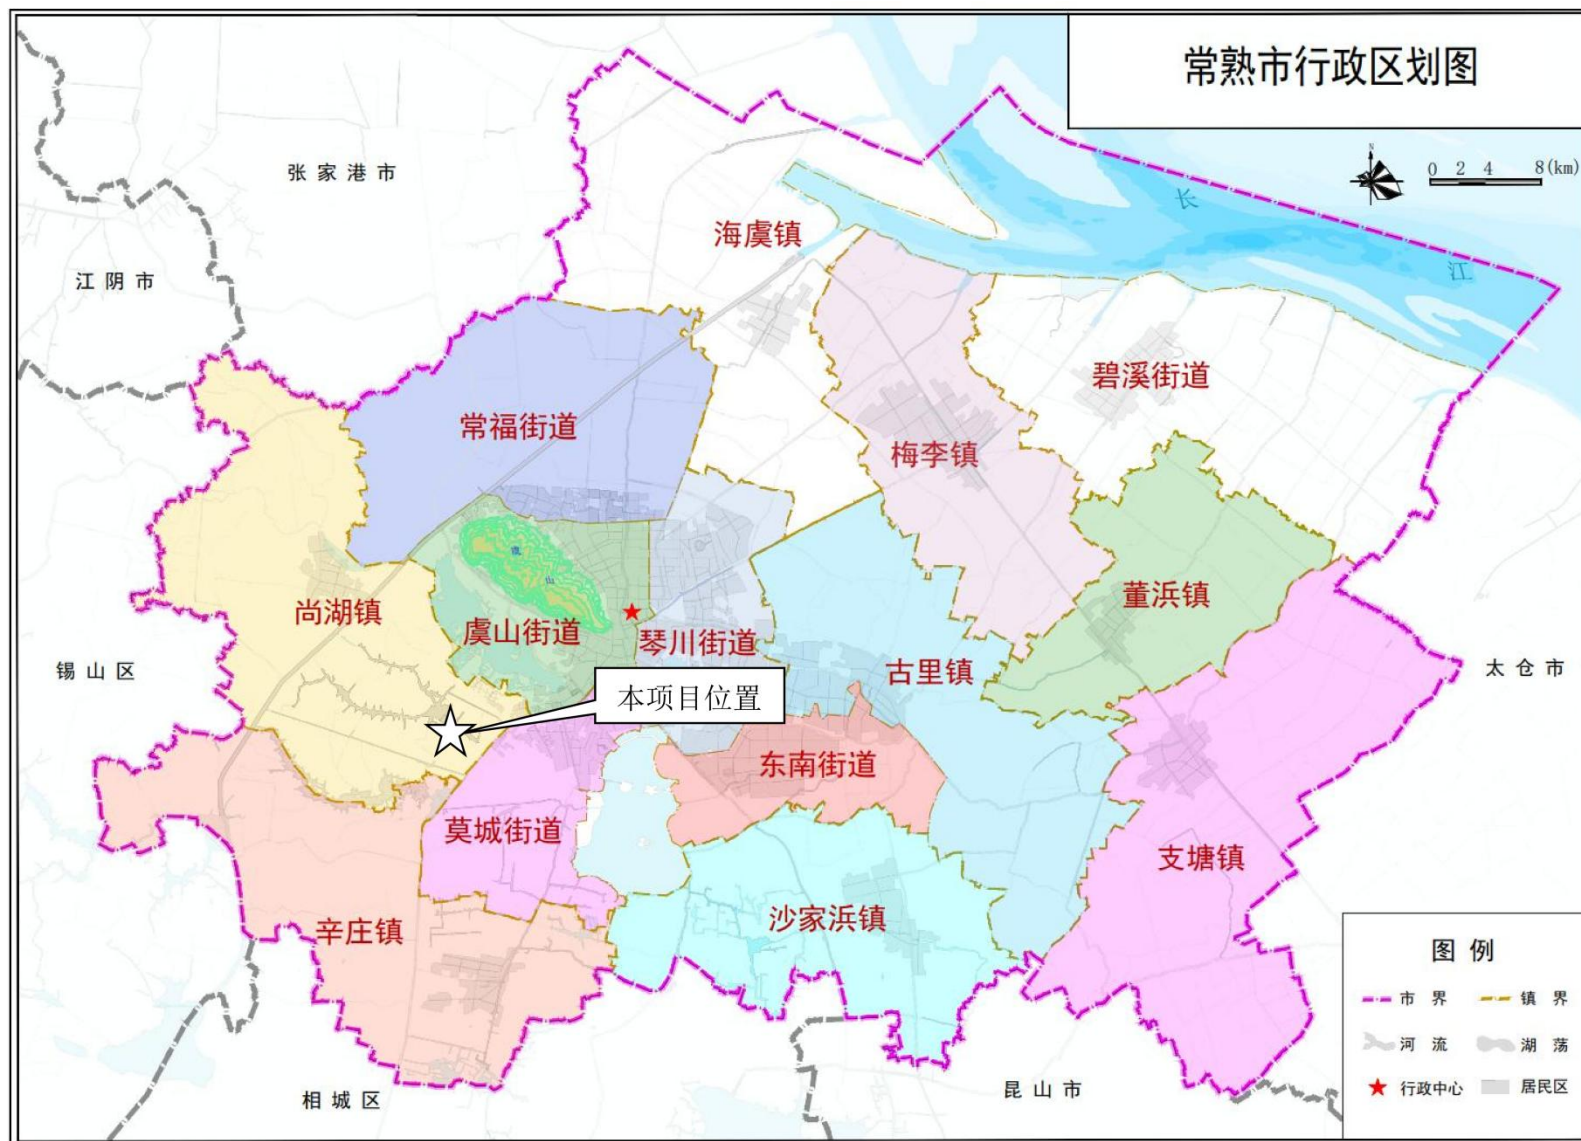

附图1 本项目地理位置示意图



附图2 监测点位示意图及线路路径图

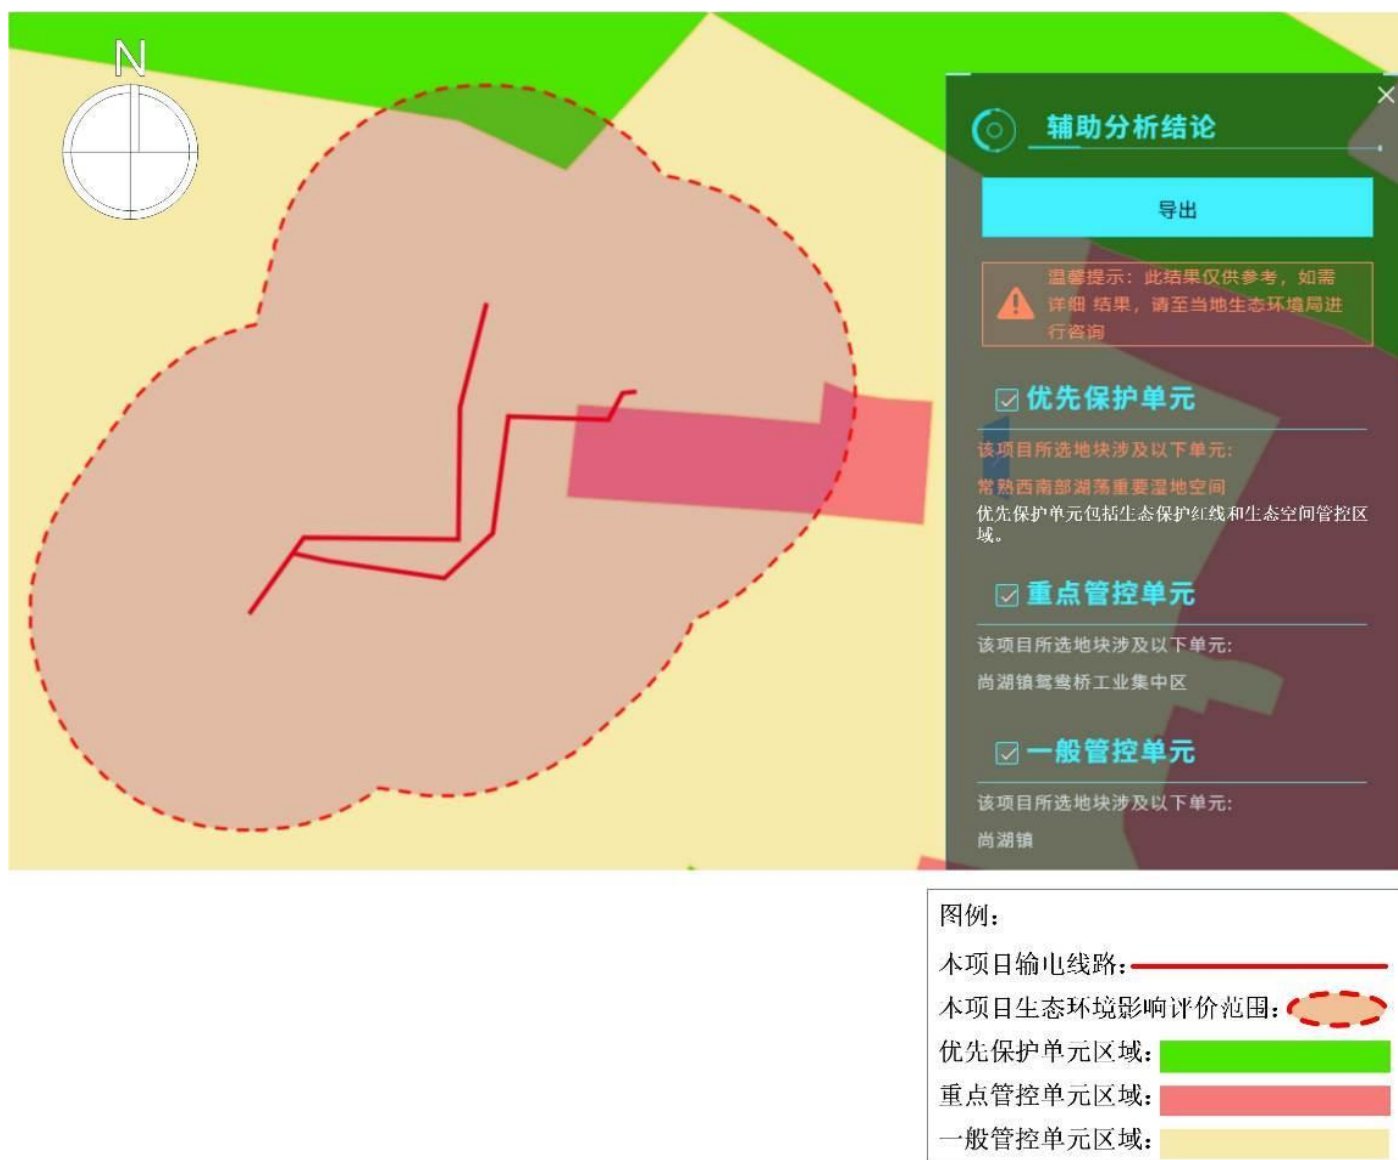

附图 3 本项目与江苏省生态空间保护区域相对位置关系示意图

苏州市生态环境局 行政 许 可 决 定 书

苏环辐评准字〔2025〕第 43 号

中铁一局集团电务工程有限公司：

你单位于 2025 年 12 月 15 日向本机关提交了《苏州 220kV 熟练线 34#-36#/110kV 练洞 1#-6#段迁改工程环境影响报告表》及相关材料。经审查，符合法定条件、标准，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款的规定、《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第一款的规定，本机关决定：

准予行政许可，许可内容见苏环辐评〔2025〕43 号。



苏州市生态环境局文件

苏环辐评〔2025〕43号

关于苏州 220kV 熟练线 34#-36#/110kV 练洞 1#-6#段迁改工程环境影响报告表的批复

中铁一局集团电务工程有限公司：

你单位委托南京国环科技股份有限公司编制的《苏州220kV熟练线34#-36#/110kV练洞1#-6#段迁改工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、苏州220kV熟练线34#-36#/110kV练洞1#-6#段迁改工程位于江苏省苏州市常熟市尚湖镇境内。工程内容为（详见《报告表》）：

（1）220kV熟练4X33/4X34线迁改工程：新建220kV同塔双回架空线路路径长约0.45km（熟练4X33/4X34线A1-A3），新建双回路角钢塔3基（A1-A3）；恢复220kV同塔双回架空线路路径长约0.48km（熟练线33#（同塔练洞线7#）-A1，A3-熟练线37#）；拆除同塔混压四回架空线路路径长约0.12km（A1-熟练线35#（同塔练洞线

5#))，拆除220kV同塔双回架空线路路径长约0.22km(熟练线35#(同塔练洞线5#)-A3)，拆除3基角钢塔。(2)110kV练洞1741线迁改工程：新建110kV线单回地下电缆路径长约0.72km(练洞1741线G1-练洞线1#)，新建110kV双回路电缆终端塔1基(G1)；恢复110kV/35kV同塔混压双回架空线路路径长约0.12km(熟练线33#(同塔练洞线7#)-G1)；拆除110kV练洞线单回架空线路路径长约0.32km(练洞线4#-练洞线1#)，拆除110kV/35kV同塔混压双回架空线路路径长约0.12km(G1-A1、熟练线35#(同塔练洞线5#)-练洞线4#)，拆除3基角钢塔。

根据《报告表》评价结论，在落实《报告表》中提出的各项污染防治、生态保护措施的前提下，能满足环境保护的相关要求，项目建设具备环境可行性，从环境保护角度考虑，我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。

二、在工程设计、建设和运行管理中，你单位要认真落实《报告表》提出的各项环保措施，确保污染物达标排放。并做好以下工作：

(一)严格执行环保要求和相关设计标准、规程，优化设计方案，工程建设应符合项目所涉区域的总体规划。

(二)加强施工期的环境保护工作，尽可能减少施工过程中对土地的占用和植被的破坏，采取必要的水土保持措施，不得发生噪声和扬尘等扰民现象。施工期噪声执行《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-2011)的要求。施工结束后及时做好植被、临

时土地的恢复工作。

（三）严格落实控制工频电场、工频磁场的各项环境保护措施，确保工程周围区域工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。采取必要的消声降噪措施，确保该工程周围区域噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应功能区要求，防止噪声扰民。

（四）建设单位须做好与输变电工程相关科普知识的宣传工作，会同当地政府及有关部门对居民进行必要的解释、说明，取得公众对输变电工程建设的理解和支持，避免产生纠纷。

三、项目建设必须严格执行配套的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序开展竣工环境保护验收。验收合格后，项目方可正式投入运行。

四、苏州市常熟生态环境局组织实施该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作，苏州市生态环境综合行政执法局负责不定期抽查。你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告表》送苏州市常熟生态环境局，并按规定接受生态环境部门的日常监督检查。

五、建设单位是建设项目环境信息公开的主体，你单位应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发〔2015〕162号）做好建设项目开工前、施工期和建成后的信息公开工作。

六、本批复自下达之日起五年内建设有效。项目的性质、规模、地点、拟采取的环境保护措施发生重大变动的，应重新报批

项目的环境影响评价文件。



抄送：苏州市生态环境综合行政执法局、苏州市常熟生态环境局。

苏州市生态环境局

2026年1月5日印发

附件 2 验收监测报告及监测单位资质证书



江苏海尔森检测技术服务有限公司

检 测 报 告

报告编号: HES-R202608007

项目名称: 苏州 220kV 熟练线 34#-36#/110kV 练洞 1#-6#段
迁改工程周围电磁环境和声环境验收监测

受检单位: 中铁一局集团电务工程有限公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2026 年 8 月 12 日



地址: 苏州工业园区华云路 1 号东坊产业园 3 栋 501-1 室
邮编: 215123

电话: 0512-67487609
E-mail: healths_sz@126.com



检测报告

报告编号: HES-R202608007

检测报告说明

- 1、对本报告有异议者, 请于收到报告之日起十五日内向本机构提出。对于无法复现的样品, 不受理申诉。
- 2、送样委托检测, 仅对送检样品检测数据负责, 不对样品来源负责。
- 3、检测报告无编制人、审核人及签发人签字无效; 涂改或无检验检测专用章无效; 未经本机构同意, 部分复制本报告无效。
- 4、本检测报告及检测机构名称不得用于产品标签、广告、商品宣传和评优等。

文件编号: HES-R202608007

检测报告

报告编号: HES-R202608007

委托单位	中铁一局集团电务工程有限公司		
受检单位	中铁一局集团电务工程有限公司		
项目建设地址	江苏省苏州市常熟市尚湖镇		
检测类别	委托检测	检测日期	2026 年 08 月 04 日
检测内容	1. 检测对象：苏州 220kV 熟练线 34#-36#/110kV 练洞 1#-6#段迁改工程周围 2. 检测项目：工频电场、工频磁场、噪声		
检测依据	1. 《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013） 2. 《辐射环境保护管理导则 电磁辐射监测仪器和方法》（HJ/T 10.2-1996） 3. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）		
评价依据	1. 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014） 2. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）		
评价结论： 1：苏州 220kV 熟练线 34#-36#/110kV 练洞 1#-6#段迁改工程周围的工频电场强度范围为（2.815~163.6）V/m、工频磁感应强度范围为（0.1061~0.5691）μT，均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中频率 50Hz 条件下公众暴露控制限值“工频电场强度<4000V/m、工频磁感应强度<100 μT”的要求。 2：苏州 220kV 熟练线 34#-36#/110kV 练洞 1#-6#段迁改工程周围的昼间噪声值为（49~58）dB(A)，夜间噪声值为（47~49）dB(A)。			

1. 检测对象: 苏州 220kV 熟练线 34#-36#/110kV 练洞 1#-6#段迁改工程周围

检测报告

报告编号: HES-R202608007

委托单位	中铁一局集团电务工程有限公司			
受检单位	中铁一局集团电务工程有限公司			
项目建设地址	江苏省苏州市常熟市尚湖镇			
检测仪器				
序号	仪器名称	仪器型号及技术指标	仪器编号	检定信息
1	电磁辐射分析仪	NBM550+EHP-50E 频率范围：5Hz-100 kHz 电场测量范围： 5mV/m~100kV/m；磁场测量 范围：0.3nT~10mT	HES087	证书编号： 2025F33-10-6115442002 2025.9.18~2026.9.17
2	声级计	AWA5688 测量范围（A 声级） 30dB~120dB	HES011	证书编号：802803065 2025.10.29~2026.10.28
3	声级计	AHA16256-2 测量范围（A 声级） 25dB~144dB	HES245	证书编号：803043258 2026.5.20~2027.5.19
4	声校准器	HS6020 声压级 94dB	HES013	证书编号：802757207 2025.8.28~2026.8.27
5	热线式风速仪	AR866A 测量范围：0~30m/s	HES170	证书编号：802763032 2025.9.5~2026.9.4
检测环境条件	昼间 天气：多云 温度（℃）：38 湿度（%）：72 风速（m/s）：1.06~3.78 夜间 天气：多云 温度（℃）：28 湿度（%）：64 风速（m/s）：1.44~2.95			
检测工况	220kV 熟练 4X33 线（电压范围 229.81kV~231.79kV，电流范围 632.57A~911.39A）； 220kV 熟练 4X34 线（电压范围 229.9kV~231.92kV，电流范围 645.58A~928.43A）； 110kV 练洞 1741 线（电压范围 111.35kV~115.4kV，电流范围 69.7A~121.25A）； 35kV 练杨 342 线（电压范围 36.48kV~37.68kV，电流范围 72.09A~115.89A）。			
备注	1：昼夜间噪声检测时间均为 2026 年 8 月 4 号，昼间噪声检测时间段为 9：33~10：35；夜间噪声检测时间段为 23：15~23：48； 2：本项目检测点位由委托单位提供。			

检测结果:

表 1 : 苏州 220kV 熟练线 34#-36#/110kV 练洞 1#-6#段迁改工程周围工频电、磁场检测结果

检测点序号	检测点位置	工频电场 (V/m)	工频磁场 (μT)
1	新建 110kV 练洞线地下电缆路径正上方 (练塘变南)	15.81	0.3512
2	新建 110kV 练洞线地下电缆路径正上方 (练塘大道北)	36.56	0.3490
3	新建 110kV 练洞线地下电缆路径正上方 (练塘大道南)	163.6	0.5128
	新建 110kV 练洞线地下电缆路径南 1m	146.2	0.4858
	新建 110kV 练洞线地下电缆路径南 2m	136.0	0.4615
	新建 110kV 练洞线地下电缆路径南 3m	131.5	0.4343
	新建 110kV 练洞线地下电缆路径南 4m	128.7	0.4125
	新建 110kV 练洞线地下电缆路径南 5m	115.9	0.4043
	新建 110kV 练洞线地下电缆路径南 6m	113.4	0.3841
4	220kV 熟练线恢复架线段架空线路路径正下方	136.3	0.4621
5	新建 220kV 熟练线架空线路路径正下方	126.8	0.5691
	新建 220kV 熟练线架空线路路径西 1m	125.4	0.5657
	新建 220kV 熟练线架空线路路径西 2m	132.4	0.5644
	新建 220kV 熟练线架空线路路径西 3m	130.4	0.5600
	新建 220kV 熟练线架空线路路径西 4m	128.2	0.5568
	新建 220kV 熟练线架空线路路径西 5m	127.1	0.5532
	新建 220kV 熟练线架空线路路径西 10m	122.6	0.5167
	新建 220kV 熟练线架空线路路径西 15m	121.6	0.5009
	新建 220kV 熟练线架空线路路径西 20m	106.7	0.4281
	新建 220kV 熟练线架空线路路径西 25m	80.63	0.3715
	新建 220kV 熟练线架空线路路径西 30m	50.00	0.2814
	新建 220kV 熟练线架空线路路径西 35m	35.54	0.2334
	新建 220kV 熟练线架空线路路径西 40m	23.95	0.2080
	新建 220kV 熟练线架空线路路径西 45m	15.02	0.1646
	新建 220kV 熟练线架空线路路径西 50m	9.437	0.1165

技术
★
检测

检测报告

报告编号: HES-R202608007

	新建 220kV 熟练线架空线路路径西 55m	6.714	0.1061
6	龙巷里 166 号民房西	50.41	0.3745
7	常熟市污水处理厂水泵房门口	46.52	0.3648
8	练塘大道 31-1 号厂房北	28.88	0.2665
9	220kV 熟练线/110kV 练洞线恢复架线段架空线路路径 正下方	84.24	0.4800
	220kV 熟练线/110kV 练洞线恢复架线段架空线路路径 西 1m	80.73	0.4494
	220kV 熟练线/110kV 练洞线恢复架线段架空线路路径 西 2m	76.73	0.4287
	220kV 熟练线/110kV 练洞线恢复架线段架空线路路径 西 3m	62.99	0.3952
	220kV 熟练线/110kV 练洞线恢复架线段架空线路路径 西 4m	58.02	0.3702
	220kV 熟练线/110kV 练洞线恢复架线段架空线路路径 西 5m	51.44	0.3492
	220kV 熟练线/110kV 练洞线恢复架线段架空线路路径 西 10m	27.98	0.3125
	220kV 熟练线/110kV 练洞线恢复架线段架空线路路径 西 15m	10.60	0.2770
	220kV 熟练线/110kV 练洞线恢复架线段架空线路路径 西 20m	6.355	0.2509
	220kV 熟练线/110kV 练洞线恢复架线段架空线路路径 西 25m	5.369	0.2295
	220kV 熟练线/110kV 练洞线恢复架线段架空线路路径 西 30m	6.094	0.2047
	220kV 熟练线/110kV 练洞线恢复架线段架空线路路径 西 35m	11.07	0.1881

220kV 熟练线/110kV 练洞线恢复架线段架空线路路径 西 40m	10.49	0.1666
220kV 熟练线/110kV 练洞线恢复架线段架空线路路径 西 45m	8.574	0.1473
220kV 熟练线/110kV 练洞线恢复架线段架空线路 路路径西 50m	3.560	0.1313
220kV 熟练线/110kV 练洞线恢复架线段架空线路 路路径西 55m	2.815	0.1222

注: 1.检测点位见附图 1.

2.测量点距地面 1.5m 处.

结论:

苏州 220kV 熟练线 34#-36#/110kV 练洞 1#-6#段迁改工程周围的工频电场强度范围为(2.815~163.6)V/m、工频磁感应强度范围为(0.1061~0.5691) μ T, 均满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中频率 50Hz 条件下公众曝露控制限值“工频电场强度<4000V/m、工频磁感应强度<100 μ T”的要求。

表 2 : 苏州 220kV 熟练线 34#-36#/110kV 练洞 1#-6#段迁改工程周围噪声检测结果

检测点 位序号	检测点位置	昼间噪声 (Leq(dB(A)))	夜间噪声 (Leq(dB(A)))
1	220kV 熟练线恢复架线段架空线路路径正下方	49	47
2	新建 220kV 熟练线架空线路路径正下方	51	47
3	龙巷里 166 号民房西	58	49
4	220kV 熟练线/110kV 练洞线恢复架线段架空线路 路径正下方	56	48

注: 1.检测点位见附图 1;

2.测量点距地面 1.2m 处;

结论:

苏州 220kV 熟练线 34#-36#/110kV 练洞 1#-6#段迁改工程周围的昼间噪声值为(49~58) dB(A), 夜间噪声值为(47~49) dB(A)。

编制:

审核:

签发:

江苏海尔森检测技术服务有限公司

2026 年 08 月 12 日




海尔森检测

231020341602

检测报告

报告编号: HES-R202608007

附图 1: 现场检测点位示意图

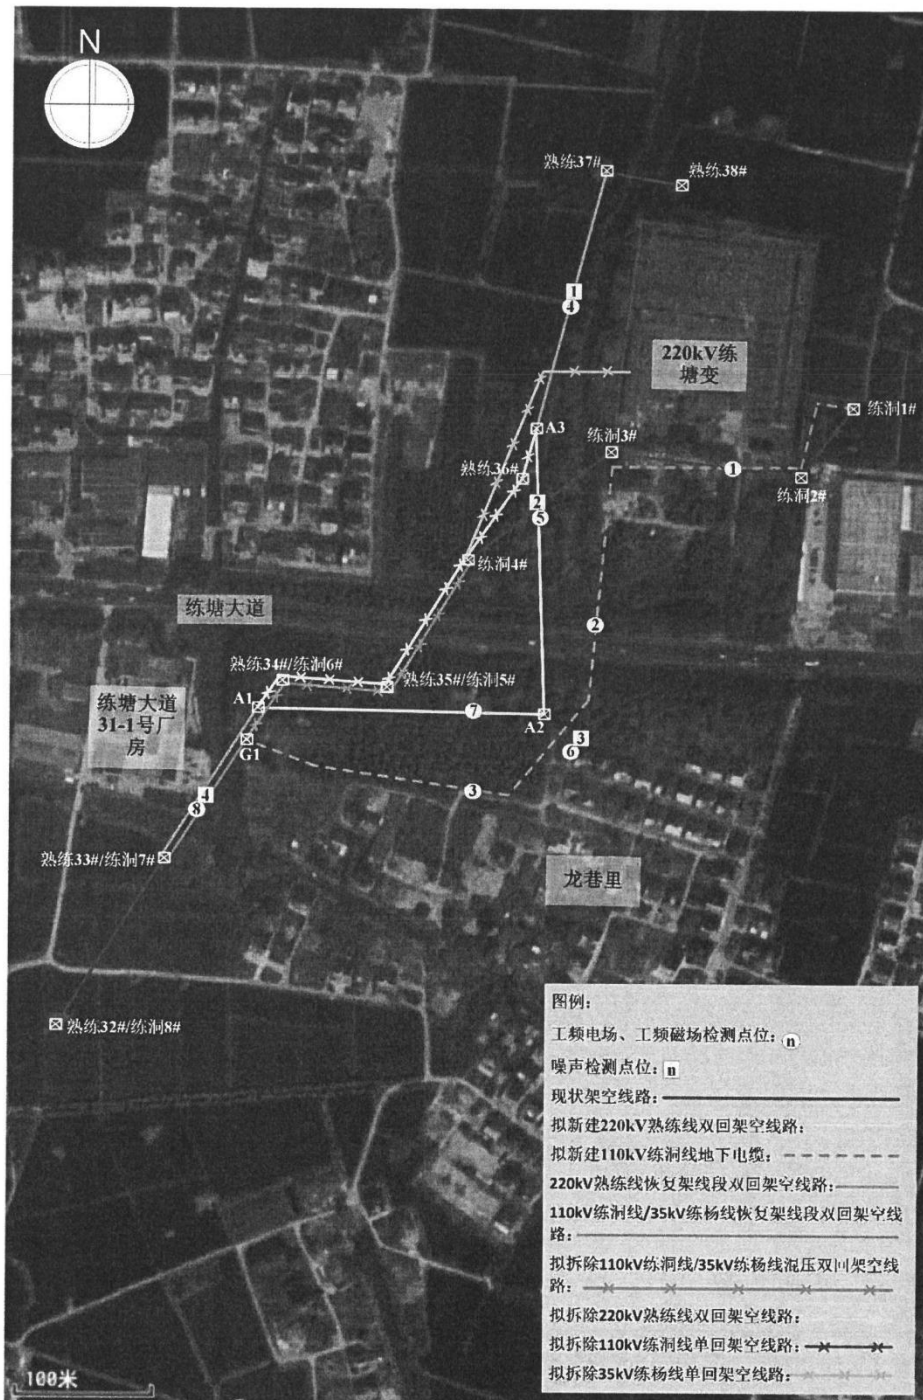



检验检测机构 资质认定证书

编号：231020341602

名称：江苏海尔森检测技术服务有限公司

地址：江苏省苏州市苏州工业园区华云路1号东坊产业园3栋
501-1室（215123）

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准。可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律責任由
江苏海尔森检测技术服务有限公司承担。

许可使用标志



231020341602

发证日期：2023年11月28日

有效期至：2029年11月27日

发证机关：



本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。

检验检测机构 资质认定证书附表



231020341602

检验检测机构名称：江苏海尔森检测技术服务有限公司

批准日期：2023年11月28日(复查换证（扩项、检测标准、方法变更）)

有效期至：2029年11月27日

批准部门：江苏省市场监督管理局



国家认证认可监督管理委员会制

二、批准江苏海尔森检测技术有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号: 231020341602

机构(省中心)名称: 江苏海尔森检测技术有限公司

第18页共 32页

场所地址: 江苏省-苏州市-苏州工业园区-华云路1号东坊产业园3栋501-1室

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		248	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017		
		249	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989		
		250	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012		
		251	硝酸盐氮	水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法(试行) HJ/T 346-2007		
		252	钙和镁总量(总硬度)	水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法 GB/T 7477-1987		
		253	氰化物(总氰化物和易释放氰化物)	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009	只用: 方法2 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法	
		254	溶解氧	水质 溶解氧的测定 电化学探头法 HJ 506-2009		
		255	五日生化需氧量(BOD ₅)	水质 五日生化需氧量(BOD ₅)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009		扩项;
		256	汞	水质 汞、砷、硒、锑和镉的测定 原子荧光法 HJ 694-2014		扩项;
		257	砷	水质 汞、砷、硒、锑和镉的测定 原子荧光法 HJ 694-2014		扩项;
		258	硒	水质 汞、砷、硒、锑和镉的测定 原子荧光法 HJ 694-2014		扩项;
		259	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018		扩项;
		260	动植物油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018		扩项;
25	噪声和振动	261	区域环境噪声	声环境质量标准 GB 3096-2008	不测: 35dB以下噪声	
		262	工业企业厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	不测: 35dB以下噪声	扩项;
26	电磁辐射	263	电磁辐射	辐射环境保护管理导则 电磁辐射监测仪器和方法 HJ/T 10.2-1996		
		264	工频电场	高压交流架空送电线路、变电站工频电场和磁场测量方法 DL/T 988-2005		
				交流输变电工程电磁环境监测方法(试行) HJ 681-2013		
		265	工频磁场	交流输变电工程电磁环境监测方法(试行) HJ 681-2013		
				高压交流架空送电线路、变电站工频电场和磁场测量方法 DL/T 988-2005		

苏州 220kV 尚福 2X95/2X96 线 25#~28#段迁改等 10 项 工程竣工环境保护验收意见

2026 年 9 月 3 日，中铁一局集团电务工程有限公司组织召开苏州 220kV 尚福 2X95/2X96 线 25#~28#段迁改等 10 项工程竣工环境保护验收会。会议由中铁一局集团电务工程有限公司（建设和调查单位）、常熟市苏明实业有限公司（设计单位）、苏州电力建设工程有限公司（施工单位）、江苏海尔森检测技术服务有限公司（监测单位）、南京国环科技股份有限公司（环评单位）及特邀专家 2 名（名单附后）组成验收工作组。验收工作组根据《中华人民共和国生态环境法典》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等有关法律法规及本批项目环境影响评价报告表和批复的要求对本批项目进行竣工环境保护验收。

会议听取了建设单位（调查单位）关于工程建设情况、环境保护实施情况和工程竣工环境保护验收调查情况的汇报，并审阅了相关资料。经认真讨论、审议，形成验收意见如下：

一. 工程建设基本情况

本批验收的输变电工程共有 10 项，分别为（1）苏州 220kV 尚福 2X95/2X96 线 25#~28#段迁改工程、（2）苏州 220kV 尚万 4X25/4X26 线 26#~27#段迁改工程、（3）苏州 220kV 熟练线 34#~36#段迁改工程、（4）苏州 110kV 练洞 1#~6#段迁改工程、（5）苏州 220kV 熟沙 4X35/4X36 线 6#~8#段迁改工程、（6）苏州 220kV 熟练 4X33/4X34 线 6#~9#段迁改工程、（7）苏州 220kV 熟剑 4X87/4X88 线 12#~16#段迁改工程、（8）苏州 220kV 练尚 2967/2968 线 4#~5#段迁改工程、（9）苏州 220kV 熟练线 22#~26#段迁改工程、（10）苏州 110kV 练洞线 17#~18#段迁改工程。

本批项目共新建 220kV 架空线路（折单）13.314km，新建 110kV 架空线路（折单）0.484km，新建 110kV 电缆线路（折单）1.036km；恢复 220kV 架空线路（折单）11.458km，恢复 110kV 架空线路（折单）0.837km；拆除 220kV 架空线路（折单）12.056km，拆除 110kV 架空线路（折单）1.21km。

本批项目总投资 9042.1175 万元，其中环保投资 242.12 万元。截止 2026 年

8 月，该批项目均已陆续进入调试期。各项验收工程基本情况详见附表 1。

二. 工程变动情况

本批验收工程均取得了苏州市生态环境局的环评批复（详见附表 2），对照《关于印发<输变电建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办辐射〔2016〕84 号），本批竣工环保验收的各项工程性质、地点、规模、已采取的环境保护措施等与环评阶段一致，无重大变动。

三. 环境保护措施落实情况

本批工程在环评及批复文件中提出了较为全面、详细的环境保护措施，各项环保措施在工程施工期 and 环境保护设施调试期已基本得到落实。

四. 工程建设对环境的影响

本批工程施工期均采取了有效的生态保护措施，对周围生态影响很小。施工噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）限值要求。施工期产生的废水均得到妥善处理，对周围水环境无影响。施工期间未收到扬尘污染投诉，施工场地扬尘排放满足《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022）要求，项目施工对周围大气环境影响较小。固体废物得到妥善处置，对环境无影响。

施工结束后，及时清理施工迹地，剥离的表土已回填，施工临时占地采取植被恢复工作或恢复原有使用功能，塔基四周及电缆线路周围植被恢复良好。工程电磁环境和声环境监测值均符合环评及批复要求。

五. 验收结论

苏州 220kV 尚福 2X95/2X96 线 25#~28#段迁改等 10 项工程在设计、施工和环境保护设施调试期均已落实了环评报告表及其批复文件中的要求，采取了有效地环境保护措施和生态保护措施。验收监测结果表明本项目周边电磁环境和声环境影响可以满足环评及批复文件的标准限值要求，其他环境要素也均符合环评及批复文件的要求，验收工作组同意本批项目通过竣工环保验收。

六. 后续要求

加强本批工程运行期巡查、环境管理，做好公众科普宣传工作。

七. 验收人员信息（见附表）

中铁一局集团电务工程有限公司

2026 年 9 月 3 日

附表 1 本批验收工程建设基本情况表

序号	工程名称	建设规模
1	苏州 220kV 尚福 2X95/2X96 线 25#~28#段迁改工程	新建铁塔 5 基（T1~T5），在新建铁塔上新建同塔双回架空线路路径长约 1.2km，导线垂直排列，相序不变，自上至下依次为 BCA（2X95 线）/ACB（2X96 线），导线型号为 2×JL3/G1A-630/45 型钢芯铝绞线，地线选用 2 根 72 芯 OPGW-150 复合光缆。尚福线 24#~T1，T5~尚福线 29#均利用现状导地线恢复架线，恢复架线段路径长约 0.64km，导线型号为 2×JL/G1A-400/35 型钢芯铝绞线。 拆除 220kV 尚福 2X95/2X96 线现有的双回架空线路（T1~T5）路径长约 0.95km，拆除原线路角钢塔 4 基（25#~28#）。
2	苏州 220kV 尚万 4X25/4X26 线 26#~27#段迁改工程	新建铁塔 4 基（G1~G4），在新建铁塔上新建同塔双回架空线路路径长约 0.68km，导线垂直排列，相序不变，自上至下依次为 BAC（4X25 线）/BCA（4X26 线），导线型号为 2×JL3/G1A-630/45 型钢芯铝绞线，地线选用 2 根 72 芯 OPGW-150 复合光缆。尚万线 23#~G1，G4~尚万线 28#均利用现状导地线恢复架线，恢复架线段路径长约 1.3km，导线型号为 2×JL/G1A-400/35 型钢芯铝绞线。 拆除 220kV 尚万 4X25/4X26 线现有的双回架空线路（G1~G4）路径长约 0.66km，拆除原线路角钢塔 2 基（26#、27#）。
3	苏州 220kV 熟练线 34#~36#段迁改工程	新建 220kV 熟练 4X33/4X34 线同塔双回架空线路路径长约 0.45km（A1~A3），熟练线恢复同塔双回架空线路路径长约 0.48km（熟练线 33#（同塔练洞线 7#）~A1，A3~熟练线 37#），新建 220kV 双回路角钢塔 3 基（A1~A3）。 拆除原混压四回架空线路路径长约 0.12km（A1~熟练线 35#（同塔练洞线 5#）），拆除 220kV 熟练线双回架空线路路径长约 0.22km（熟练线 35#（同塔练洞线 5#）~A3）；拆除 3 基角钢塔，其中混压四回路角钢塔 2 基（熟练线 34#（同塔练洞线 6#）、熟练线 35#（同塔练洞线 5#））、220kV 双回路角钢塔 1 基（熟练线 36#）。
4	苏州 110kV 练洞 1#~6#段迁改工程	新建 110kV 练洞 1741 线单回地下电缆路径长约 0.72km（G1~练洞线 1#），练洞线恢复 110kV/35kV 同塔混压双回架空线路路径长约 0.12km（熟练线 33#（同塔练洞线 7#）~G1），新建 110kV 双回路电缆终端塔 1 基（G1）。 拆除 110kV 练洞线单回架空线路路径长约 0.32km（练洞线 4#~练洞线 1#），拆除 110kV/35kV 同塔混压双回架空线路路径长约 0.12km（G1~A1，熟练线 35#（同塔练洞线 5#）~练洞线 4#）；拆除 3 基角钢塔，其中 110kV 双回路角钢塔 1 基（练洞线 4#）、110kV 单回路角钢塔 2 基（练洞线 2#和练洞线 3#）。拆除的同塔四回架空线路和杆塔部分计列于 220kV 熟练 4X33/4X34 线迁改工程中。
5	苏州 220kV 熟沙	新建铁塔 4 基（G1~G4），在新建铁塔上新建同塔双回架

序号	工程名称	建设规模
	4X35/4X36 线 6#~8#段迁改工程	空线路路径长约 0.955km，导线垂直排列，相序不变，自上至下依次为 BAC（4X35 线）/BCA（4X36 线），导线型号为 4×JL/G1A-300/25 型钢芯铝绞线，地线选用 2 根 72 芯 OPGW-150 复合光缆。熟沙线 5#~G1，G4~熟沙线 9#均利用现状导地线恢复架线，恢复架线段路径长约 0.503km，导线型号为 4×LGJ-300 型钢芯铝绞线。 拆除 220kV 熟沙 4X35/4X36 线现有的双回架空线路（G1~G4）路径长约 0.955km，拆除原线路角钢塔 3 基（6#~8#）
6	苏州 220kV 熟练 4X33/4X34 线 6#~9#段迁改工程	本项目新建铁塔 4 基（T1~T4），在新建铁塔上新建同塔双回架空线路路径长约 1.0km。熟练线 5#~T1，T4~熟练线 10#均利用现状导地线恢复架线，恢复架线段路径长约 0.61km。 拆除 220kV 熟练 4X33/4X34 线现有的双回架空线路路径长约 0.994km，拆除原线路角钢塔 4 基（6#~9#）。
7	苏州 220kV 熟剑 4X87/4X88 线 12#~16#段迁改工程	新建铁塔 6 基（T1~T6），在新建铁塔上新建同塔双回架空线路路径长约 0.84km。熟剑线 11#~T1，T5~熟剑线 17#均利用现状导地线恢复架线，恢复架线段路径长约 1.019km。 拆除 220kV 熟剑 4X87/4X88 线现有的双回架空线路路径长约 0.859km，拆除原线路角钢塔 5 基（12#~16#）。
8	苏州 220kV 练 尚 2967/2968 线 4#~5#段迁改工程	新建铁塔 4 基（T1~T4），在新建铁塔上新建同塔双回架空线路路径长约 0.8km，导线垂直排列，相序不变，自上至下依次为 CAB(2967 线)/ACB(2968 线)，导线型号为 2×JL3/G1A-630/45 型钢芯铝绞线，地线选用 2 根 72 芯 OPGW-150 复合光缆。练尚线 3#~T1，T4~练尚线 6#均利用现状导地线恢复架线，恢复架线段路径长约 0.46km，导线型号为 2×LGJ-300/25 型钢芯铝绞线。 拆除 220kV 练尚 2967/2968 线现有的双回架空线路(3#~6#)路径长约 0.62km，拆除原线路角钢塔 2 基（4#、5#）。
9	苏州 220kV 熟 练线 22#~26#段 迁改工程	新建 220kV 熟练 4X33/4X34 线同塔双回架空线路路径长约 0.732km（T1~T4），恢复 220kV 熟练 4X33/4X34 线（同塔 110kV 练洞 1741 线）混压四回架空线路路径长约 0.717km（熟练线 21#（同塔练洞线 19#）~T1，T4~熟练线 26#（同塔练洞线 14#）），新建 220kV 双回路角钢塔 2 基（T2、T3），新建混压四回角钢塔 2 基（T1、T4）。 拆除原混压四回架空线路路径长约 0.65km（熟练线 22#（同塔练洞线 18#）~熟练线 24#（同塔练洞线 16#）），拆除混压四回路角钢塔 3 基（熟练线 22#（同塔练洞线 18#）~熟练线 24#（同塔练洞线 16#））。
10	苏州 110kV 练洞 线 17#~18#段迁 改工程	新建 110kV 练洞 1741 线/35kV 练杨 342 线同塔混压双回架空线路路径长约 0.484km（T1~G2，G1~T4），新建 110kV 练洞 1741 线/35kV 练杨 342 线混压双回地下电缆路径长约 0.316km（G1~G2），新建 110kV 双回路电缆终端塔 2 基（G1、G2）。

附表 2 本批验收工程环评审批情况一览表

序号	工程名称	审批部门	文号	时间
1	苏州 220kV 尚福 2X95/2X96 线 25#~28#段迁改工程	苏州市生态 环境局	苏环辐评 (2025) 44 号	2026.1.5
2	苏州 220kV 尚万 4X25/4X26 线 26#~27#段迁改工程	苏州市生态 环境局	苏环辐评 (2025) 45 号	2026.1.5
3	苏州 220kV 熟练线 34#~36#段迁改 工程	苏州市生态 环境局	苏环辐评 (2025) 43 号	2026.1.5
4	苏州 110kV 练洞 1#~6#段迁改工程	苏州市生态 环境局	苏环辐评 (2025) 43 号	2026.1.5
5	苏州 220kV 熟沙 4X35/4X36 线 6#~8#段迁改工程	苏州市生态 环境局	苏环辐评 (2025) 42 号	2026.1.5
6	苏州 220kV 熟练 4X33/4X34 线 6#~9#段迁改工程	苏州市生态 环境局	苏环辐评 (2025) 47 号	2026.1.5
7	苏州 220kV 熟剑 4X87/4X88 线 12#~16#段迁改工程	苏州市生态 环境局	苏环辐评 (2025) 46 号	2026.1.5
8	苏州 220kV 练尚 2967/2968 线 4#~5#段迁改工程	苏州市生态 环境局	苏环辐评 (2025) 50 号	2026.6.18
9	苏州 220kV 熟练线 22#~26#段迁改 工程	苏州市生态 环境局	苏环辐评 (2025) 51 号	2026.6.18
10	苏州 110kV 练洞线 17#~18#段迁改 工程	苏州市生态 环境局	苏环辐评 (2025) 51 号	2026.6.18

《苏州220kV尚福2X95/2X96线25#~28#段迁改等10项工程》

竣工环境保护验收会签到表

参会人员:

姓名	单位	联系方式	职称/职务	身份证号码
李华	中铁一局电务公司		工程师	
王皓	常熟市苏明实业有限公司		工程师	
杨敏	苏州观通公司		项目经理	
常展强	江苏海尔森检测技术服务有限		工程师	
王林川	江苏尚福升防打杆会		所长	
李永宁	南京国环		经理	
江和	江苏恒松学会		高工	
王俊杰	江苏海尔森检测技术服务有限		工程师	

中铁一局集团电务工程有限公司

2026年 9 月 3 日
