常熟市梅李镇人民政府 220kV 常谢 4521/常同 4522 线 55#-60#段迁改工程竣工环境保护验收调查表

建设单位：常熟市梅李镇人民政府

调查单位：常熟市梅李镇人民政府

编制日期：2026 年 10 月

建设单位法人代表（授权代表）：　　（签名）

调查单位法人代表：　　（签名）

建设单位：常熟市梅李镇人民政府

电话：152****8604

传真：/

邮编：215000

地址：常熟市梅李镇人民路 18 号

调查单位：常熟市梅李镇人民政府

电话：152****8604

传真：/

邮编：215000

地址：常熟市梅李镇人民路 18 号

监测单位：江苏海尔森检测技术服务有限公司

目　录

一、建设项目总体情况 1
二、调查范围、环境监测因子、敏感目标、调查重点 3
三、验收执行标准 6
四、建设项目概况 7
五、环境影响评价回顾 10
六、环境保护设施、环境保护措施落实情况（附照片） 16
七、电磁环境、声环境监测（附监测点位图） 20
八、环境影响调查 26
九、环境管理与监测计划 29
十、竣工环保验收调查结论与建议 31

附图：

附图 1　本项目地理位置示意图
附图 2　监测点位示意图及线路路径图
附图 3　本项目与江苏省生态空间保护区域相对位置关系示意图

附件：

附件 1　本项目环评批复
附件 2　验收监测报告及监测单位资质证书

附表：

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

一、建设项目总体情况

建设项目名称	常熟市梅李镇人民政府 220kV 常谢 4521/常同 4522 线 55#-60#段迁改工程				
建设单位	常熟市梅李镇人民政府				
法人代表/授权代表	褚宏伟		联系人	李苏苏	
通讯地址	常熟市梅李镇人民路 18 号				
联系电话	152****8604	传真	/	邮政编码	215000
建设地点	江苏省苏州市常熟市梅李镇、海虞镇				
项目建设性质	改建		行业类别	D4420 电力供应	
环境影响报告表名称	常熟市梅李镇人民政府 220kV 常谢 4521/常同 4522 线 55#-60#段迁改工程环境影响报告表				
环境影响评价单位	苏州普瑞菲环保科技有限公司				
初步设计单位	常熟市苏明实业有限公司				
环境影响评价审批部门	苏州市生态环境局	文号	苏环辐评〔2026〕12 号	时间	2026.1.30
建设项目核准部门	/	文号	/	时间	/
初步设计审批部门	国网江苏省电力有限公司	文号	苏电函〔2025〕183 号	时间	2025.12.12
环境保护设施设计单位	常熟市苏明实业有限公司				
环境保护设施施工单位	常熟市苏明实业有限公司				
环境保护设施监测单位	江苏海尔森检测技术服务有限公司				
投资总概算（万元）	1926	环境保护投资（万元）	44	环境保护投资占总投资比例	2.3%
实际总投资（万元）	2196.9101	环境保护投资（万元）	50.5	环境保护投资占总投资比例	2.3%

环评阶段项目建设内容	本项目新建双回路角钢塔 11 基（T1~T11），在新建铁塔上新建同塔双回架空线路路径长约 1.93km，导线型号为 2×JL3/G1A-630/45 型钢芯铝绞线，地线选用 2 根 72 芯 OPGW-150 复合光缆。常谢/常同线 54#~T1，T11~常谢/常同线 61#均利用现状导地线恢复架线，恢复架线段路径长约 0.439km，导线型号为 2×LGJQ-300 型钢芯铝绞线。 本项目拆除 220kV 常谢 4521/常同 4522 线现有的双回架空线路路径长约 1.5km，拆除原线路角钢塔 6 基（55#~60#）。	项目开工日期	2026.2
项目实际建设内容	本项目新建双回路角钢塔 11 基（T1~T11），在新建铁塔上新建同塔双回架空线路路径长约 1.93km，导线型号为 2×JL3/G1A-630/45 型钢芯铝绞线，地线选用 2 根 72 芯 OPGW-150 复合光缆。常谢/常同线 54#~T1，T11~常谢/常同线 61#均利用现状导地线恢复架线，恢复架线段路径长约 0.439km，导线型号为 2×LGJQ-300 型钢芯铝绞线。 本项目拆除 220kV 常谢 4521/常同 4522 线现有的双回架空线路路径长约 1.5km，拆除原线路角钢塔 6 基（55#~60#）。	环境保护设施投入调试日期	2026.5
项目建设过程简述	2025 年 12 月 12 日，取得了国网江苏省电力有限公司出具的初步设计的意见，文号为：苏电函〔2025〕183 号。 2026 年 1 月 30 日，取得了苏州市生态环境局出具的环境影响报告表的批复，文号为：苏环辐评〔2026〕12 号。 2026 年 2 月项目开工建设，并于 2026 年 5 月建成并投入调试运行，项目环境保护措施及设施与主体工程同时设计、施工、投入使用。 按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4 号）等相关规定、技术标准和环评文件的要求，常熟市梅李镇人民政府于 2026 年 7 月启动了该项目的竣工环境保护验收工作，并委托江苏海尔森检测技术服务有限公司于 2026 年 7 月 27 日对该项目开展了现场验收检测工作。		

二、调查范围、环境监测因子、敏感目标、调查重点

调查范围

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）、《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）、《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）及《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》（HJ705-2020），确定调查（监测）范围（验收调查范围原则上与环境影响评价文件确定的评价范围一致），验收调查范围见表 2-1。

表 2-1 本项目验收调查范围一览表

调查对象	调查内容	调查（监测）范围
220kV 常谢 4521/常同 4522 线 55#-60#段架空线路	工频电场、工频磁场	架空输电线路边导线投影外两侧各 40m
	噪声	边导线地面投影外两侧各 40m 范围内的区域
	生态	线路边导线地面投影外两侧各 300m 内的带状区域

环境监测因子

根据环评文件和《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》（HJ705-2020），确定环境监测因子，具体如下：

（1）电磁环境：监测因子为工频电场、工频磁场，监测指标为工频电场强度、工频磁感应强度。

（2）声环境：监测因子为噪声，监测指标为昼间、夜间等效声级。

环境敏感目标

1、生态保护目标

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），生态保护目标为受影响的重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等。

本项目调查范围不涉及国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地、世界自然遗产、生态保护红线区域；重要物种的天然集中分布区、栖息地，重要水生生物的产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，迁徙鸟类的重要繁殖地、停歇地、越冬地以及野生动物迁徙通道等《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中的生态敏感区。

本项目调查范围不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区、以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域等《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》第三条（一）、

（三）中的环境敏感区。

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号）、《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）和《江苏省自然资源厅关于苏州市生态空间管控区域评估优化成果的复函》（苏自然资函〔2026〕487号），本项目调查范围不涉及江苏省国家级生态保护红线、江苏省生态空间管控区域。

综上所述，本项目生态环境影响调查范围内不涉及受影响的重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中的生态保护目标。

2、电磁环境敏感目标

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），电磁环境敏感目标包括住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑物。

经现场踏勘，沿线共有电磁敏感点4处，电磁环境敏感目标情况见表2-2。

表2-2 本项目附近的电磁环境敏感目标情况

序号	敏感目标名称	敏感目标建筑功能	敏感目标所在区域	位置[1]（调查范围内）	房屋高度	房屋类型及规模	导线最低对地高度	环境质量要求[2]
1	龙腾特钢集团21号门卫室	安保管控功能	常熟市梅李镇	架空线路南侧20m	3m	1间1层平顶	48.44m	E、B
2	戴家宅基（46）39号厂房	工业生产功能		架空线路西南侧35m	3m~7m	3间1层坡顶 1间1层平顶 1幢2层坡顶	40.73m	E、B
3	曹陈巷村1号民房	居住功能	常熟市海虞镇	架空线路南侧4m	4m~7m	3间1层坡顶 1幢2层坡顶	22.92m	E、B
4	曹陈巷村2号民房	居住功能		架空线路北侧17m（最近处）	4m~10m	2间1层坡顶 1幢3层坡顶	24.76m	E、B

注1：声环境保护目标与线路的距离均为距线路边导线地面投影的距离。

注2：环境质量要求中，E表示工频电场<4000V/m，B表示工频磁场<100μT。

3、声环境保护感目标

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），声环境保护目标为依据法律、法规、标准政策等确定的需要保持安静的建筑物及建筑物集中区。

经现场踏勘，本项目调查范围内有2处声环境保护目标，具体见表2-3。

表 2-3　本项目声环境保护目标情况

序号	敏感目标名称	位置[1]（调查范围内）	房屋高度	房屋类型及规模	导线最低对地高度	环境质量要求[2]
1	曹陈巷村 1 号民房	架空线路南侧 4m	4m~7m	3 间 1 层坡顶 1 幢 2 层坡顶	22.92m	N2
2	曹陈巷村 2 号民房	架空线路北侧 17m（最近处）	4m~10m	2 间 1 层坡顶 1 幢 3 层坡顶	24.76m	N2

注 1：环境敏感目标与线路的距离均为距线路边导线地面投影的距离。

注 2：N2 表示《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类环境噪声限值。

调查重点

（1）项目设计及环境影响评价文件中提出的造成环境影响的主要建设内容；

（2）核查实际建设内容、方案设计变更情况和造成的环境影响变化情况；

（3）环境敏感目标基本情况及变动情况；

（4）环境影响评价文件制度及其他环境保护规章制度执行情况；

（5）环境保护设计文件、环境影响评价文件及其审批文件中提出的环境保护设施和环境保护措施落实情况及其效果、环境风险防范与应急措施落实情况；

（6）环境质量和环境监测因子达标情况；

（7）建设项目环境保护投资落实情况。

三、验收执行标准

电磁环境标准

工频电场、工频磁场执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表 1 中频率为 50Hz 所对应的公众曝露限值，即工频电场限值：4000V/m；工频磁场限值：100μT。

架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率 50Hz 的电场强度控制限值为 10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。

声环境标准

根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》（HJ705-2020），本次声环境验收环境质量评价执行现行有效的声环境质量标准，详见表 3-1。

表 3-1　本项目声环境标准一览表

类别	环评阶段执行标准	验收阶段执行标准	标准限值
声环境质量标准	架空线路 《声环境质量标准》 （GB3096-2008） 2 类、4a 类、4b 类	架空线路 《声环境质量标准》 （GB3096-2008） 2 类、4a 类、4b 类	2 类 昼间：60dB（A） 夜间：50dB（A） 4a 类 昼间：70dB（A） 夜间：55dB（A） 4b 类 昼间：70dB（A） 夜间：60dB（A）

其他标准和要求

环境质量评价执行现行有效的环境质量标准，污染物排放标准执行环境影响报告表及其审批部门批复决定中规定的标准，在环境影响报告表审批之后发布或修订的标准对建设项目执行该标准有明确时限要求的，按新发布或修订的标准执行。

本项目验收执行标准不涉及新发布或修订标准的情况。

四、建设项目概况

项目建设地点

本项目迁改线路位于江苏省苏州市常熟市梅李镇、海虞镇，线路总体由西向东架设。

本项目地理位置示意图见附图 1。

主要建设内容及规模

本项目实际建设内容及规模详见下表。

表 4-1　建设内容及规模一览表

项目名称	常熟市梅李镇人民政府 220kV 常谢 4521/常同 4522 线 55#-60#段迁改工程
建设单位	常熟市梅李镇人民政府
建设性质	新建（迁建）、改建
建设规模	本项目新建双回路角钢塔 11 基（T1~T11），在新建铁塔上新建同塔双回架空线路路径长约 1.93km，导线型号为 2×JL3/G1A-630/45 型钢芯铝绞线，地线选用 2 根 72 芯 OPGW-150 复合光缆。常谢/常同线 54#~T1，T11~常谢/常同线 61#均利用现状导地线恢复架线，恢复架线段路径长约 0.439km，导线型号为 2×LGJQ-300 型钢芯铝绞线。 本项目拆除 220kV 常谢 4521/常同 4522 线现有的双回架空线路路径长约 1.5km，拆除原线路角钢塔 6 基（55#~60#）。

建设项目占地及总平面布置

（1）建设项目占地

本项目用地面积为 20640m²，其中新增永久用地 88m²，拆除塔基恢复永久用地为 48m²，临时用地 20600m²，临时占地已恢复。

（2）线路路径

本工程线路自现状 220kV 常谢 4521/常同 4522 线 55#小号侧新建 T1 耐张塔，右转折向北至 G346 国道东侧，然后左转向西跨越 G346 国道至龙腾特钢大门楼北侧，右转折向西北跨越海洋泾后沿海洋泾北侧走线，至何村路东侧右转，向北至常谢/常同线 60#大号侧新建 T11 耐张塔，与原常谢/常同线 61#塔接通。220kV 常同 4522 线 T5~T6 档线路临时电缆入地，采用电缆沟敷设，待 T5-T6 档上方的现状 220kV 常谢 4521/常同 4522 线及 57#塔拆除完成后，拆除临时电缆通道，恢复原架空接线方式，临时电缆通道已拆除。

本项目线路路径情况及周围环境示意图见附图 2。

建设项目环境保护投资

本项目设计投资总概算 1926 万元，其中环保投资为 44 万元，环保投资比例 2.3%；实际投资总概算 2196.9101 万元，其中环保投资为 50.5 万元，环保投资比例 2.3%。本项目环境保护投资详见表 4-2。

表 4-2 建设项目环境保护投资一览表

工程实施时段	环境要素	环境保护设施、措施	环保投资（万元）	实际环保投资（万元）
施工阶段	生态环境	控制施工用地，减少弃土，表土保护，生态恢复	10	10
	大气环境	施工围挡、遮盖、定期洒水	4	4
	水环境	临时沉淀池	3	3
	声环境	低噪声施工设备	6	6
	固体废弃物	生活垃圾、建筑垃圾清运	3	3
运行阶段	电磁环境	合理选择导线类型、设置警示和防护指示标志	2	3
	声环境	选用加工工艺水平高、表面光滑的导线	2	3
	生态环境	植被绿化	5	6
环境管理		环境影响评价	5	6
		建设项目监测（验收检测及可能的投诉监测）	2	3
		竣工环保验收	2	3.5
合计		/	44	50.5

建设项目变动情况及变动原因

（1）建设项目规模重大变动情况对照分析

对照《关于印发<输变电建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办辐射〔2016〕84 号），本工程验收阶段与环办辐射〔2016〕84 号文的对比情况见表 4-3。

表 4-3 本工程验收阶段与环办辐射〔2016〕84 号文重大变动清单对比情况一览表

序号	环办辐射〔2016〕84 号	环评阶段情况	验收阶段情况	是否为重大变动
1	电压等级升高。	220kV	220kV	否
2	主变压器、换流变压器、高压电抗器等主要设备总数量增加超过原数量的 30%。	不涉及	不涉及	否
3	输电线路路径长度增加超过原路径长度的 30%。	1.93km	1.93km	否
4	变电站、换流站、开关站、串补站站址位移超过 500 米。	不涉及	不涉及	否
5	输电线路横向位移超出 500 米的累计长度超过原路径长度的 30%。	不涉及	不涉及	否
6	因输变电工程路径、站址等发生变化，导致进入新的自	不涉及	不涉及	否

	然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等生态敏感区。			
7	因输变电工程路径、站址等发生变化，导致新增的电磁和声环境敏感目标超过原数量的30%。	不涉及	不涉及	否
8	变电站由户内布置变为户外布置。	不涉及	不涉及	否
9	输电线路由地下电缆改为架空线路。	不涉及	不涉及	否
10	输电线路同塔多回架设改为多条线路架设累计长度超过原路径长度的30%。	不涉及	不涉及	否

（2）环境保护设施、环境保护措施变动情况及变动原因

本项目验收阶段环境保护设施、环境保护措施与环评阶段一致，未发生变动。

（3）周围环境敏感目标的变动情况及变动原因

本项目验收阶段环境敏感目标与环评阶段一致，未发生变动。

综上，对照《关于印发<输变电建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办辐射〔2016〕84号），本项目未发生重大变动。

五、环境影响评价回顾

环境影响评价的主要环境影响预测及结论（生态、电磁、声、水、固体废物等）

《常熟市梅李镇人民政府220kV常谢4521/常同4522线55#-60#段迁改工程环境影响报告表》的主要环境影响预测及结论如下：

1、施工期环境影响预测

（1）生态环境

①土地占用

本项目用地包括永久用地和临时用地，永久用地为输电线路塔基永久用地，这部分土地一经征用，其原有的使用功能将会永久改变；临时用地包括塔基施工场地、跨越施工场地、拆除施工场地、临时电缆通道施工场地等，其环境影响主要集中于施工期改变土地的使用功能，破坏地表土壤结构及植被，但所占用的土地在工程施工结束后，在采取适当措施（植被恢复或复耕）后可以恢复其原有功能。

本项目用地面积为20640m²,其中新增永久用地88m²,拆除塔基恢复永久用地为48m²,临时用地20600m²。本项目用地面积情况详见表5-1。

表5-1　本项目占地类型及数量一览表

分类	永久用地（m²）	临时用地（m²）	用地类型
跨越施工区	/	900	耕地、林地
新建塔基区	88	10400	耕地、林地
牵张场	/	3000	耕地、林地
跨越场	/	300	耕地、林地
拆除塔基区	-48	6000	耕地
合计	40	20600	/

②对植物的影响

本项目所在地区主要为人工生态系统，生态调查范围内主要为常见的农田栽培植被，经生态现状调查和相关资料查询，本项目生态调查范围内未见有国家重点保护野生植物及珍稀濒危植物出现。

本项目新建线路施工、拆除线路施工和临时电缆通道施工建设时土地开挖等会破坏施工范围内的地表植被。开挖作业时采取分层开挖、分层堆放、分层回填的方式，尽量把原有表土回填到开挖区表层，以利于植被恢复。拆除塔基施工采用分段拆除法，拆除塔基区

塔基开挖深度约 1m，对拆除杆塔的塔基混凝土基础进行清除，开挖土方就地回填，减少对周围植物的影响。临时电缆线路敷设方式为简易电缆沟敷设，简易电缆沟开挖深度为 0.6m，临时电缆线路拆除后简易电缆沟进行回填，项目建成后，对架空线路塔基处及临时施工用地及时进行绿化处理和生态恢复，景观上做到与周围环境相协调。本项目永久占地面积较小，项目建设对区域植物群落及植被覆盖度基本无影响。

采取上述措施后，本项目建设对周围生态影响很小。

③对动物的影响

本项目生态调查范围内无珍稀濒危野生动物生境，经沿线生态现状调查和相关资料查询，生态调查范围内未见有国家重点保护和珍稀濒危野生动物出现，主要动物种类为鸟类、蛇、鼠等常见野生动物。

本项目对调查范围内野生动物影响主要表现为施工开挖及施工人员活动对动物栖息、觅食活动的干扰。本项目输电线路施工范围点状分布，施工为间断性的，不会对野生动物生存空间造成威胁，线路建成后，塔基占地小不连续，且架空线路下方仍有较大空间，野生动物仍可正常活动、栖息等，不会对其生存活动造成影响。

④水土流失

本项目在施工时土方开挖、回填以及临时堆土等导致地表裸露和土层结构破坏，施工时设置围挡，合理安排施工工期，避开雨季土建施工；本项目新建架空线路、拆除架空线路以及临时电缆通道施工过程中，开挖土石方绝大部分就地回填塔基坑，应尽量做到土石方平衡，对于不能平衡的土石方则应外运存放至建设单位指定的弃土场内。施工结束后，对临时占地采取工程措施恢复水土保持功能等措施，最大程度的减少水土流失。

（2）声环境

施工阶段各施工机械设备的噪声均较高，在距挖掘机、电锯、静力压桩机、混凝土振捣器、吊车分别大于 57m、100m、15m、50m、57m 时，昼间施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》70dB（A）的限值要求。本项目为线路改建工程，无夜间施工。

本项目输电线路沿线距施工场地最近的声环境保护目标为曹陈巷村 1 号民房，距施工场地的距离约为 22.92m，建议施工单位在高噪声设备周围设置掩蔽物进行隔声；尽量错开施工机械施工时间，闲置不用的设备应立即关闭，避免机械同时施工产生叠加影响；设置围挡，削弱噪声传播，围挡应采用彩钢板等硬质材料，围挡高度≥2.5m，且须连续封闭设置；运输车辆进出施工现场应控制车速、禁止鸣笛，减少交通噪声。通过采取以上噪声

污染防治措施，以确保本项目声环境保护目标处和线路路径沿线施工噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的限值要求。此外，本工程施工量小、施工时间短，对环境的影响是小范围的、短暂的，随着施工期的结束，其对环境的影响也将随之消失，对周围声环境影响较小。

（3）大气环境

施工期对大气的环境影响主要来自土建施工的开挖作业、建筑材料的运输装卸、施工现场内车辆行驶时产生的扬尘等。

施工过程中，车辆运输散体材料和废弃物时，必须密闭，避免沿途漏撒；加强材料转运与使用的管理，合理装卸，规范操作；对进出施工场地的车辆限制车速，减少或避免产生扬尘；施工现场设置围挡，施工临时中转土方以及弃土弃渣等要合理堆放，可定期洒水进行扬尘控制；施工结束后，按“工完料尽场地清”的原则立即进行空地硬化和覆盖，减少裸露地面面积。

通过采取上述环保措施，本工程施工扬尘对周围环境影响较小。

（4）地表水环境

本工程施工过程中产生的废水主要为少量施工废水和施工人员的生活污水。

本项目施工时间短、施工范围小，施工期合理安排施工计划，线路施工产生的废水主要为少量泥浆水，经临时沉淀池去除悬浮物后回用，不外排。生活污水依托附近现有的卫生设施纳入当地污水处理系统。通过采取上述环保措施，施工过程中产生的废水不会影响周围水环境。

（5）固体废物

施工期固体废物主要为建筑垃圾和生活垃圾以及拆除线路产生的塔基、塔体、导线、金具等。施工产生的建筑垃圾若不妥善处置会产生水土流失等环境影响，产生的生活垃圾若不妥善处置则污染环境且破坏景观，拆除的线路若不妥善处置会造成资源浪费。

施工过程中的建筑垃圾分别收集堆放，弃土弃渣尽量做到土石方平衡，对于不能平衡的土石方则应外运存放至建设单位指定的弃土场内；生活垃圾分类收集，要及时清运处理；拆除线路产生的塔体、导线、金具等由建设单位回收。

通过采取上述环保措施，施工固废对周围环境影响很小。

2、运行期环境影响预测

（1）电磁环境

本项目电磁环境影响采用理论计算的方法进行评价。理论计算的结果表明，本项目线路迁改工程在认真落实各项电磁环境保护措施的基础上，电磁环境影响较小，能够满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表 1 中工频电场强度 4000V/m、工频磁感应强度 100μT 公众曝露控制限值要求，线路经过耕地、园地、养殖水面、道路等场所满足工频电场强度 10kV/m、工频磁感应强度 100μT 公众曝露控制限值要求。

（2）声环境

通过类比监测结果分析可知，类比线路塔间弧垂最低位置的横截面方向上自线路中心至边导线垂直投影外 50m 范围内噪声测值基本处于同一水平值上，噪声水平随距离的增加而减小的趋势不明显，与噪声背景值相当，说明主要受背景噪声影响。本次类比监测采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的监测方法，所测线路断面处环境噪声包含周围的环境背景噪声和类比架空线路噪声贡献值，理论上类比架空线路噪声贡献值低于本次类比监测结果，因此，本项目线路投运后对周围声环境及声环境保护目标贡献较小。

另外，本项目架空线路通过使用加工工艺先进、导线表面光滑的导线减少电晕放电、提高导线对地高度等措施，以降低可听噪声，对周围声环境及声环境保护目标的影响可进一步减小，能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求。

（3）生态环境

运行期做好线路等相关设施的维护，加强巡查和检查，强化设备检修维护人员的生态环境保护意识教育，并严格管理，减少对项目周边的环境的影响。

3、评价结论

常熟市梅李镇人民政府 220kV 常谢 4521/常同 4522 线 55#-60#段迁改工程符合国家的法律法规，符合区域总体发展规划，在认真落实各项污染防治措施后，工频电场、工频磁场及噪声等能够满足相应标准限值要求，对周围环境影响较小，本项目的建设对区域生态环境的影响控制在可接受的范围。从环境影响角度分析，本项目的建设是可行的。

环境影响评价文件批复意见

《常熟市梅李镇人民政府 220kV 常谢 4521/常同 4522 线 55#-60#段迁改工程环境影响报告表》于 2026 年 1 月 30 日取得苏州市生态环境局的批复，文号为“苏环辐评〔2026〕12 号”（详见附件 1），批复内容如下：

常熟市梅李镇人民政府：

你单位委托苏州普瑞菲环保科技有限公司编制的《常熟市梅李镇人民政府 220kV 常谢

4521/常同 4522 线 55#-60#段迁改工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、常熟市梅李镇人民政府 220kV 常谢 4521/常同 4522 线 55#-60#段迁改工程位于常熟市境内。工程内容为（详见《报告表》）：新建双回路角钢塔 11 基，新建同塔双回架空线路路径长约 1.93km，利用现状导线恢复架线段路径长约 0.439km，拆除双回架空线路路径长约 1.5km，拆除原线路角钢塔 6 基。

根据《报告表》评价结论，在落实《报告表》中提出的各项污染防治、生态保护措施的前提下，能满足环境保护的相关要求，项目建设具备环境可行性，从环境保护角度考虑，我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。

二、在工程设计、建设和运行管理中，你单位要认真落实《报告表》提出的各项环保措施，确保污染物达标排放。并做好以下工作：

（一）严格执行环保要求和相关设计标准、规程，优化设计方案，工程建设应符合项目所涉区域的总体规划。

（二）加强施工期的环境保护工作，尽可能减少施工过程中对土地的占用和植被的破坏，采取必要的水土保持措施，不得发生噪声和扬尘等扰民现象。施工期噪声执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2025）的要求。施工结束后及时做好植被、临时用地的恢复工作。

（三）严格落实控制工频电场、工频磁场的各项环境保护措施，确保工程周围区域工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。采取必要的消声降噪措施，确保该工程周围区域噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应功能区要求，防止噪声扰民。

（四）建设单位须做好与输变电工程相关科普知识的宣传工作，会同当地政府及有关部门对居民进行必要的解释、说明，取得公众对输变电工程建设的理解和支持，避免产生纠纷。

三、项目建设必须严格执行配套的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序开展竣工环境保护验收。验收合格后，项目方可正式投入运行。

四、苏州市常熟生态环境局组织实施该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作，苏州市生态环境综合行政执法局负责不定期抽查。你公司应在收到本批复后 20 个工

作日内，将批准后的《报告表》送苏州市常熟生态环境局，并按规定接受生态环境部门的日常监督检查。

五、建设单位是建设项目环境信息公开的主体，你单位应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发〔2015〕162 号）做好建设项目开工前、施工期和建成后的信息公开工作。

六、本批复自下达之日起五年内建设有效。项目的性质、规模、地点、拟采取的环境保护措施发生重大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。

苏州市生态环境局

2026 年 1 月 30 日

六、环境保护设施、环境保护措施落实情况（附照片）

阶段	影响类别	环境影响报告表及批复文件中要求的环境保护设施、环境保护措施	环境保护设施、环境保护措施落实情况，相关要求未落实的原因
施工期	生态影响	**环评报告表：** （1）加强对管理人员和施工人员的环保教育，提高其生态环保意识； （2）严格控制施工临时用地范围不新建施工道路，利用现有道路运输设备、材料； （3）开挖作业时采取分层开挖、分层堆放、分层回填的方式，做好表土剥离、分类存放； （4）合理安排施工工期，不在连续雨天土建施工； （5）对临时堆放区域加盖苫布； （6）拆除塔基混凝土基础深度至 1m；施工结束后，及时清理施工现场，对施工临时用地及拆除杆塔塔基处进行绿化处理，恢复临时占用土地原有使用功能； （7）施工照片或施工记录资料满足环境保护要求。 **环评批复：** 加强施工期的环境保护工作，尽可能减少施工过程中对土地的占用和植被的破坏，采取必要的水土保持措施。施工结束后及时做好植被、临时用地的恢复工作。	**已落实：** （1）加强了对管理人员和施工人员的环保教育，提高了其生态环保意识； （2）严格控制了施工临时用地范围不新建施工道路，利用现有道路运输设备、材料； （3）开挖作业时采取了分层开挖、分层堆放、分层回填的方式，做好表土剥离、分类存放； （4）合理安排了施工工期，未在连续雨天土建施工； （5）对临时堆放区域加盖苫布； （6）拆除塔基混凝土基础深度至 1m；施工结束后，及时清理了施工现场，对施工临时用地及拆除杆塔塔基处进行了绿化处理，恢复了临时占用土地原有使用功能； （7）施工照片、记录资料满足环境保护要求； （8）已加强施工期的环境保护工作，尽可能减少施工过程中对土地的占用和植被的破坏，采取了必要的水土保持措施。施工结束后已及时做好植被、临时用地的恢复工作。
	污染影响	**地表水：** **环评报告表：** （1）不影响周围水环境； （2）施工照片或施工记录资料满足环境保护要求。	**已落实：** （1）施工期未影响周围水环境； （2）施工照片、记录资料满足环境保护要求。
		声环境： **环评报告表：** （1）采用低噪声施工机械设备，设置围挡； （2）加强施工管理，文明施工，错开高噪声设备使用时间；	**已落实：** （1）已采用低噪声施工机械设备，设置围挡； （2）加强了施工管理，文明施工，错开了高噪声设备使用时间； （3）夜间不施工，施工场界满足《建筑施工噪声排放标准》（GB

		（3）夜间不施工，施工场界满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准限值要求； （4）施工合同中明确施工单位的噪声污染防治责任，施工单位制定了污染防治实施方案； （5）施工照片或施工记录资料满足环境保护要求。 **环评批复：** 不得发生噪声等扰民现象。施工期噪声执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）的要求。	12523-2025）标准限值要求； （4）施工合同中明确了施工单位的噪声污染防治责任，施工单位制定了污染防治实施方案； （5）施工照片、记录资料满足环境保护要求； （6）施工期未发生噪声等扰民现象。施工期噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的要求。
		大气环境： **环评报告表：** （1）在施工场地设置围挡，对作业处裸露地面覆盖防尘网并定期洒水。遇到四级或四级以上大风天气，停止土方作业； （2）选用商品混凝土，加强管理，合理装卸，规范操作，在易起尘的材料堆场，采取密闭存储或采用防尘布苫盖，减少扬尘对环境空气质量的影响； （3）运输车辆按照规划路线和时间进行物料、渣土等的运输，采取遮盖、密闭措施，减少沿途遗洒，不超载，经过村庄等敏感目标时控制车速； （4）施工照片或施工记录资料满足环境保护要求。 **环评批复：** 不得发生扬尘等扰民现象。	**已落实：** （1）在施工场地设置了围挡，对作业处裸露地面覆盖了防尘网并定期洒水。四级或四级以上大风天气已停止土方作业； （2）选用商品混凝土，加强管理，合理装卸，规范操作，在易起尘的材料堆场，采用了防尘布苫盖，减少了扬尘对环境空气质量的影响； （3）运输车辆按照规划路线和时间进行物料、渣土等的运输，采取了遮盖、密闭措施，减少了沿途遗洒，不超载，经过村庄等敏感目标时控制车速； （4）施工照片、记录资料满足环境保护要求； （5）施工期未发生扬尘等扰民现象。
		固体废物： **环评报告表：** （1）建筑垃圾、生活垃圾分类堆放收集；建筑垃圾和不能平衡的土石方外运存放至通苏嘉甬铁路建设工程的弃土场内；生活垃圾委托环卫部门及时清运，不得发生随意堆放、乱抛乱弃污染环境的情形； （2）拆除的废旧导线及杆塔等由建设单位统一回收处理，不得发生随意堆放、乱抛乱弃污染环境的情形； （3）施工照片或施工记录资料满足环境保护要求。	**已落实：** （1）建筑垃圾、生活垃圾分类堆放收集；建筑垃圾和不能平衡的土石方外运存放至通苏嘉甬铁路建设工程的弃土场内；生活垃圾委托环卫部门及时清运，没有发生随意堆放、乱抛乱弃污染环境的情形； （2）拆除的废旧导线及杆塔等由建设单位统一回收处理，没有发生随意堆放、乱抛乱弃污染环境的情形； （3）施工照片、记录资料满足环境保护要求。
运	生态	**环评报告表：**	**已落实：**

行期	影响	制定定期巡检计划，对设备检修维护人员进行环保培训，加强管理，避免对项目周边的自然植被和生态系统的破坏。	制定了定期巡检计划，对设备检修维护人员进行了环保培训，加强了管理，避免对项目周边的自然植被和生态系统的破坏。
	污染影响	**电磁环境：** **环评报告表：** 线路沿线相关敏感目标处满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中工频电场强度 4000V/m、工频磁感应强度 100μT 的公众曝露控制限值要求，线路下方距地面 1.5m 高度处满足耕地、园地、养殖水面、道路等场所工频电场强度 10kV/m、工频磁感应强度 100μT 的控制限值要求。已设置警示和防护指示标志。 **环评批复：** 严格落实控制工频电场、工频磁场的各项环境保护措施，确保工程周围区域工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。	**已落实：** 线路沿线相关敏感目标处满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中工频电场强度 4000V/m、工频磁感应强度 100μT 的公众曝露控制限值要求，线路下方距地面 1.5m 高度处满足耕地、园地、养殖水面、道路等场所工频电场强度 10kV/m、工频磁感应强度 100μT 的控制限值要求。已设置警示和防护指示标志。
		声环境： **环评报告表：** 架空线路沿线噪声达标。 **环评批复：** 采取必要的消声降噪措施，确保该工程周围区域噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应功能区要求，防止噪声扰民。	**已落实：** 已采取必要的消声降噪措施，架空线路沿线噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应功能区要求，未发生噪声扰民。
		其他： **环评报告表：** （1）制定环境监测计划，按照监测计划完成验收监测； （2）竣工后应在 3 个月内及时进行自主验收。 **环评批复：** （1）建设单位须做好与输变电工程相关科普知识的宣传工作，会同当地政府及有关部门对居民进行必要的解释、说明，取得公众对输变电工程建设的理解和支持，避免产生纠纷； （2）项目建设必须严格执行配套的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序开展竣工环境保护验收。验收合格后，项目方可正式投入运行。	**已落实** （1）制定了环境监测计划，已按照监测计划完成验收监测； （2）竣工后在 3 个月内及时进行自主验收； （3）建设单位做好了与输变电工程相关科普知识的宣传工作，会同当地政府及有关部门对居民进行必要的解释、说明，取得了公众对输变电工程建设的理解和支持，避免产生纠纷； （4）项目建设严格执行配套的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，已按规定程序开展竣工环境保护验收。待验收合格后，方正式投入运行。

环境保护设施、环境保护措施照片



施工期便道生态恢复照片



线路沿线生态恢复照片



拆除塔基处生态恢复照片



安全警示标识



施工道路铺设钢板



施工道路铺设钢板

七、电磁环境、声环境监测（附监测点位图）

电磁环境监测	**监测因子及监测频次** 监测因子：工频电场、工频磁场 监测频次：监测 1 次
	监测方法及监测布点 监测方法：《交流输变电工程电磁环境监测方法》（HJ681-2013）。 数据处理：每个监测点连续监测 5 次，每隔 15 秒读取一个数据，取每个监测点的 5 次读数的算术平均值作为监测结果。 监测布点： （1）架空线路断面监测以导线档距中央弧垂最低位置的横截面方向上，以弧垂最低位置处档距对应两杆塔中央连线对地投影为起点，间距 1m、5m 布设监测点，测点距线路导线投影 55m 处为止。 （2）敏感目标：龙腾特钢集团 21 号门卫室、戴家宅基（46）39 号厂房、曹陈巷村 1 号民房、曹陈巷村 2 号民房。 监测报告见附件 2，监测点位见附图 2。 质量控制措施： 监测单位已通过检验检测机构资质认定；监测点位置的选取具有代表性；监测所用仪器与所测对象在频率、量程、响应时间等方面符合要求，监测仪器已定期校准，并在其证书有效期内使用；每次监测前后均检查仪器，确保仪器在正常工作状态。监测人员已经业务培训，且在证书有效期内，现场监测工作有两名监测人员进行；监测中异常数据的取舍以及监测结果的数据处理已按统计学原则处理，监测时已应尽可能排除干扰因素，包括人为的干扰因素和环境干扰因素；已规范监测报告编制、审核、签发等程序，已建立完整的监测文件档案。
	监测单位、监测时间、监测环境条件 监测单位：江苏海尔森检测技术服务有限公司 监测时间：2026 年 7 月 27 日 监测环境条件见下表。

表 7-1　监测环境条件一览表

时间	天气	温度	湿度	风速
2026 年 7 月 27 日 昼间	阴	34℃	60%	1.26~2.17m/s

监测仪器及工况：

监测仪器信息详见下表。

表 7-2　监测仪器一览表

仪器名称	电磁辐射分析仪
仪器编号	HES087
规格型号	NBM550+EHP-50E
频率范围	5Hz~100kHz
测量范围	电场测量范围：5mV/m~100kV/m 磁场测量范围：0.3nT~10mT
校准证书有效期	2025 年 9 月 18 日-2026 年 9 月 17 日

监测工况详见下表。

表 7-3　监测工况一览表

名称	监测工况
220kV 常谢 4521 线	电压范围 227.82kV-230.07kV，电流范围 6.72A-150.31A
220kV 常同 4522 线	电压范围 228.14kV-230.23kV，电流范围 146.03A-270.67A

工频电场、工频磁场监测结果分析

本项目输电线路沿线工频电场、工频磁场监测结果详见下表。

表 7-4　输电线路沿线及周边敏感目标电磁环境工频电场、工频磁场现状

检测点序号	监测点位置	工频电场（V/m）	工频磁场（μT）
1	220kV 常谢/常同线恢复架线段架空线路路径正下方	885.2	0.5622
	220kV 常谢/常同线恢复架线段架空线路路径北 1m	906.6	0.5638
	220kV 常谢/常同线恢复架线段架空线路路径北 2m	922.6	0.5174
	220kV 常谢/常同线恢复架线段架空线路路径北 3m	907.9	0.4800
	220kV 常谢/常同线恢复架线段架空线路路径北 4m	897.4	0.4520
	220kV 常谢/常同线恢复架线段架空线路路径北 5m	891.3	0.4155
	220kV 常谢/常同线恢复架线段架空线路路径北 10m	710.5	0.3704
	220kV 常谢/常同线恢复架线段架空线路路径北 15m	576.2	0.3328
	220kV 常谢/常同线恢复架线段架空线路路径北 20m	396.3	0.2837
	220kV 常谢/常同线恢复架线段架空线路路径北 25m	276.7	0.2512
	220kV 常谢/常同线恢复架线段架空线路路径北 30m	181.2	0.2184

	220kV 常谢/常同线恢复架线段架空线路路径北 35m	108.3	0.1862
	220kV 常谢/常同线恢复架线段架空线路路径北 40m	59.12	0.1680
	220kV 常谢/常同线恢复架线段架空线路路径北 45m	28.91	0.1489
	220kV 常谢/常同线恢复架线段架空线路路径北 50m	11.32	0.1287
	220kV 常谢/常同线恢复架线段架空线路路径北 55m	3.612	0.1033
2	龙腾特钢集团 21 号门卫室东北	246.3	0.3196
3	220kV 常谢/常同线新建段架空线路路径正下方	841.2	0.9542
	220kV 常谢/常同线新建段架空线路路径西北 1m	844.7	0.9606
	220kV 常谢/常同线新建段架空线路路径西北 2m	839.4	0.9492
	220kV 常谢/常同线新建段架空线路路径西北 3m	825.8	0.9105
	220kV 常谢/常同线新建段架空线路路径西北 4m	812.7	0.8686
	220kV 常谢/常同线新建段架空线路路径西北 5m	801.8	0.8487
	220kV 常谢/常同线新建段架空线路路径西北 10m	495.1	0.6637
	220kV 常谢/常同线新建段架空线路路径西北 15m	161.3	0.6413
	220kV 常谢/常同线新建段架空线路路径西北 20m	81.62	0.5122
	220kV 常谢/常同线新建段架空线路路径西北 25m	38.96	0.4070
	220kV 常谢/常同线新建段架空线路路径西北 30m	19.72	0.3071
	220kV 常谢/常同线新建段架空线路路径西北 35m	44.72	0.2625
	220kV 常谢/常同线新建段架空线路路径西北 40m	59.93	0.2229
	220kV 常谢/常同线新建段架空线路路径西北 45m	74.76	0.1849
	220kV 常谢/常同线新建段架空线路路径西北 50m	87.39	0.1776
	220kV 常谢/常同线新建段架空线路路径西北 55m	95.07	0.1679
4	戴家宅基（46）39 号厂房东北	10.15	0.1777
5	曹陈巷村 1 号民房西	75.17	0.4026
6	曹陈巷村 2 号民房南	153.7	0.3657

由监测结果可知，“常熟市梅李镇人民政府 220kV 常谢 4521/常同 4522 线 55#-60#段迁改工程”输电线路沿线及周边敏感目标周围的工频电场强度范围为（3.612~922.6）V/m、工频磁感应强度范围为（0.1033~0.9606）μT，均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中频率 50Hz 条件下公众曝露控制限值“工频电场强度＜4000V/m、工频磁感应强度＜100μT”的要求，线路下方距地面 1.5m 高度处的工频电场满足耕地等场所电场强度 10kV/m 的控制限值要求。

根据监测结果，输电线路沿线的工频电场强度低于《电磁环境控制限值》

	（GB8702-2014）中规定的控制限值要求，工频电场强度仅与运行电压相关，验收监测期间输电线路运行电压达到设计额定电压等级，监测结果代表线路正常运行的工频电场强度。工频磁感应强度与输电线路负荷成正相关的关系，根据监测时的电流强度推算到当输电线路达到额定电流后，输电线路沿线的工频磁感应强度仍低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的工频磁感应强度 100μT 的公众曝露控制限值”。

声环境监测

监测因子及监测频次

监测因子：噪声

监测频次：昼间、夜间各监测 1 次

监测方法及监测布点

监测方法：《声环境质量标准》（GB3096-2008）

数据处理：每个测点读取稳定状态的 1min 的等效声级作为监测结果。

监测布点：架空线路监测点位布置在架空线路正下方以及敏感目标曹陈巷村 1 号民房、曹陈巷村 2 号民房。

监测报告见附件 2，监测点位图见附图 2。

质量控制措施：

检测单位已通过 CMA 计量认证，具备相应的检测资质和检测能力；检测单位制定有质量管理体系文件，实施全过程质量控制，检测报告实行三级审核；检测单位所用监测仪器均经过计量部门检定并在检定有效期内，使用前后进行校准或检查，实施全过程质量控制；检测人员持证上岗规范操作。

监测单位、监测时间、监测环境条件

监测单位：江苏海尔森检测技术服务有限公司

监测时间：2026 年 7 月 27 日

监测环境条件见下表。

表 7-5　监测环境条件一览表

时间	天气	温度	湿度	风速
2026 年 7 月 27 日 昼间	阴	34℃	60%	1.26~2.17m/s
2026 年 7 月 27 日 夜间	阴	28℃	64%	0.98~1.76m/s

监测仪器及工况

监测仪器详见下表。

表 7-6　监测仪器一览表

仪器名称	声级计	声级计
仪器编号	HES011	HES012
规格型号	AWA5688	AWA5688
检定有效期	2025 年 10 月 29 日~2026 年 10 月 28 日	2025 年 8 月 28 日~2026 年 8 月 27 日
声校准器型号	HS6020	

声校准器编号	HES013
检定有效期	2025 年 8 月 28 日~2026 年 8 月 27 日

监测工况详见下表。

表 7-7　监测工况一览表

名称	监测工况
220kV 常谢 4521 线	电压范围 227.82kV-230.07kV，电流范围 6.72A-150.31A
220kV 常同 4522 线	电压范围 228.14kV-230.23kV，电流范围 146.03A-270.67A

噪声监测结果分析

本项目输电线路沿线噪声监测结果详见下表。

表 7-8　输电线路沿线及周边敏感目标噪声监测结果

序号	检测点位置	昼间噪声（Leq（dB（A）））	夜间噪声（Leq（dB（A）））
1	220kV 常谢/常同线恢复架线段架空线路路径正下方	57	49
2	220kV 常谢/常同线新建段架空线路路径正下方	56	50
3	曹陈巷村 1 号民房西	58	45
4	曹陈巷村 2 号民房南	54	48

由监测结果可知，“常熟市梅李镇人民政府 220kV 常谢 4521/常同 4522 线 55#-60#段迁改工程”输电线路沿线及周边敏感目标周围的昼间噪声值为（54～58）dB(A)，夜间噪声值为（45～50）dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 2 类标准要求，即昼间 60dB（A），夜间 50dB（A）。

八、环境影响调查

施工期

生态影响

根据现场踏勘和资料分析，本项目验收调查范围内不涉及国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地、世界自然遗产、生态保护红线区域；重要物种的天然集中分布区、栖息地，重要水生生物的产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，迁徙鸟类的重要繁殖地、停歇地、越冬地以及野生动物迁徙通道等《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中的生态敏感区。

通过现场调查，查阅环评及设计资料，本项目验收调查范围内不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区、以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域等《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》第三条（一）、（三）中的环境敏感区。

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74 号）、《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1 号）和《江苏省自然资源厅关于苏州市生态空间管控区域评估优化成果的复函》（苏自然资函〔2026〕487 号），本项目验收调查范围内不涉及江苏省国家级生态保护红线、江苏省生态空间管控区域。

综上所述，本项目验收调查范围内不涉及受影响的重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中的生态保护目标。

经调查，本项目在施工期已经落实了对管理人员和施工人员的环保教育工作，提高了其生态环保意识；已严格控制了施工临时占地范围，在施工过程中充分利用了现有道路运输设备、材料等；施工过程开挖作业时采取了分层开挖、分层堆放、分层回填的方式，并已做好表土剥离、分类存放工作；已合理安排施工工期，未在雨天进行土建施工；已选择合理区域堆放土石方，对临时堆放区域加盖了苫布；塔基清除开挖的土石方已及时回填，原有塔基周围场地已及时恢复平整，临时占用的场地已进行绿化恢复。施工结束后，已及时清理施工现场，并对施工临时占地进行了固化、复绿处理，目前已恢复临时占用土地原有使用功能。

经现场勘察，土地恢复情况良好；原塔基基础混凝土已清除至地面以下 1m，并对开挖的土石方进行了及时回填；并及时对原有塔基周围场地及临时占地的场地进行平整和植被恢复，生态恢复情况良好。

污染影响

1、大气环境影响调查

合理安排了施工期；施工场地已按要求设置了围挡，裸露地面采用了防尘网覆盖保护，遇到四级及以上大风天气，未进行可能产生扬尘污染的施工作业；现场施工时做到了分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施，在建筑工地入口处设置了扬尘防治制度，公示扬尘防治措施、责任人等相关信息；材料转运与使用严格管理，规范操作，易起尘材料的存放采取了防尘措施；施工结束后，已按“工完料尽场地清”的原则，及时进行了场地恢复；施工期间未收到扬尘污染投诉，施工场地扬尘排放满足《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022）要求。通过采取上述环保措施，项目施工对周围大气环境影响较小。

2、水环境影响调查

施工废水经沉淀处理后循环使用不外排，沉渣妥善处置；施工人员生活污水纳入当地污水处理系统。通过采取上述环保措施，施工废水未对周围环境产生明显影响。

3、声环境影响调查

施工期间采用了低噪声施工机械设备，施工作业设置围挡；施工机械布置合理，加强了施工管理，文明施工，有计划的错开了高噪声设备使用时间；合理安排了施工时段，未在夜间施工，施工噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的限值要求。通过采取上述环保措施，项目施工对周围声环境影响较小。

4、固废环境影响调查

施工期加强了环境管理，生活垃圾分类收集后委托环卫部门定期清运，建筑垃圾集中堆存、遮盖，并及时清运至指定受纳场地；施工开挖的土石方用于平整填方，基本做到土石方平衡，施工弃渣已妥善处置；拆除的杆塔、导线等进行了回收处置，施工迹地已清理并及时恢复了原有土地使用功能。因此，项目施工期固废对周边环境影响不大。

环境保护设施调试期

生态影响

在项目运行期间，已加强对沿线的巡查和检查工作。同时，对设备检修维护人员的生态环境保护意识教育已全面展开，并实行严格的管理措施，未对项目周边的自然植被和生态系统造成破坏。

污染影响

1、电磁环境影响调查

经现场勘察，架空线路对地高度满足设计要求；优化了导线相间距离以及导线布置方式，新建杆塔设置了警示和防护指示标志。

验收监测结果表明，线路沿线及相关敏感目标处满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中工频电场强度 4000V/m、工频磁感应强度 100μT 的公众曝露控制限值要求，线路下方距地面 1.5m 高度处的工频电场满足耕地等场所电场强度 10kV/m 的控制限值要求。

2、声环境影响调查

验收监测结果表明，本项目架空线路沿线及周边敏感目标昼间、夜间噪声均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应功能区标准要求。

3、水环境影响调查

本项目输电线路运营期无废水产生，对周围环境没有影响。

4、固体废物环境影响调查

本项目输电线路运营期无固废产生，对周围环境没有影响。

九、环境管理与监测计划

环境管理机构设置（分施工期和环境保护设施调试期）

1、施工期

施工期间环境管理的责任和义务，由建设单位和施工单位等共同承担。

建设单位安排了人员具体负责落实项目环境保护设计内容，监督施工期环保措施的实施，协调好各部门或团体之间的环保工作和处理施工中出现的环保问题。

施工单位在施工期间指派了人员具体负责执行有关的环境保护对策措施，并接受生态环境管理部门对环保工作的监督和管理。

2、环境保护设施调试期

本项目竣工后建设单位已在 3 个月内及时进行自主验收，建设单位设立了环保工作人员负责本项目运行期间的环境保护工作，其主要工作内容如下：

①贯彻执行国家及地方环境保护法律、法规和方针政策，以及各级生态环境主管部门的要求；

②落实运行期环境保护措施，制定运行期的环境管理办法和制度；

③若项目实施过程中发生重大变更，按规定履行相关环保手续；

④落实运行期的环境监测，并对结果进行统计分析和数据管理。

本项目通过验收后资产移交供电公司，移交后由供电公司承担运营期的管理责任。

环境监测计划落实情况及环境保护档案管理情况

环境保护设施调试运行期间由江苏海尔森检测技术服务有限公司对项目电磁环境、噪声进行了竣工环保验收监测。

本项目环境保护设施调试期环境监测计划见下表。

表 9-1　环境监测计划

序号	名称		内容
1	工频电场 工频磁场	点位布设	线路沿线及电磁环境敏感目标
		监测项目	工频电场强度（kV/m）、工频磁感应强度（μT）
		监测方法	《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）
		监测频次和时间	结合竣工环境保护验收各监测点监测一次，其后有环保投诉时监测
2	噪声	点位布设	架空线路沿线及声环境保护目标
		监测项目	昼间、夜间等效声级，Leq（dB(A)）
		监测方法	《声环境质量标准》（GB3096-2008）

		监测频次和时间	结合竣工环境保护验收昼间、夜间各监测一次，其后有环保投诉时监测

环境管理状况分析

经过调查核实，施工期和环境保护设施调试运行期间环境管理状况良好，认真落实、实施了环境影响报告表及其批复提出的环保措施。

（1）建设单位环境管理组织机构健全。

（2）环境管理制度和应急预案完善。

（3）环保工作管理规范，本项目执行了环境影响评价制度及环保“三同时”管理制度。

十、竣工环保验收调查结论与建议

调查结论

1、工程基本情况

本验收项目建设规模如下：

本项目新建双回路角钢塔 11 基（T1~T11），在新建铁塔上新建同塔双回架空线路路径长约 1.93km，导线型号为 2×JL3/G1A-630/45 型钢芯铝绞线，地线选用 2 根 72 芯 OPGW-150 复合光缆。常谢/常同线 54#~T1，T11~常谢/常同线 61#均利用现状导地线恢复架线，恢复架线段路径长约 0.439km，导线型号为 2×LGJQ-300 型钢芯铝绞线。

本项目拆除 220kV 常谢 4521/常同 4522 线现有的双回架空线路路径长约 1.5km，拆除原线路角钢塔 6 基（55#~60#）。

2、环境保护措施落实情况

本项目环评及批复文件中提出了较为全面、详细的环境保护设施、环境保护措施，各项环境保护设施、环境保护措施在工程实际建设和运行中已基本得到落实。

3、施工期环境影响调查结论

（1）生态环境影响调查

经调查，本项目在施工期已经落实了对管理人员和施工人员的环保教育工作，提高了其生态环保意识；已严格控制了施工临时占地范围，在施工过程中充分利用了现有道路运输设备、材料等；施工过程开挖作业时采取了分层开挖、分层堆放、分层回填的方式，并已做好表土剥离、分类存放工作；已合理安排施工工期，未在雨天进行土建施工；已选择合理区域堆放土石方，对临时堆放区域加盖了苫布；塔基清除开挖的土石方已及时回填，原有塔基周围场地已及时恢复平整，临时占用的场地已进行绿化恢复；施工结束后，已及时清理施工现场，并对施工临时占地进行了固化、复绿处理，目前已恢复临时占用土地原有使用功能。

经现场勘察，土地恢复情况良好；原塔基基础混凝土已清除至地面以下 1m，并对开挖的土石方进行了及时回填；并及时对原有塔基周围场地及临时占地的场地进行平整和植被恢复，生态恢复情况良好。

（2）大气环境影响调查

合理安排了施工期；施工场地已按要去设置了围挡，裸露地面采用了防尘网覆盖

保护，遇到四级及以上大风天气，未进行可能产生扬尘污染的施工作业；现场施工时做到了分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施，在建筑工地入口处设置了扬尘防治制度，公示扬尘防治措施、责任人等相关信息；材料转运与使用严格管理，规范操作，易起尘材料的存放采取了防尘措施；施工结束后，已按“工完料尽场地清”的原则，及时进行了场地恢复；施工期间未收到扬尘污染投诉，施工场地扬尘排放满足《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022）要求。通过采取上述环保措施，项目施工对周围大气环境影响较小。

（3）水环境影响调查

施工废水经沉淀处理后循环使用不外排，沉渣妥善处置；施工人员生活污水纳入当地污水处理系统。通过采取上述环保措施，施工废水未对周围环境产生明显影响。

（4）声环境影响调查

施工期间采用了低噪声施工机械设备，施工作业设置围挡；施工机械布置合理，加强了施工管理，文明施工，有计划的错开了高噪声设备使用时间；合理安排了施工时段，未在夜间施工，施工噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的限值要求。通过采取上述环保措施，项目施工对周围声环境影响较小。

（5）固废环境影响调查

施工期加强了环境管理，生活垃圾分类收集后委托环卫部门定期清运，建筑垃圾集中堆存、遮盖，并及时清运至指定受纳场地；施工开挖的土石方用于平整填方，基本做到土石方平衡，施工弃渣已妥善处置；拆除的杆塔、导线等进行了回收处置，施工迹地已清理并及时恢复了原有土地使用功能。因此，项目施工期固废对周边环境影响不大。

4、环境保护设施调试期环境影响调查结论

（1）生态环境影响调查

在项目运行期间，已加强对沿线的巡查和检查工作。同时，对设备检修维护人员的生态环境保护意识教育已全面展开，并实行严格的管理措施，未对项目周边的自然植被和生态系统造成破坏。

（2）电磁环境影响调查

经现场勘察，架空线路对地高度满足设计要求；优化了导线相间距离以及导线布置方式，新建杆塔设置了警示和防护指示标志。

验收监测结果表明，线路沿线及相关敏感目标处满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中工频电场强度 4000V/m、工频磁感应强度 100μT 的公众曝露控制限值要求，线路下方距地面 1.5m 高度处的工频电场满足耕地等场所电场强度 10kV/m 的控制限值要求。

（3）声环境影响调查

验收监测结果表明，本项目架空线路沿线及周边敏感目标昼间、夜间噪声均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应功能区标准要求。

5、环境管理及监测计划落实情况调查

常熟市梅李镇人民政府根据本项目的环境影响和环境管理要求，制定了环境监测计划，并已开始实施。通过及时掌握工程电磁、噪声等环境状况，及时发现并解决问题，从管理上保证环境保护措施的有效实施。

6、验收调查总结论

根据现场调查及监测“常熟市梅李镇人民政府 220kV 常谢 4521/常同 4522 线 55#-60#段迁改工程”在设计、施工和环境保护设施调试期均已落实了环境影响报告表及其批复文件中的要求，采取了有效地环境保护措施和生态保护措施。验收监测结果表明“常熟市梅李镇人民政府 220kV 常谢 4521/常同 4522 线 55#-60#段迁改工程”电磁环境和声环境影响可以满足环评及批复文件的标准限值要求，其他环境要素也均符合环评及批复文件的要求，建议该项目通过竣工环境保护验收。

建议

加强对本项目的日常维护工作，确保各项环保指标稳定达标。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：常熟市梅李镇人民政府　　填表人（签字）：　　项目经办人（签字）：

建设项目	项目名称	常熟市梅李镇人民政府 220kV 常谢 4521/常同 4522 线 55#-60# 段迁改工程	项目代码	/	建设地点	江苏省苏州市常熟市梅李镇、海虞镇
	行业类别（分类管理名录）	五十五-161 输变电工程	建设性质	□新建（迁建） ☑改建 □扩建 □技术改造		
	设计生产能力	本项目新建双回路角钢塔 11 基（T1~T11），在新建铁塔上新建同塔双回架空线路路径长约 1.93km，导线型号为 2×JL3/G1A-630/45 型钢芯铝绞线，地线选用 2 根 72 芯 OPGW-150 复合光缆。常谢/常同线 54#~T1，T11~常谢/常同线 61#均利用现状导地线恢复架线，恢复架线段路径长约 0.439km，导线型号为 2×LGJQ-300 型钢芯铝绞线。 本项目拆除 220kV 常谢 4521/常同 4522 线现有的双回架空线路路径长约 1.5km，拆除原线路角钢塔 6 基（55#~60#）。	实际生产能力	本项目新建双回路角钢塔 11 基（T1~T11），在新建铁塔上新建同塔双回架空线路路径长约 1.93km，导线型号为 2×JL3/G1A-630/45 型钢芯铝绞线，地线选用 2 根 72 芯 OPGW-150 复合光缆。常谢/常同线 54#~T1，T11~常谢/常同线 61#均利用现状导地线恢复架线，恢复架线段路径长约 0.439km，导线型号为 2×LGJQ-300 型钢芯铝绞线。 本项目拆除 220kV 常谢 4521/常同 4522 线现有的双回架空线路路径长约 1.5km，拆除原线路角钢塔 6 基（55#~60#）。	环评单位	苏州普瑞菲环保科技有限公司

环评文件审批机关	苏州市生态环境局	审批文号	苏环辐评（2026）12 号	环评文件类型	报告表	
开工日期	2026.2	竣工日期	2026.5	排污许可证申领时间	/	
环保设施设计单位	常熟市苏明实业有限公司	环保设施施工单位	常熟市苏明实业有限公司	本工程排污许可证编号	/	
环境保护设施监测单位	江苏海尔森检测技术服务有限公司	验收监测时工况	220kV 常谢 4521 线	电压范围 227.82kV-230.07kV，电流范围 6.72A-150.31A		
			220kV 常同 4522 线	电压范围 228.14kV-230.23kV，电流范围 146.03A-270.67A		


投资总概算（万元）	1926				环保投资总概算（万元）	44	所占比例（%）	2.3	
实际总投资	2196.9101				实际环保投资（万元）	50.5	所占比例（%）	2.3	
废水治理（万元）	3	废气治理（万元）	4	噪声治理（万元）	6	固体废物治理（万元）	3	绿化及生态（万元）	10	其他（万元）	24.5
新增废水处理设施能力	/				新增废气处理设施能力	/	年平均工作时间	/	

运营单位	国网苏州供电公司	运营单位统一社会信用代码（或组织机构代码）	11320581014174028P	验收时间	2026 年 7 月 27 日


污染物排放达标与总量控制	污染物	原有排放量（1）	本期工程实际排放浓度（2）	本期工程允许排放浓度（3）	本期工程产生量（4）	本期工程自身削减量（5）	本期工程实际排放量（6）	本期工程核定排放总量（7）	本期工程“以新带老”削减量（8）	全厂实际排放总量（9）	全厂核定排放总量（10）	区域平衡替代削减量（11）	排放增减量（12）
	废水	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	化学需氧量	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	氨氮	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

（工业建设项目详填）	石油类		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	废气		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	二氧化硫		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	烟尘		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	工业粉尘		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	氮氧化物		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	工业固体废物		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	与项目有关的其他特征污染物	工频电场强度	/	（3.612~922.6）V/m	4000V/m	/	/	/	/	/	/	/	/	
		工频磁感应强度	/	（0.1033~0.9606）μT	100μT	/	/	/	/	/	/	/	/	
		噪声	/	昼间噪声54~58dB(A) 夜间噪声45~50dB(A)	昼间噪声60dB(A) 夜间噪声50dB(A)	/	/	/	/	/	/	/	/	


注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

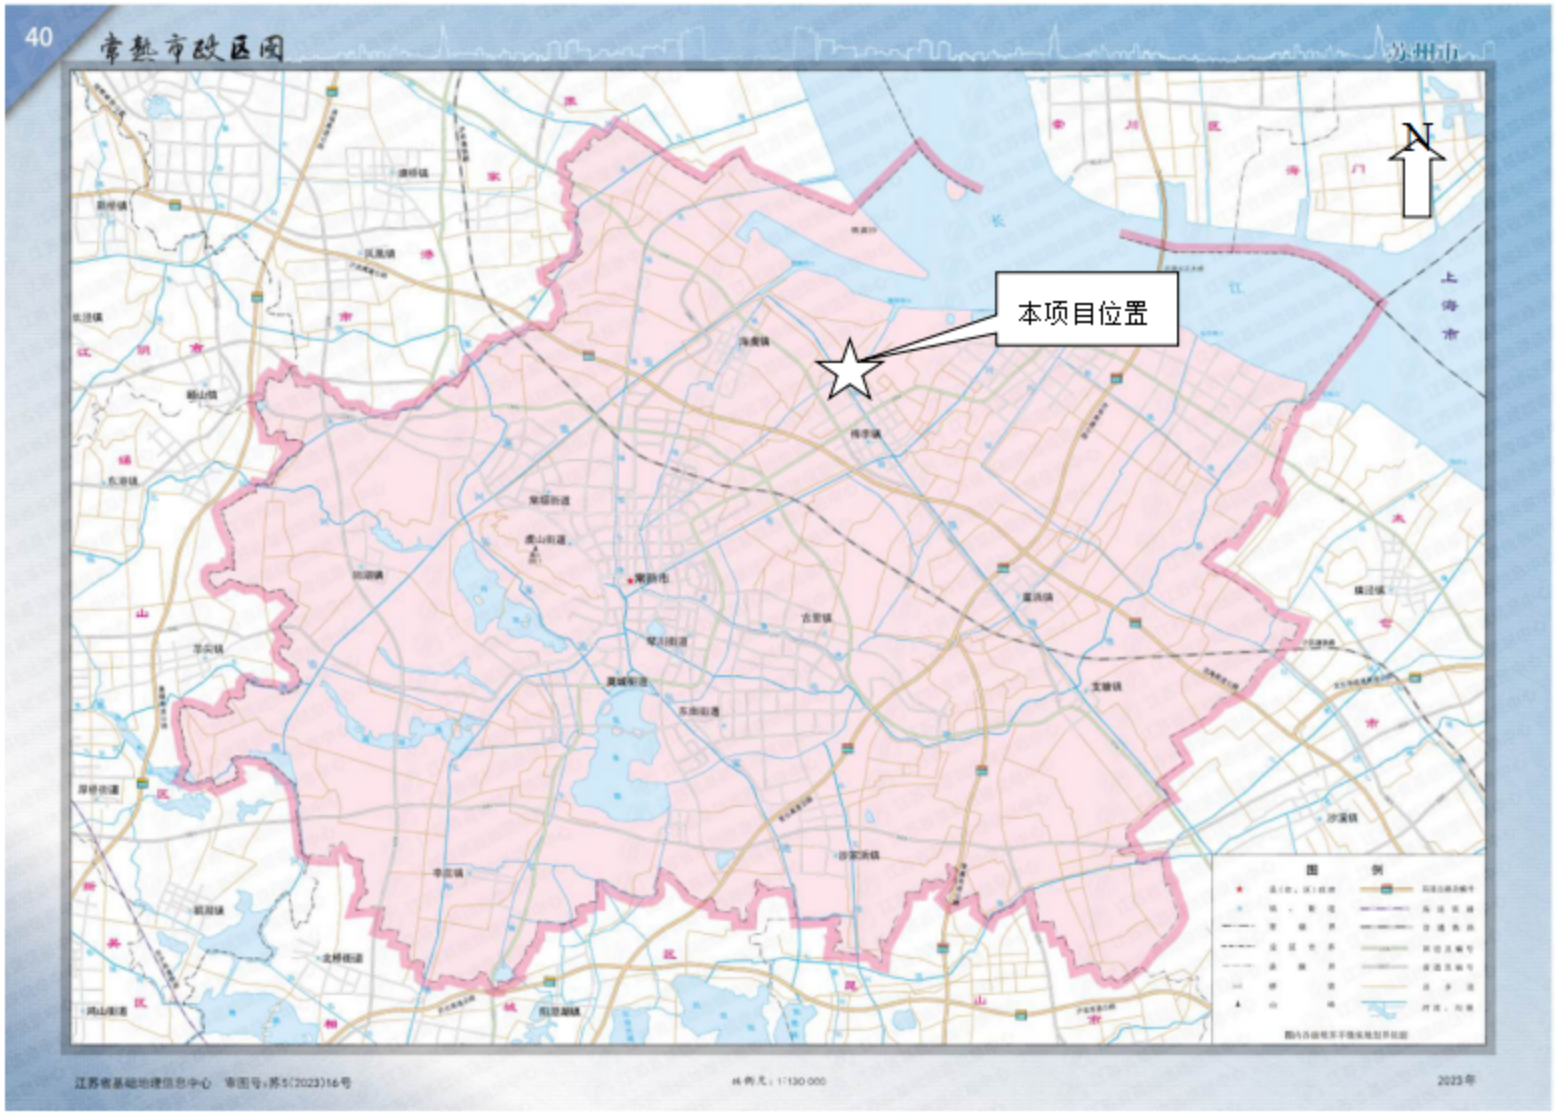

附图 1　本项目地理位置示意图

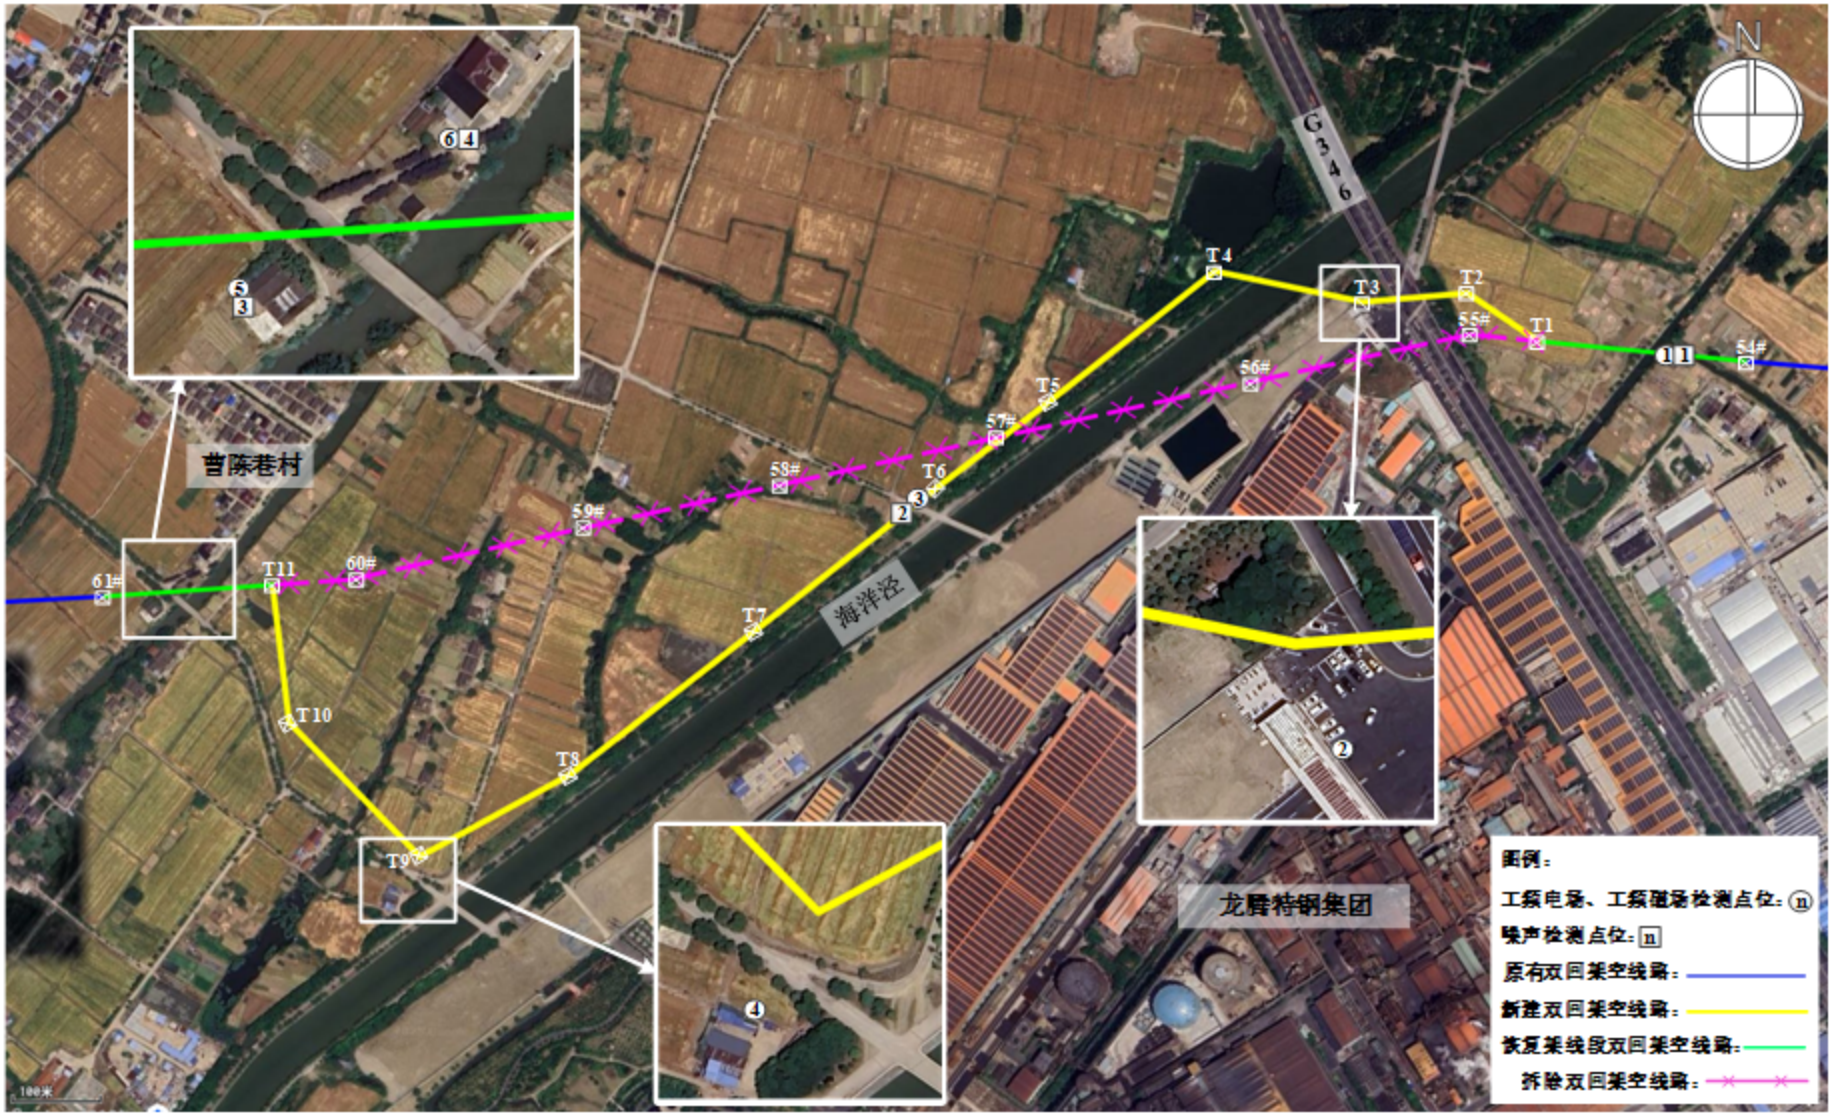

附图 2　监测点位示意图及线路路径图

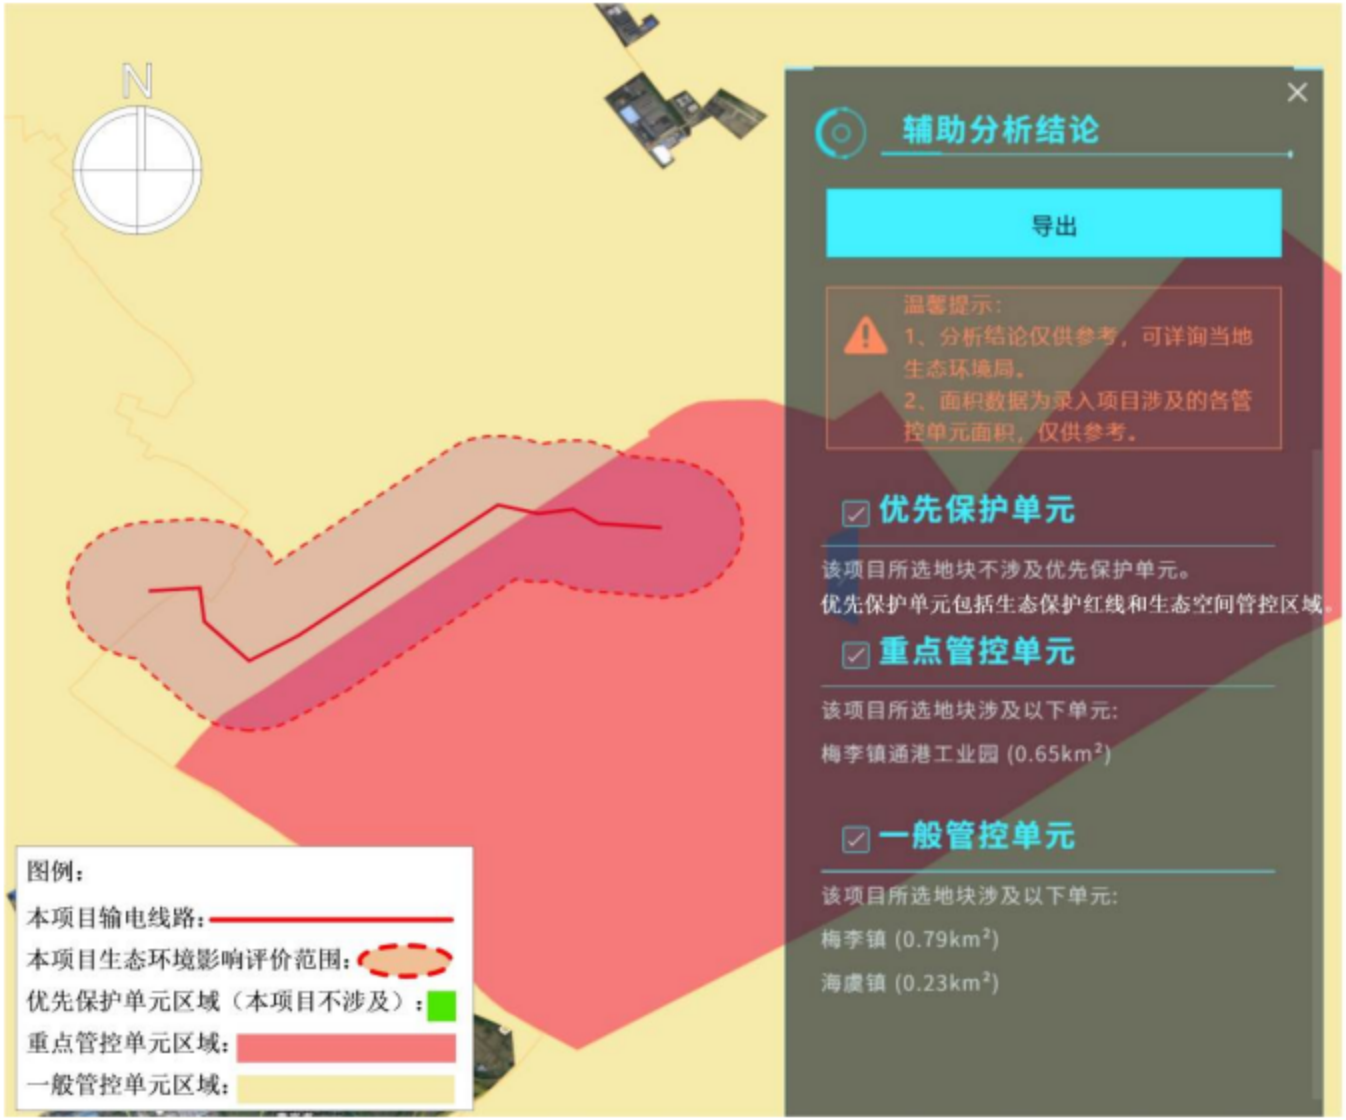

附图 3　本项目与江苏省生态空间保护区域相对位置关系示意图

附件 1　本项目环评批复

苏州市生态环境局文件

苏环辐评〔2026〕12 号

关于常熟市梅李镇人民政府 220kV 常谢 4521/常同 4522 线 55#-60#段迁改工程环境影响报告表的批复

常熟市梅李镇人民政府:

你单位委托苏州普瑞菲环保科技有限公司编制的《常熟市梅李镇人民政府220kV常谢4521/常同4522线55#-60#段迁改工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。经研究，批复如下:

一、常熟市梅李镇人民政府220kV常谢4521/常同4522线55#-60#段迁改工程位于常熟市境内。工程内容为（详见《报告表》）：新建双回路角钢塔11基，新建同塔双回架空线路路径长约1.93km，利用现状导线恢复双回架空线路路径长约0.439km。拆除双回架空线路路径长约1.5km，拆除原路角钢塔6基。

根据《报告表》评价结论，在落实《报告表》中提出的各项污染防治、生态保护措施的前提下，能满足环境保护的相关要求，

项目建设具备环境可行性，从环境保护角度考虑，我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。

二、在工程设计、建设和运行管理中，你单位要认真落实《报告表》提出的各项环保措施，确保污染物达标排放。并做好以下工作：

（一）严格执行环保要求和相关设计标准、规程，优化设计方案，工程建设应符合项目所涉区域的总体规划。

（二）加强施工期的环境保护工作，尽可能减少施工过程中对土地的占用和植被的破坏，采取必要的水土保持措施，不得发生噪声和扬尘等扰民现象。施工期噪声执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2025）的要求。施工结束后及时做好植被、临时用地的恢复工作。

（三）严格落实控制工频电场、工频磁场的各项环境保护措施，确保工程周围区域工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。采取必要的消声降噪措施，确保该工程周围区域噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应功能区要求，防止噪声扰民。

（四）建设单位须做好与输变电工程相关科普知识的宣传工作，会同当地政府及有关部门对居民进行必要的解释、说明，取得公众对输变电工程建设的理解和支持，避免产生纠纷。

三、项目建设必须严格执行配套的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序开展竣工环境保护验收。验收合格后，项目方可正式投入运行。

四、苏州市常熟生态环境局组织实施该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作，苏州市生态环境综合行政执法局负责不定期抽查。你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告表》送苏州市常熟生态环境局，并按规定接受生态环境部门的日常监督检查。

五、建设单位是建设项目环境信息公开的主体，你单位应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发〔2015〕162号）做好建设项目开工前、施工期和建成后的信息公开工作。

六、本批复自下达之日起五年内建设有效。项目的性质、规模、地点、拟采取的环境保护措施发生重大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。

苏州市生态环境局

2026年1月30日

抄送：苏州市生态环境综合行政执法局、苏州市常熟生态环境局。

苏州市生态环境局　　2026年1月30日印发

附件 2　验收监测报告及监测单位资质证书

海尔森检测

231020341602

江苏海尔森检测技术服务有限公司

检　测　报　告

报告编号：HES-R202608009

项目名称：	220kV 常谢 4521/常同 4522 线 55#-60#段迁改工程周围电磁环境和声环境验收监测
受检单位：	常熟市梅李镇人民政府
检测类别：	委托检测
报告日期：	2026 年 08 月 14 日

地址：苏州工业园区华云路 1 号东坊产业园 3 栋 501-1 室　　电话：0512-67487609
邮编：215123　　E-mail：healths_sz@126.com

检测报告说明

1、对本报告有异议者，请于收到报告之日起十五日内向本机构提出。对于无法复现的样品，不受理申诉。

2、送样委托检测，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。

3、检测报告无编制人、审核人及签发人签字无效；涂改或无检验检测专用章无效；未经本机构同意，部分复制本报告无效。

4、本检测报告及检测机构名称不得用于产品标签、广告、商品宣传和评优等。

委托单位	常熟市梅李镇人民政府		
受检单位	常熟市梅李镇人民政府		
项目建设地址	江苏省常熟市梅李镇、海虞镇		
检测类别	委托检测	检测日期	2026 年 07 月 27 日
检测内容	1. 检测对象：常熟市梅李镇人民政府 220kV 常谢 4521/常同 4522 线 55#-60#段迁改工程周围 2. 检测项目：工频电场、工频磁场、噪声		
检测依据	1. 《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013） 2. 《辐射环境保护管理导则 电磁辐射监测仪器和方法》（HJ/T 10.2-1996） 3. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）		
评价依据	1. 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014） 2. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）		

评价结论：

1：常熟市梅李镇人民政府 220kV 常谢 4521/常同 4522 线 55#-60#段迁改工程周围的工频电场强度范围为（3.612~922.6）V/m、工频磁感应强度范围为（0.1033~0.9606）μT，均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中频率 50Hz 条件下公众曝露控制限值"工频电场强度＜4000V/m、工频磁感应强度＜100μT"的要求。

2：常熟市梅李镇人民政府 220kV 常谢 4521/常同 4522 线 55#-60#段迁改工程周围的昼间噪声值为（54～58）dB(A)，夜间噪声值为（45～50）dB(A)。

委托单位	常熟市梅李镇人民政府
受检单位	常熟市梅李镇人民政府
项目建设地址	江苏省常熟市梅李镇、海虞镇

检测仪器

序号	仪器名称	仪器型号及技术指标	仪器编号	检定信息
1	电磁辐射分析仪	NBM550+EHP-50E 频率范围：5Hz-100 kHz 电场测量范围：5mV/m~100kV/m；磁场测量范围：0.3nT~10mT	HES087	证书编号：2025F33-10-6115442002 2025.9.18~2026.9.17
2	声级计	AWA5688 测量范围（A 声级） 30dB~120dB	HES011	证书编号：802803065 2025.10.29~2026.10.28
3	声级计	AWA5688 测量范围（A 声级） 30dB~120dB	HES012	证书编号：802757206 2025.8.28~2026.8.27
4	声校准器	HS6020 声压级 94dB	HES013	证书编号：802757207 2025.8.28~2026.8.27
5	热线式风速仪	AR866A 测量范围：0~30m/s	HES170	证书编号：802763032 2025.9.5~2026.9.4

检测环境条件	昼间 天气：阴 温度（℃）：34 湿度（%）：60 风速（m/s）：1.26~2.17 夜间 天气：阴 温度（℃）：28 湿度（%）：64 风速（m/s）：0.98~1.76
检测工况	220kV 常谢 4521 线（电压范围 227.82kV~230.07kV，电流范围 6.72A~150.31A）； 220kV 常同 4522 线（电压范围 228.14kV~230.23kV，电流范围 146.03A~270.67A）。
备注	1：昼夜间噪声检测时间均为 2026 年 7 月 27 号，昼间噪声检测时间段为 16：37~17：52，夜间噪声检测时间段为 22：21~23：33； 2：本项目检测点位由委托单位提供； 3：220kV 常谢/常同线新建段架空线路路径西北断面受 220kV 师同线影响，东南侧不可达。

检测结果：

表 1 ：常熟市梅李镇人民政府 220kV 常谢 4521/常同 4522 线 55#-60#段迁改工程周围工频电、磁场检测结果

检测点位序号	检测点位置	工频电场（V/m）	工频磁场（μT）
1	220kV 常谢/常同线恢复架线段架空线路路径正下方	885.2	0.5622
	220kV 常谢/常同线恢复架线段架空线路路径北 1m	906.6	0.5638
	220kV 常谢/常同线恢复架线段架空线路路径北 2m	922.6	0.5174
	220kV 常谢/常同线恢复架线段架空线路路径北 3m	907.9	0.4800
	220kV 常谢/常同线恢复架线段架空线路路径北 4m	897.4	0.4520
	220kV 常谢/常同线恢复架线段架空线路路径北 5m	891.3	0.4155
	220kV 常谢/常同线恢复架线段架空线路路径北 10m	710.5	0.3704
	220kV 常谢/常同线恢复架线段架空线路路径北 15m	576.2	0.3328
	220kV 常谢/常同线恢复架线段架空线路路径北 20m	396.3	0.2837
	220kV 常谢/常同线恢复架线段架空线路路径北 25m	276.7	0.2512
	220kV 常谢/常同线恢复架线段架空线路路径北 30m	181.2	0.2184
	220kV 常谢/常同线恢复架线段架空线路路径北 35m	108.3	0.1862
	220kV 常谢/常同线恢复架线段架空线路路径北 40m	59.12	0.1680
	220kV 常谢/常同线恢复架线段架空线路路径北 45m	28.91	0.1489
	220kV 常谢/常同线恢复架线段架空线路路径北 50m	11.32	0.1287
	220kV 常谢/常同线恢复架线段架空线路路径北 55m	3.612	0.1033
2	龙腾特钢集团 21 号门卫室东北	246.3	0.3196
3	220kV 常谢/常同线新建段架空线路路径正下方	841.2	0.9542
	220kV 常谢/常同线新建段架空线路路径西北 1m	844.7	0.9606

	220kV 常谢/常同线新建段架空线路路径西北 2m	839.4	0.9492
	220kV 常谢/常同线新建段架空线路路径西北 3m	825.8	0.9105
	220kV 常谢/常同线新建段架空线路路径西北 4m	812.7	0.8686
	220kV 常谢/常同线新建段架空线路路径西北 5m	801.8	0.8487
	220kV 常谢/常同线新建段架空线路路径西北 10m	495.1	0.6637
	220kV 常谢/常同线新建段架空线路路径西北 15m	161.3	0.6413
	220kV 常谢/常同线新建段架空线路路径西北 20m	81.62	0.5122
	220kV 常谢/常同线新建段架空线路路径西北 25m	38.96	0.4070
	220kV 常谢/常同线新建段架空线路路径西北 30m	19.72	0.3071
	220kV 常谢/常同线新建段架空线路路径西北 35m	44.72	0.2625
	220kV 常谢/常同线新建段架空线路路径西北 40m	59.93	0.2229
	220kV 常谢/常同线新建段架空线路路径西北 45m	74.76	0.1849
	220kV 常谢/常同线新建段架空线路路径西北 50m	87.39	0.1776
	220kV 常谢/常同线新建段架空线路路径西北 55m	95.07	0.1679
4	戴家宅基（46）39 号厂房东北	10.15	0.1777
5	曹陈巷村 1 号民房西	75.17	0.4026
6	曹陈巷村 2 号民房南	153.7	0.3657

注：1.检测点位见附图 1.
2.测量点距地面 1.5m 处.

结论：

常熟市梅李镇人民政府 220kV 常谢 4521/常同 4522 线 55#-60#段迁改工程周围的工频电场强度范围为（3.612~922.6）V/m、工频磁感应强度范围为（0.1033~0.9606）μT，均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中频率 50Hz 条件下公众曝露控制限值"工频电场强度＜4000V/m、工频磁感应强度＜100μT"的要求。

表 2 ：常熟市梅李镇人民政府 220kV 常谢 4521/常同 4522 线 55#-60#段迁改工程周围噪声检测结果

检测点位序号	检测点位置	昼间噪声（Leq(dB(A)）	夜间噪声（Leq(dB(A)）
1	220kV 常谢/常同线恢复架线段架空线路路径正下方	57	49
2	220kV 常谢/常同线新建段架空线路路径正下方	56	50
3	曹陈巷村 1 号民房西	58	45
4	曹陈巷村 2 号民房南	54	48

注：1.检测点位见附图 1;
2.测量点距地面 1.2m 处；

结论：

常熟市梅李镇人民政府 220kV 常谢 4521/常同 4522 线 55#-60#段迁改工程周围的昼间噪声值为（54～58）dB(A)，夜间噪声值为（45～50）dB(A)。

编制：


审核：

签发：

江苏海尔森检测技术服务有限公司

2026 年 08 月 14 日

附图 1：现场检测点位示意图

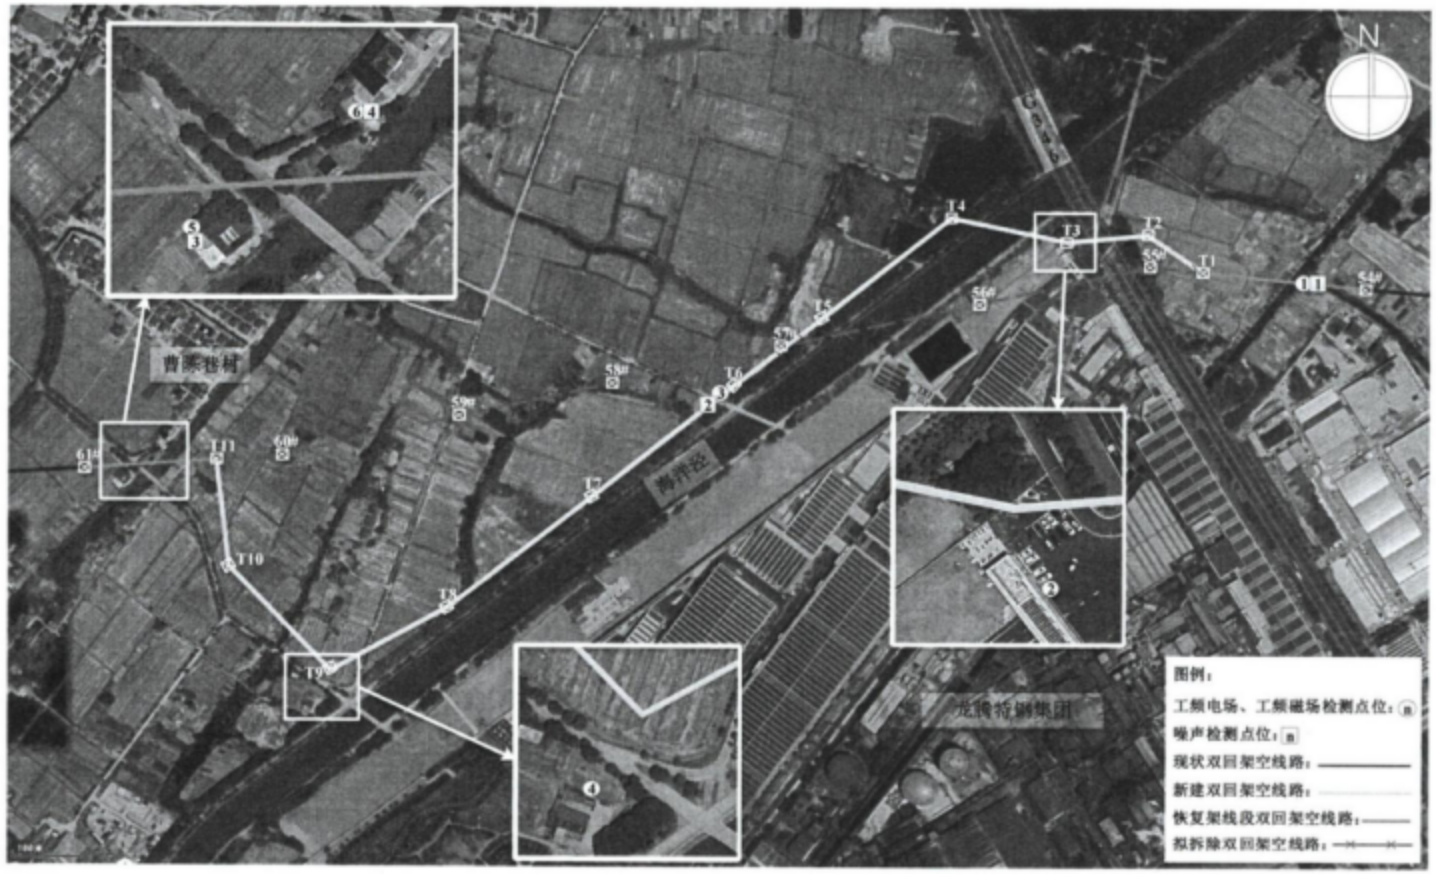

检验检测机构
资质认定证书

编号：231020341602

名称： 江苏海尔森检测技术服务有限公司

地址： 江苏省苏州市苏州工业园区华云路1号东坊产业园3栋501-1室（215123）

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准。可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律责任由江苏海尔森检测技术服务有限公司承担。

许可使用标志

CMA

231020341602

发证日期：2023年11月28日

有效期至：2029年11月27日

发证机关：

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。

检验检测机构
资质认定证书附表

231020341602

检验检测机构名称：江苏海尔森检测技术服务有限公司

批准日期：2023年11月28日(复查换证（扩项、检测标准、方法变更）)

有效期至：2029年11月27日

批准部门：江苏省市场监督管理局

国家认证认可监督管理委员会制

二、批准江苏海尔森检测技术服务有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：231020341602

机构（省中心）名称：江苏海尔森检测技术服务有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-苏州工业园区-华云路1号东坊产业园3栋501-1室

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		248	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017		
		249	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989		
		250	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012		
		251	硝酸盐氮	水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法（试行） HJ/T 346-2007		
		252	钙和镁总量（总硬度）	水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法 GB/T 7477-1987		
		253	氰化物（总氰化物和易释放氰化物）	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009	只用：方法2 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法	
		254	溶解氧	水质 溶解氧的测定 电化学探头法 HJ 506-2009		
		255	五日生化需氧量（BOD_5）	水质 五日生化需氧量（BOD_5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009		扩项：
		256	汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014		扩项：
		257	砷	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014		扩项：
		258	硒	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014		扩项：
		259	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018		扩项：
		260	动植物油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018		扩项：
25	噪声和振动	261	区域环境噪声	声环境质量标准 GB 3096-2008	不测：35dB以下噪声	
		262	工业企业厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	不测：35dB以下噪声	扩项：
26	电磁辐射	263	电磁辐射	辐射环境保护管理导则 电磁辐射监测仪器和方法 HJ/T 10.2-1996		
		264	工频电场	高压交流架空送电线路、变电站工频电场和磁场测量方法 DL/T 988-2005		
				交流输变电工程电磁环境监测方法（试行） HJ 681-2013		
		265	工频磁场	交流输变电工程电磁环境监测方法（试行） HJ 681-2013		
				高压交流架空送电线路、变电站工频电场和磁场测量方法 DL/T 988-2005		
